

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 66677



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 4933455
Voorl. verslagnr.:
Datum: 30/01/2018

Klant / Opdrachtaever:

ELECTRICITEITSWERKEN
DRINKTEILSTRAAT 5
3450 GEETBETS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: HOGENSTRAAT 75 GEETBETS 3450
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271/278
Datum onderzoek: 26/01/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2043 Onderzoeker:
Eigendom van:
Installateur:
B.T.W.: BE0806380004 ID-kaart : - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: - Stand I : - Stand II -
Aansluiting: ondergronds op bovengronds net Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40 Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A max Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 21 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: >1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 7+8

Zie schema voor beschrijving van de installatie.


VASTSTELLINGEN – Nota (N) – Opmerking (O) – Inbreuk (I) – de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I GEEN
N Aansluiting DNB: 3x400V+N – max.40A (vervanging van de bestaande LS-teller)

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

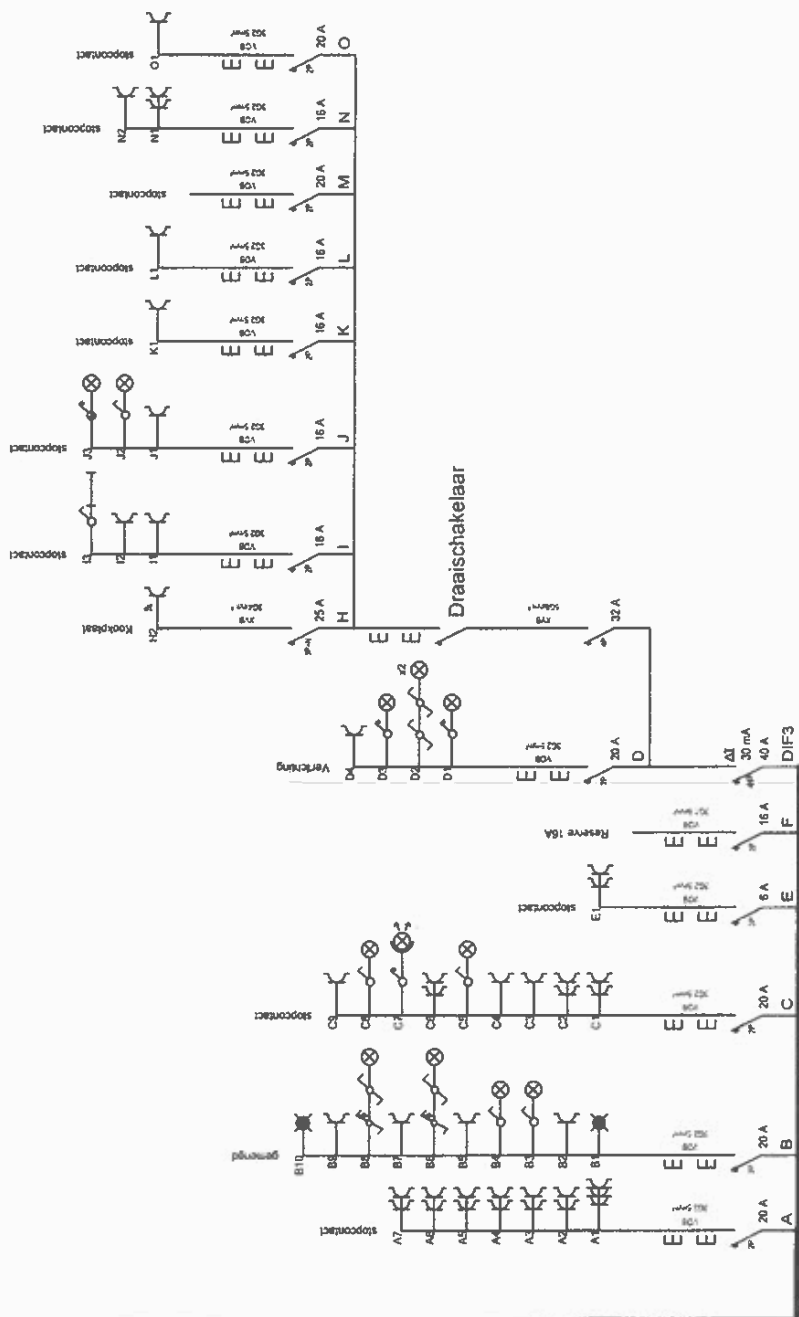

Installatie is gecontroleerd door:
OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich

