

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.


Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0473-160830-09 Datum van het onderzoek : 30/08/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : JONGHE - ROTTIERS
AUGUST VAN DE WIELELEI 99
2100 DEURNE

Visualisatie van de installatie

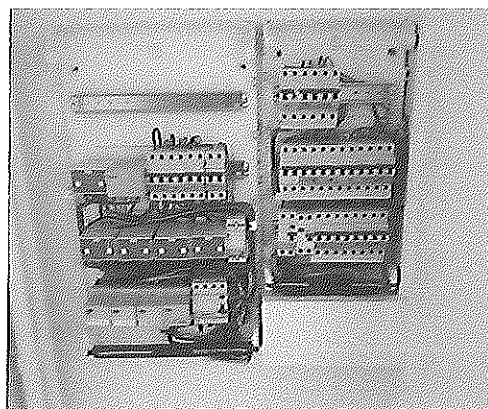

EIGENAAR : JONGHE - ROTTIERS
Adres : AUGUST VAN DE WIELELEI 99
2100 DEURNE

OPDRACHTGEVER : JONGHE - ROTTIERS
Adres : AUGUST VAN DE WIELELEI 99
2100 DEURNE

INSTALLATEUR : JONGHE - ROTTIERS
Adres : AUGUST VAN DE WIELELEI 99
2100 DEURNE

BTW of IK :

EAN : **Teller nr.** **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :		Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Baren	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	2	Aantal eindstroombanen :	17
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 18 Ohm RI tot 50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen


NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 2 Dit verslag kan gebruikt worden voor de verkoop van de woning.

Besluit	<p>De installatie is conform.</p> <p>De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.</p> <p>De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.</p> <p>De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/08/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.</p>
----------------	---

De agent-onderzoeker,
0473 ABDELKARIM EL-ALLACHI

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES


- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 273)
- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

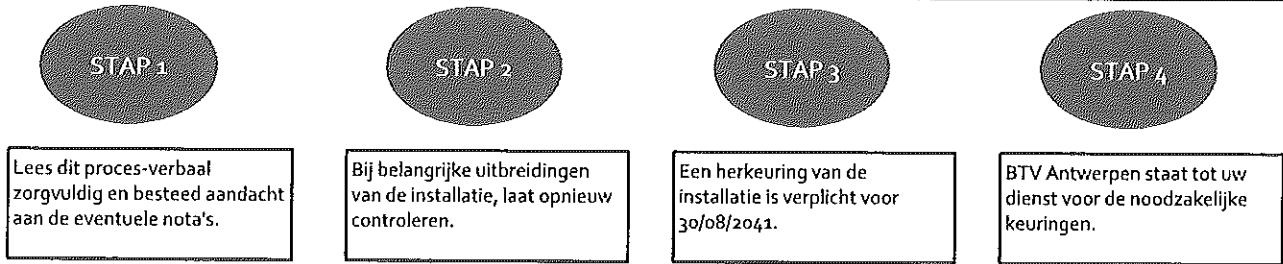



Schema's

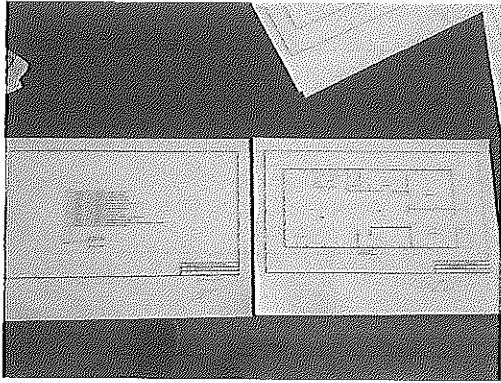

F1	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACT VAATWAS
F2	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACT BOILER
F3	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F4	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F5	0.03A 32A	2P	XVB 364	STOPCONTACT INDUCTIE KOOKPLAAT
F6	0.03A 16A	2P	XVB 362.5	VERLICHTING KEUKEN
F7	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F8	0.03A 16A	2P	XVB 362.5	VERLICHTING LIVING
F9	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN LIVING
F10	0.03A 16A	2P	XVB 362.5	VERLICHTING SLaAPKAMER 1 2 BERGING HAL
F11	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN SLaAPKAMER 1 2
F12	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN BERGING VERLICHTING STOPCONTACT BADKAMER
F13	0.03A 20A	2P	XVB 362.5	STOPCONTACTEN BADKAMER

DIF 1 40A2P 0.3mA
DIF 2 40A2P 0.03mA

KWH NR 56770806

AUGUST VAN DE WIELELEI 99 2108 DEURNE
DE JONGHE ROOTIER

850 993



F1	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACT VAATWAS
F2	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACT BOILER
F3	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F4	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F5	0.03A 32A	2P	XVB 3G4	STOPCONTACT INDUCTIE KOOKPLAAT
F6	0.03A 16A	2P	XVB 3G2.5	VERLICHTING KEUKEN
F7	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN KEUKEN
F8	0.03A 16A	2P	XVB 3G2.5	VERLICHTING LIVING
F9	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN LIVING
F10	0.03A 16A	2P	XVB 3G2.5	VERLICHTING SLAAPKAMER 1 2 BERGING HAL
F11	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN SLAAPKAMER 1 2
F12	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN BERGING VERLICHTING STOPCONTACT BADKAMER
F13	0.03A 20A	2P	XVB 3G2.5	STOPCONTACTEN BADKAMER

DIF 1 40A2P 0.3mA
DIF 2 40A2P 0.03mA

KWH NR 56770806


AUGUST VAN DE WIELEL 99 2100 DEURNE

DE JONGHE ROTTER

1370493




BORD 1STE VERDIEP



DJF 1.63A 4P 0.3mA
XVB4G10


BORD KELLER



AUGUST VAN DE WIELELEI 99 2100 DEURNE
DE JONGHE ROTTER


Handwritten signature and date:
15-0-93

BORD 1STE VERDIEP



DIF 1 63A 4P 0.3mA
XVB4G10

BORD KELDIER




AUGUST VAN DE WIELEI 99 2100 DEURNE

DE JONGHE ROTTER


1410 473

21

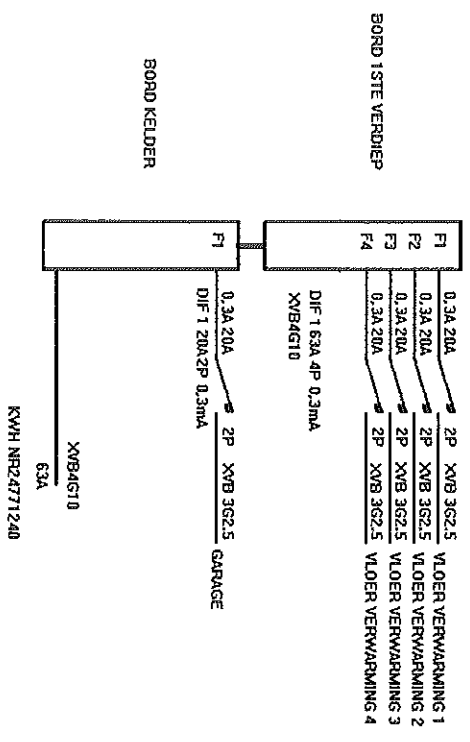


AUGUST VAN DE WIELEEI 99 2100 DEURNE
 DE JONGHE ROTTER

[Handwritten signature]
 1657 v 493

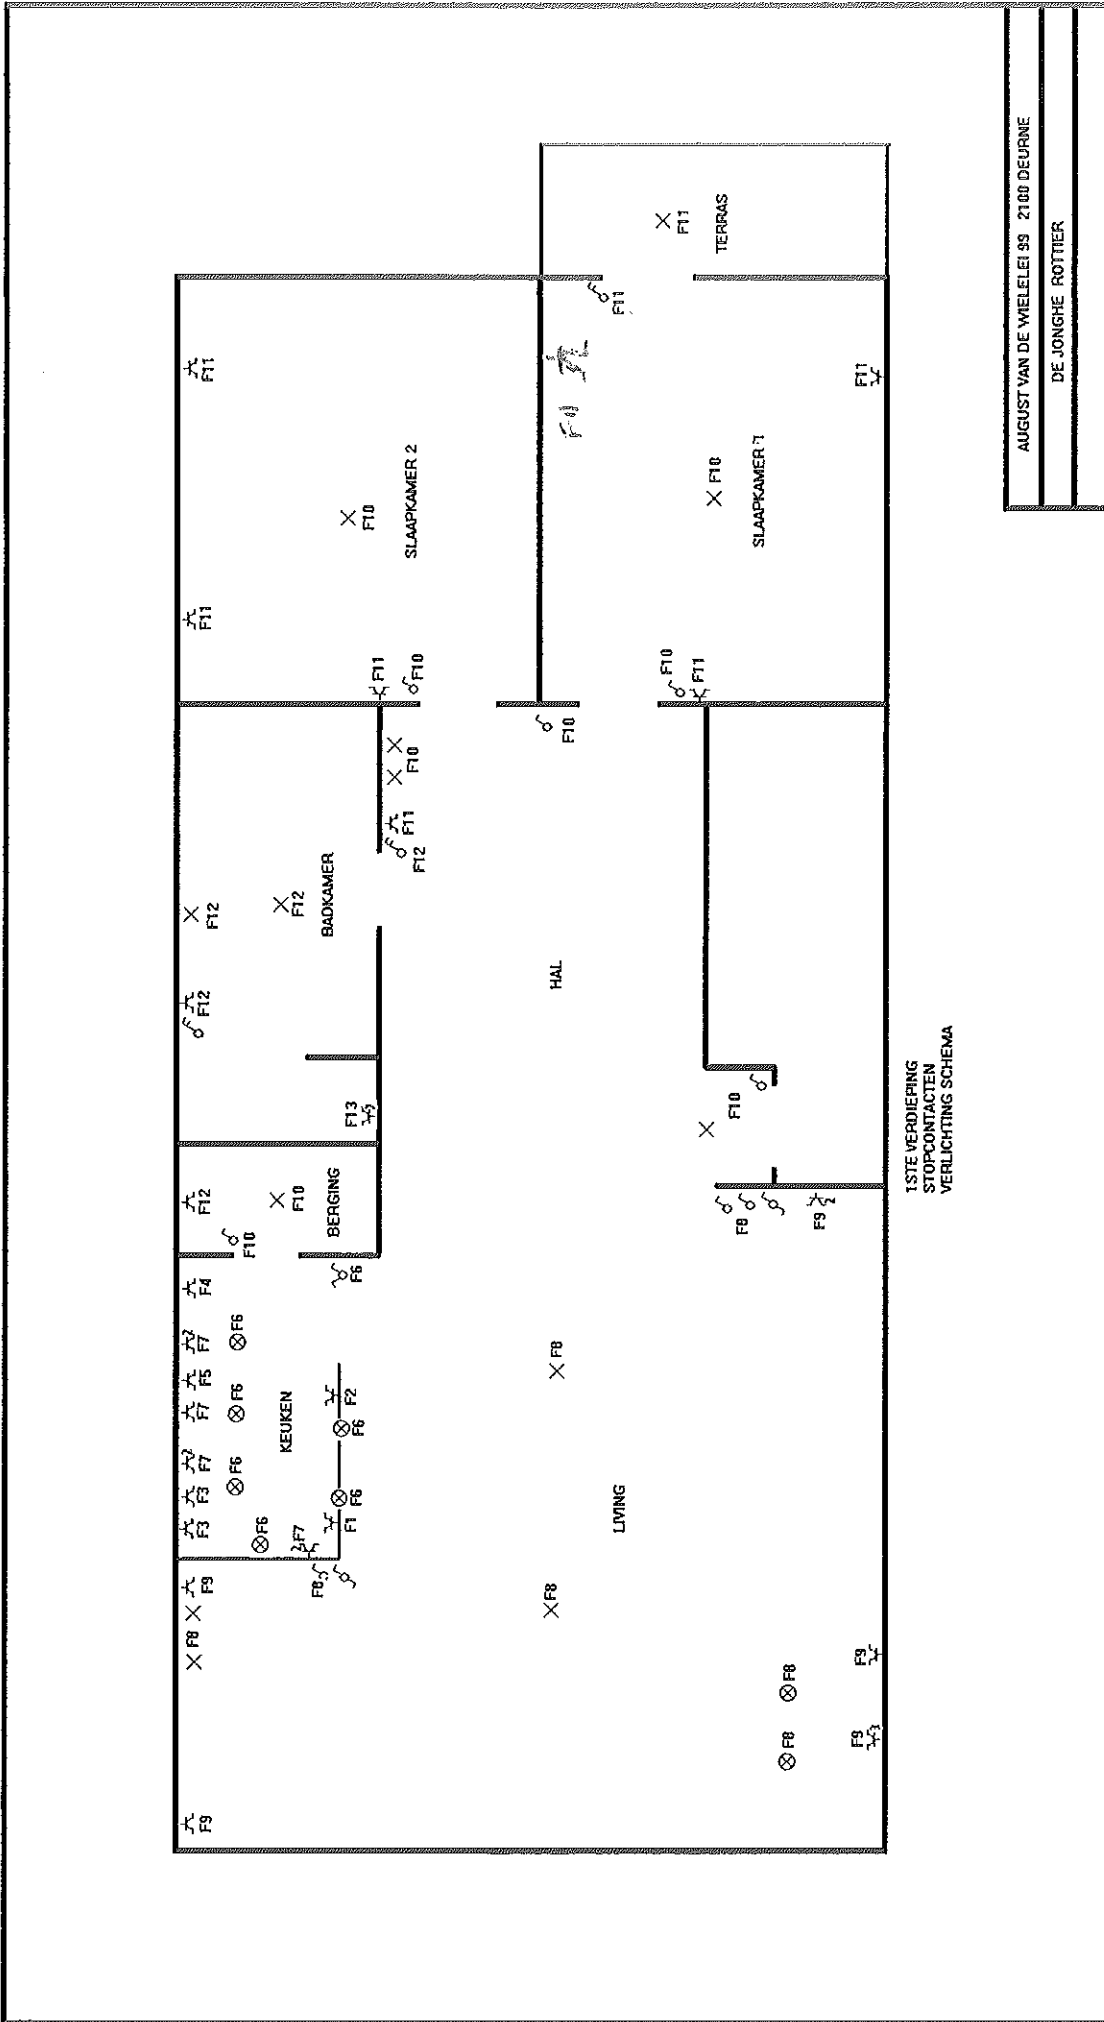

AUGUST VAN DE WIELELEI 99 2100 DEURNE
DE JONGHE ROTTIER

BTU 473

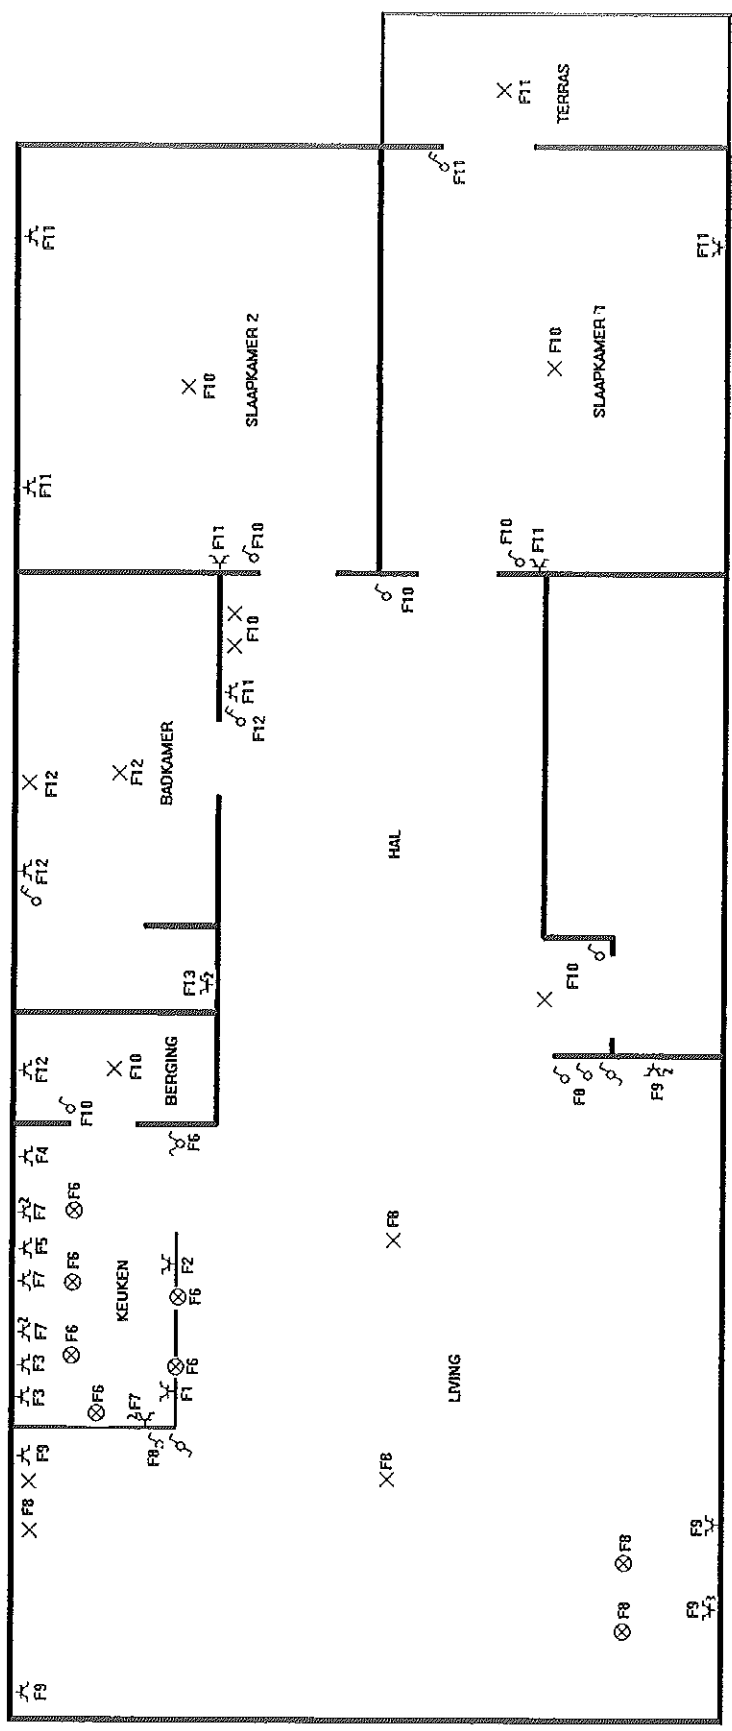

1STE VERDIEPING
STOPCONTACTEN
VERLICHTING SCHEMA

AUGUST VAN DE WIELELEI 99 2100 DEURNE
DE JONGHE ROTTIER

Handwritten signature and date:
 [Signature]
 13 JUN 93
