

3336734

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~ onderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : *woning*

Plaats van onderzoek : *Tischelarystraat 3, Turnhout*

Eigendom van : *Helena Rijnen*

Opdrachtgever : *idem*

Installateur : *Tom Wagels, Herentalsbeek 15, Zarsel*

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : *Van Geyp* Datum van onderzoek : *9/8/12*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V~~ + N Max. Beveiliging : *40A* Omschakelaar: stand : *✓*

Hoofdbeveiliging : Zek. : *aut. mach.* Schak. : *diff 2P*

Meter-bordverbinding : kabeltype : *EXVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : *EXVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²

Bovengronds net / ondergronds net / op bovengronds net / ondergronds net - Wachtbuis : *geplaatst* / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig

Aardelektrode : Type : *horizontale geleiders* Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *15* Ω

Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *15* Algemene isolatieweerstand : *305* MΩ

Diff. schak. : algemene : *2P 40A 300* mA bijkomende : *2P 40A 30* mA

werking testknop : in orde - *niet* controle foutlus : in orde - *niet*

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - *nee* Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - *niet* onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - *niet* Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

transfo's niet bereikbaar

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.
- N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen

BESLUIT


De installatie is conform / *niet conform* met het AREI.
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : *9/8/2037*
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijk wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.
 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

A	Stopcontacten beneden
B	Stopcontacten beneden keuken
C	Stopcontacten boven
D	Stopcontacten zolder
E	Verlichting
F	Ketel
G	Badkamer
H	Oven
I	Wasmachine
J	Diepvries
K	Droogkast
L	Afwasmachine
M	Verlichting

E VOB 10φ

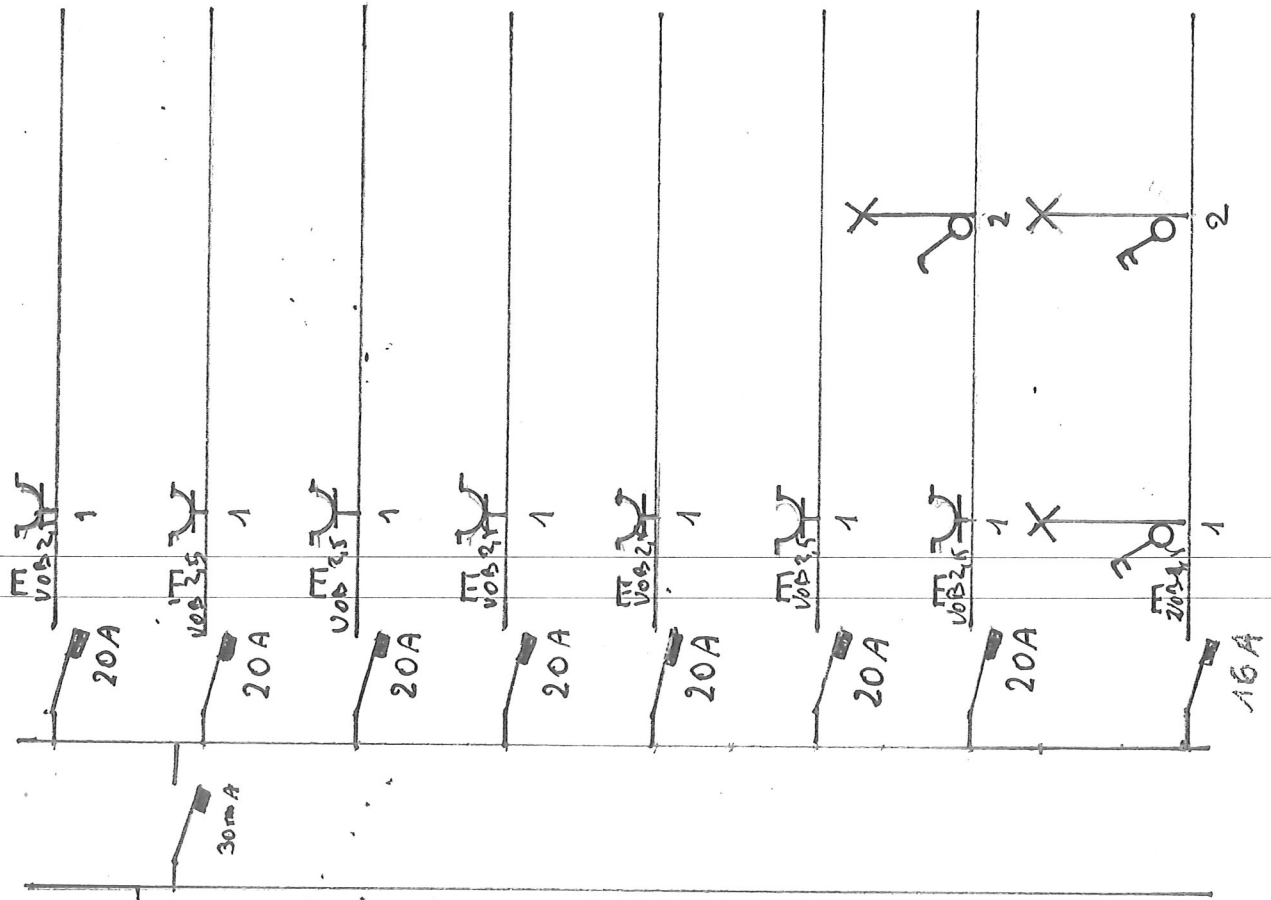

F

G

H

I

J

K

L

M

INSTALATEUR
TOM NAGELS
HERENTALSDE BAAN 15
2360 ZOERDEL

ADRES AUTOKATE,
TECHNICAARJ, STRAAT 3
2300 TURNHOUT

