

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/09/2019 Inspecteur: Barry Behiels Mentor: Installateur: SOS home
ID-label: Emiel Van Winckellaan 52 Client reference: IK. nr.:
B.T.W. nr.: 0562.911.289
Merk en type meettoestel: Fluke 1663 Serie Nr.: 4396050

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Emiel van Winckellaan
Huisnummer 52
Busnummer App 2
Postcode 9200
Gemeente Dendermonde

Naam contactpersoon Electricien Mario
Telefoon 0471241582
Gsm nr. (SMS)

Eigenaar

Naam Palletencentrale
Straatnaam Emiel van Winckellaan
Huisnummer 52
Busnummer App 2
Postcode 9200
Gemeente Dendermonde

Installateur

Naam SOS home
BTW nr. 0562.911.289
Telefoonnummer 0471.24.15.82
E-mail info@sos-home.net

Type : appartement

EAN : 54xxxxxxx

Teller Nr.: : 33642490

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 10 Isolatie: 55,5 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 2,8 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	-	-	A	10	Ok	Ok
30	40	-	-	A	3	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
9	C	16		2	2,5
1	C	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 28/9/2044
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Barry Behiels



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90


BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/9/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






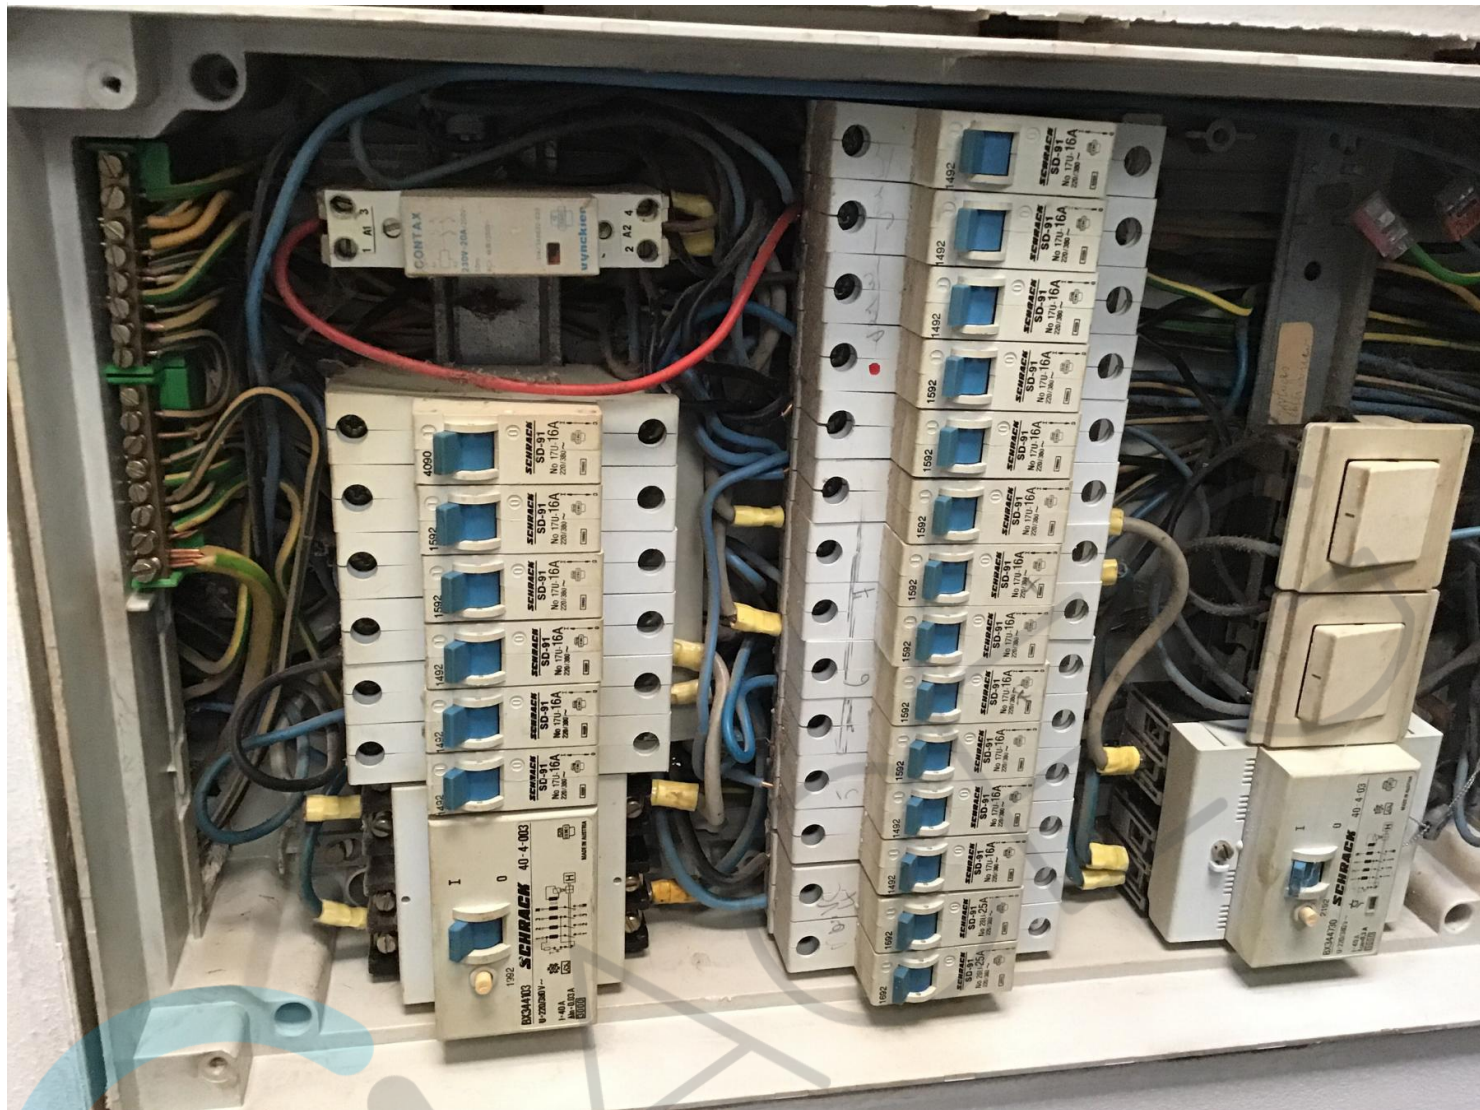





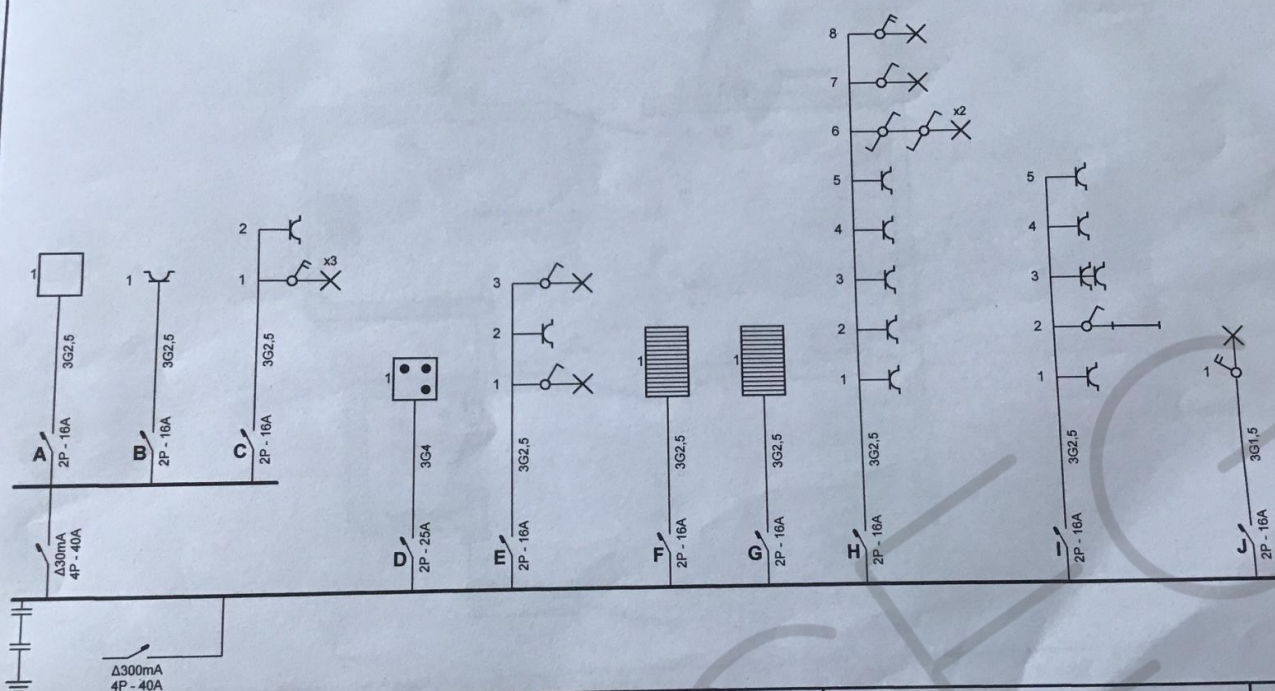


Erkend Organisme
aceg jan de lausnay
Tel.: 02 880 8890

QACEE
Barry Behiels
25/9/14

Plaats van de elektrische installatie
gelijkvloeren achterkant
Emiel Van Winckellaan 52-2
9200 Dendermonde

Installateur
SOS-Home
Genepas 21
2450 Meerhout
GSM: 0471 24 15 82
e-mail: info@sos-home.net
BTW BE 0562.911.289

p. 1/2
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

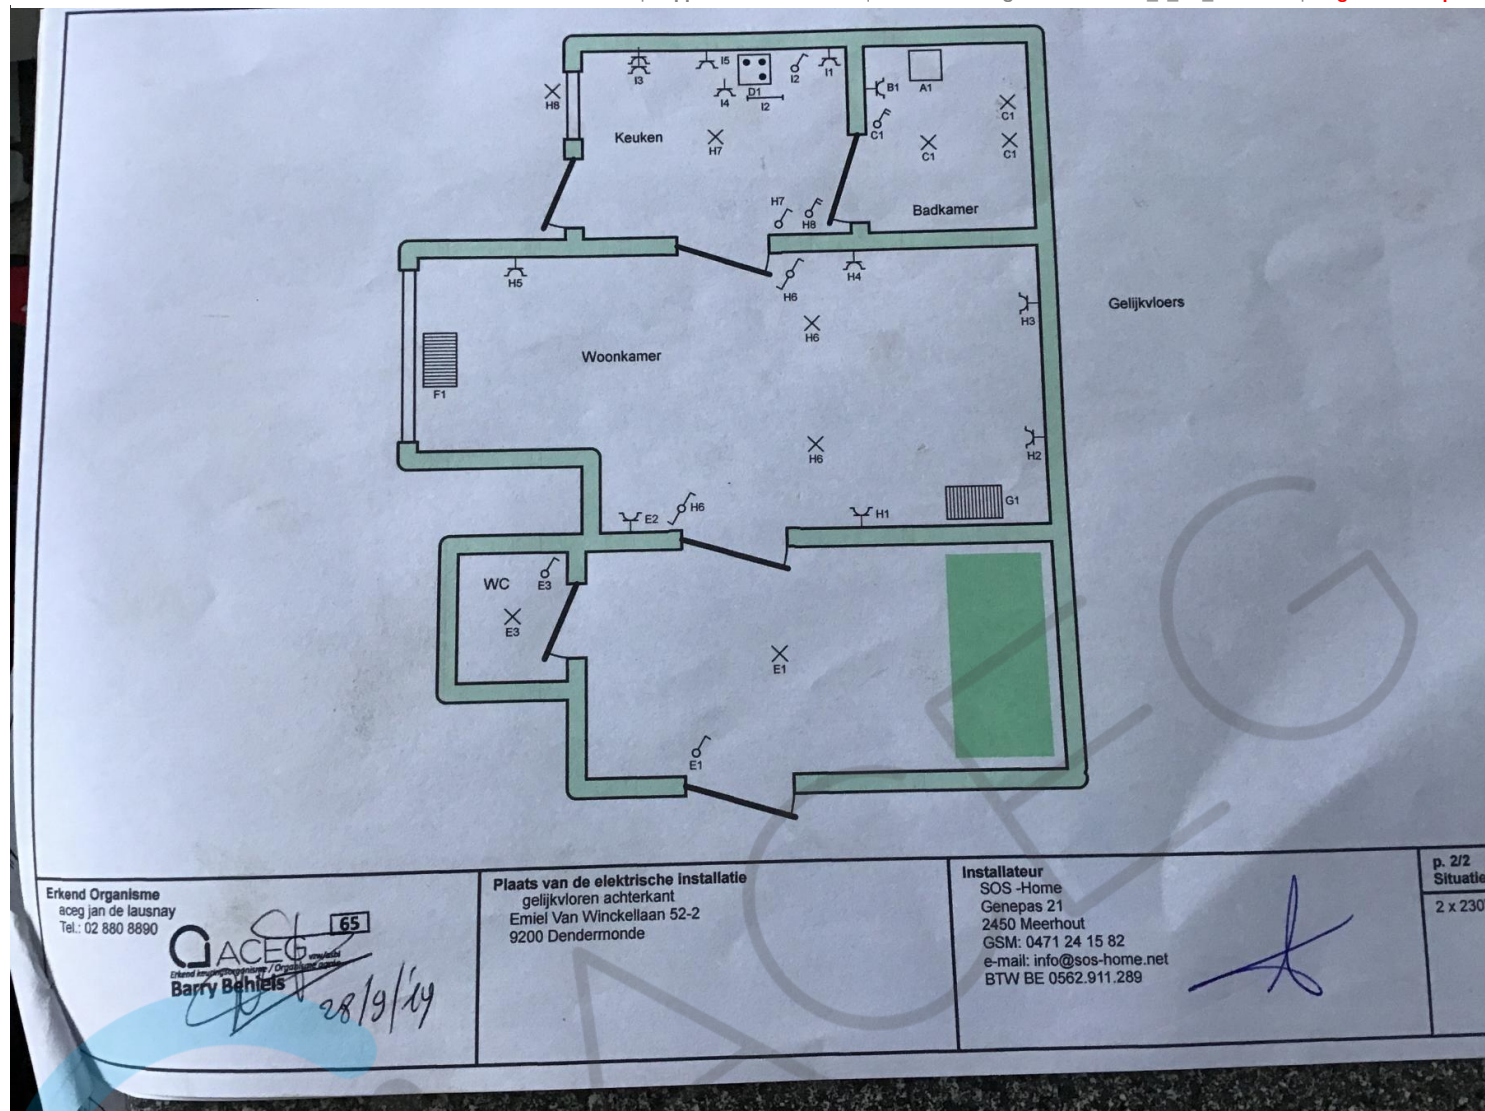

Erkend Organisme
aceg jan de lausnay
Tel.: 02 880 8890

QACEG
Barry Behiels

65

28/9/14

Plaats van de elektrische installatie
gelijkvloeren achterkant
Emiel Van Winckellaan 52-2
9200 Dendermonde

Installateur
SOS-Home
Genepas 21
2450 Meerhout
GSM: 0471 24 15 82
e-mail: info@sos-home.net
BTW BE 0562.911.289

[Handwritten signature]

p. 2/2
Situatie
2 x 230V

