

3227359

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



app B.1.1 VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorzienig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaren~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningwijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : APP

Plaats van onderzoek : Zeelandstr 44 ~~2660 Hoboken~~

Eigendom van : Wauters Elektro

Opdrachtgever : Wauters Elektro

Installateur : 2870 Arendsenk

BTW : 401 039 286 D-kaart : Bentel J Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Bentel J Datum van onderzoek : 5/6/19

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : KV3 aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 7 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 12 Algemene isolatieweerstand : 70 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p40A-300 mA bijkomende : 2p40A-30 mA

werking testknop : in orde / niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toetsen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 5/6/19, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur
de onderzoeker

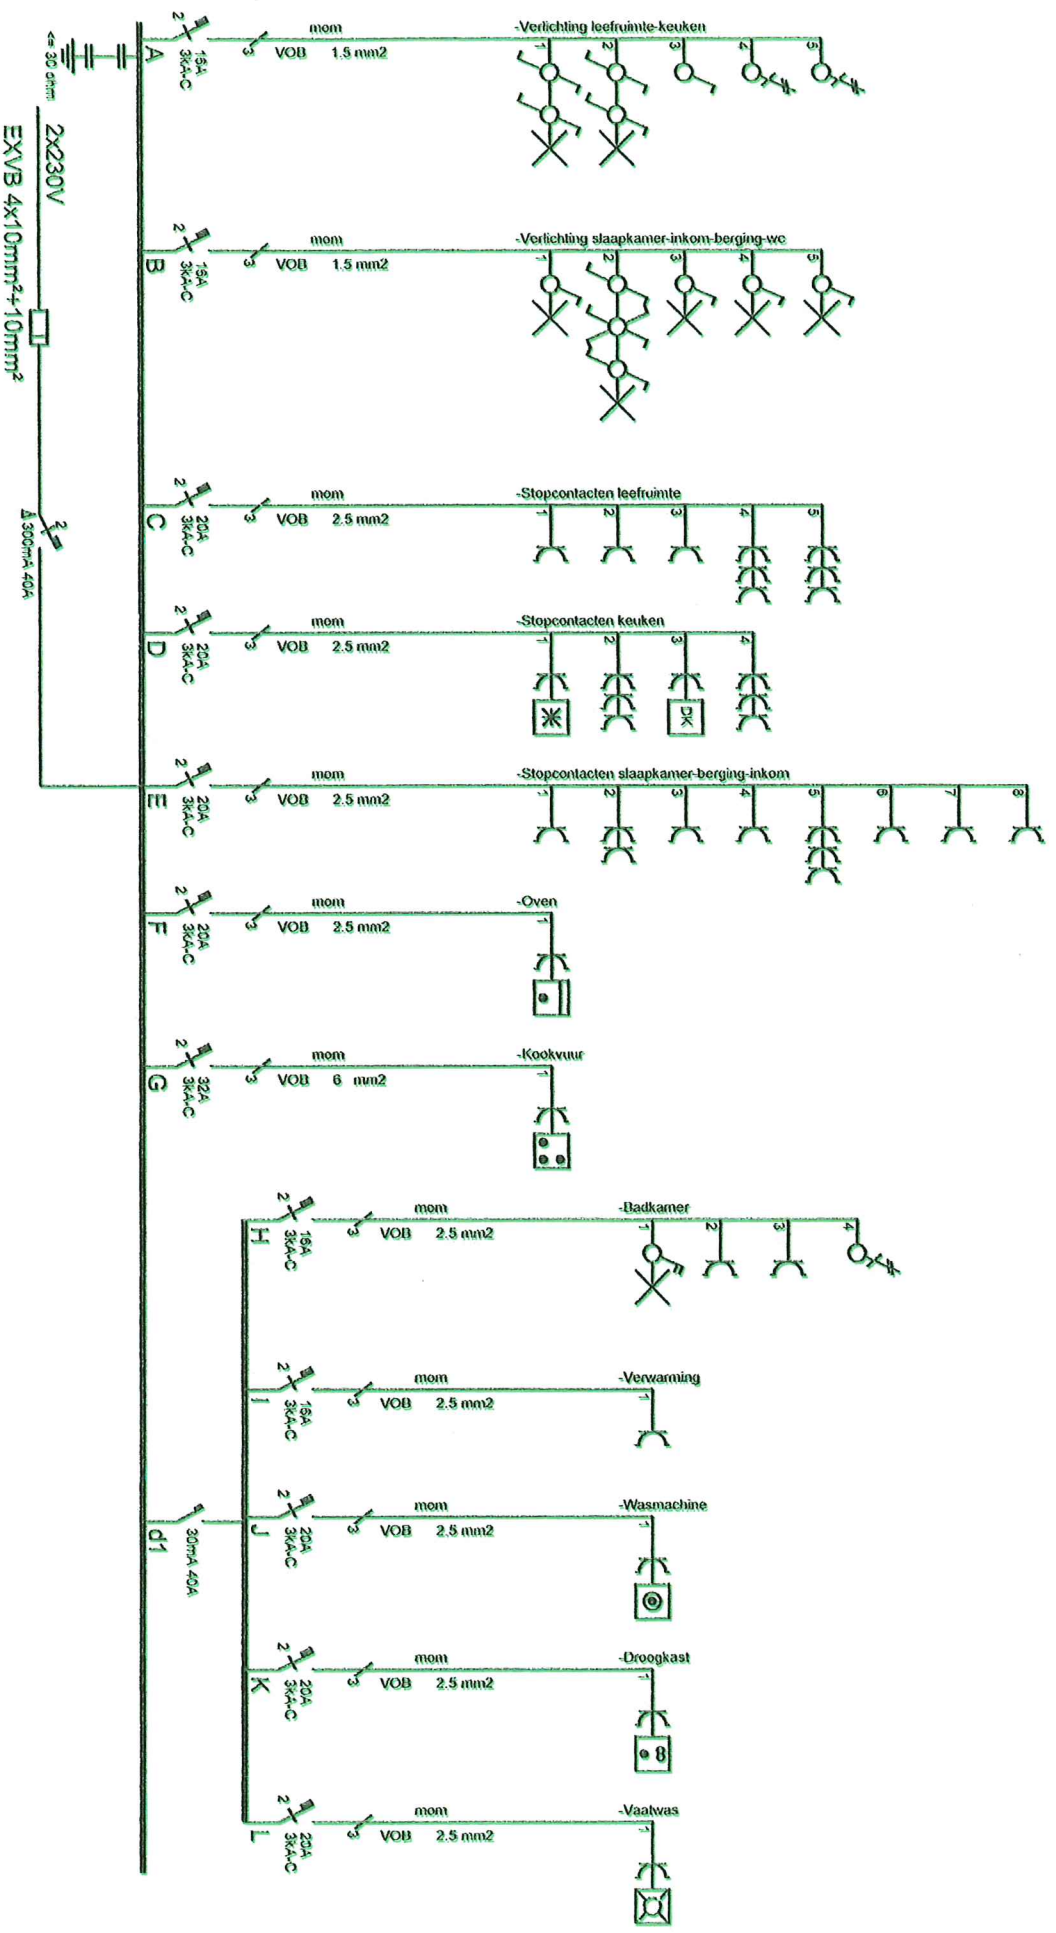

P1/1

Afgev. erkend organisme

3227319
OEB

5/6/9

Martens - Dupont

Zeealandstraat 42-46 (B1.1)
2660 HOBOKEN
EAN.

Verantw. uitvoering

03 / 06 / 2009

Wauters Elektro bvba

Schutterstraat 17 2370 Arendonk
tel: 014 / 672070 fax: 014 / 672135
btw: BE 471.839.276
e-mail: info@wauterselektro.be

Project "Maximus"

Martens - Dupont
Zeelandstraat 42-46
2660 Hoboken

app. B1.1

Legende

- noodverlichting
- lichtpunt aan plafond
- enkelpolige schakelaar
- schakelaar met verkliklamp
- dubbelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- wisselschakelaar met verkliklamp
- kruisschakelaar
- drukknop
- verlichte drukknop
- plafondopbouw bewegingsdetector
- wandinbouw bewegingsdetector
- parlofoon
- contactdoos
- dubbele contactdoos (verticaal resp. horizontaal)
- contactdoos opbouwthermisch
- voeding XVB 3G
- voeding XVB 4G
- voeding XVB 5G
- kabel distributiecontact
- telefooncontact
- wachtleiding + trekdraad voor tv, tel, po naar berging
- deurbel
- elektrisch slot

Standaard hoogten (center)
stopcontact 25 cm
schakelaar 100 cm
thermostaat 150 cm
parlofoon 150 cm

A 18-10-2008 basisversie
wijzigingen:
B
C
D

voor akkoord

datum:

naam:

handtekening:

