

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: -

ProKo.: LS08
N° rapport : 4908470
N° rapp. prov.:
Date: 01/09/2017



Organisme de controle a.s.b.l.

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: _____ Type d'installation: renouvelée Type de locaux: maison
Lieu de contrôle: RUE DES TERMES ROMAINS 58 ARLON 6700
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/271/271bis
Date du contrôle: 01/09/2017 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 30/09/2042 Contrôleur: LAUVAUX PETER
Propriété de: _____
Installateur: _____
T.V.A.: - Carte-ID: - Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°.: - N° compteur: 5075030 Index I: 003822 Index II: 010694
Raccordement: réseau aérien Fourreau: - Plaque d'Isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 220V Protection max.: 25A Protection principale: aut. 3p 25A Interr.: aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart: type de câble: VOB nombre de conducteurs: 3 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Electrode de terre: type: barres section: 16 mm² Résistance de dispersion: < 24 Ohm
Interruteur Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 4p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 5.80 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotential: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: voir les schémas en annexe schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 8

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

Néant

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.

L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

1/1


organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

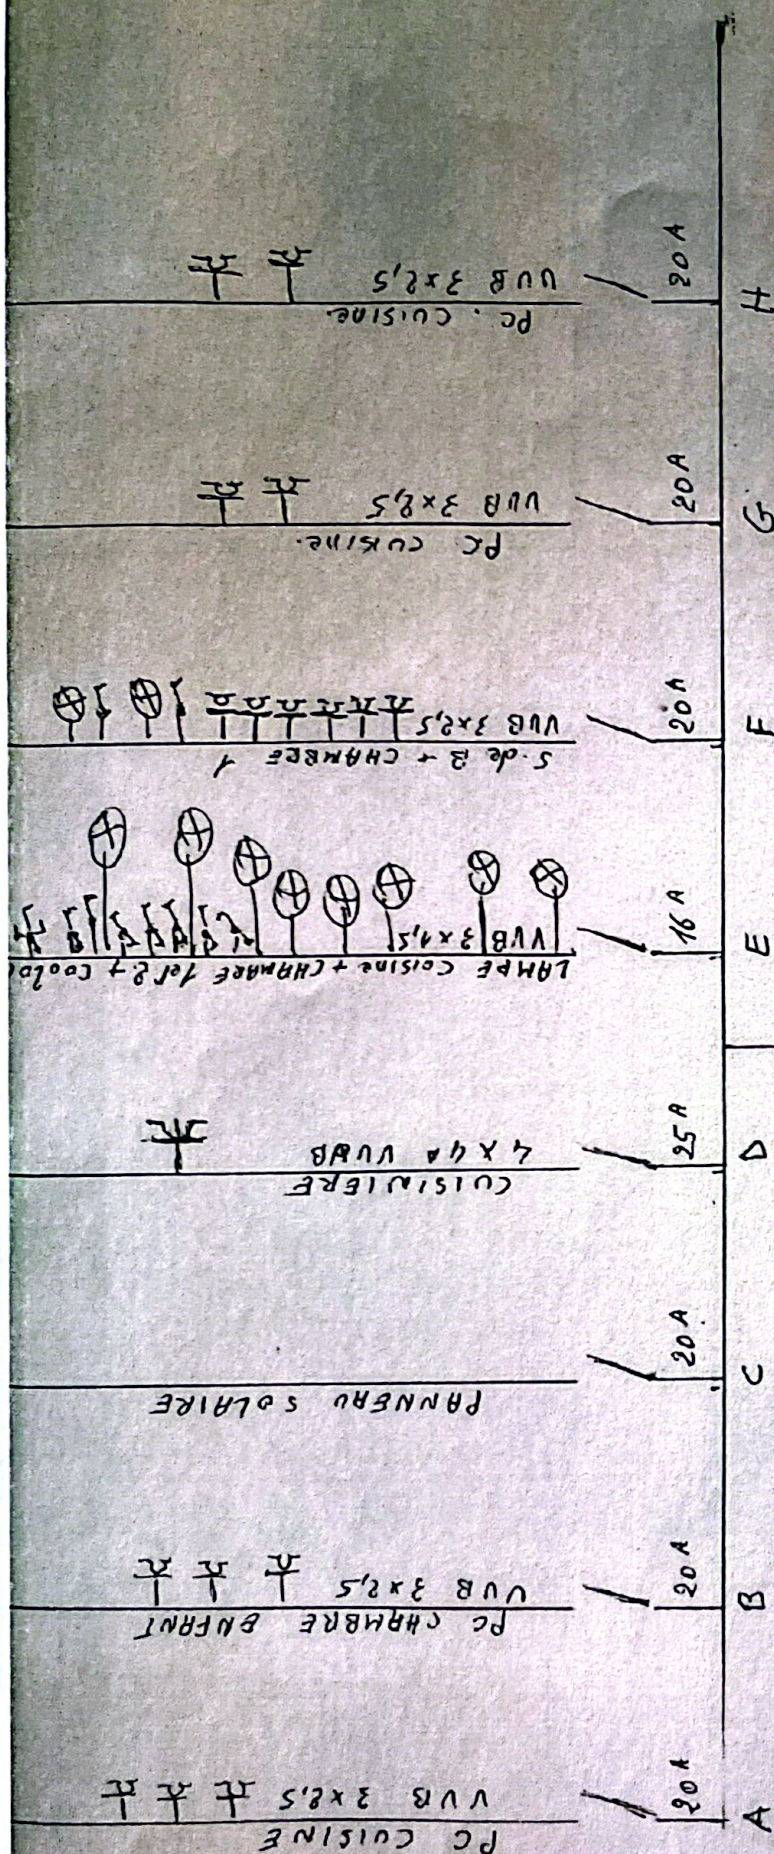

Installation est contrôlée par:
 OCB, Place des jardins de Baselles 4 boîte 23-5101 Epert (Namur)
 Inspecteur : **Peter Lauvaux**
 Date : 01/09/2014.
 PV n° : 4308470
 Signature :

DIFF 30mA
40A

DIFF 300mA
63A

A1

A1

A2

A1

A3

A2

G1

E2

CUISINE

E1 E2


F1

Lauvaux Peter
GSM 021/248 127
peter.lauvaux@ocb.ch
www.ocb.ch



H G2

E1
E2
E3



CHAMBRE 1

F4

F4

F1

S-de-B

F2

Lauvaux Peter
GSM 0493/246 127
peter.lauvaux@ocb.be
www.ocb.be



F7 F3

F5

E4

E4

E3

E3

F6

H
82

86

85

B1
E3
E5

CHAMBRE 9

Lauvaux Peter
GSM 0493/246 127
peter.lauvaux@ocb.be
OCB www.ocb.be

83

83
