

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 23216  
Cont.pers.: STROOBANTS GERT  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0497/17.03.03  
e-mail: info@dakwerken-stroobants.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5115506  
Voort. verslagnr.:  
Datum: 20/11/2018

Klant / Opdrachtgever:  
STROOBANTS  
NEERIJSESTRAAT 25  
3020 WINKSELE

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie: Nieuwe/Bestaand Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: STROOBANTS GERT KAPELLESTRAAT 42 TERVUREN 3080  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling/controle Volgens AREI Art.: 86/271/271bis/270  
Datum onderzoek: 20/11/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/11/2043 Onderzoeker: GYBELS JO  
Eigendom van: -  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: ontbreekt Schak.: alg. diff. schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 27,4 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: nvt bijkomende diff.: 2p 40A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 12,40 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☒ verlichting ☒ Toestellen  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12

Zie schema's

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


N Deze controle is een momentopname, verlichting en toestellen nog niet definitief geplaatst.  
N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.  
I Geen.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.



Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

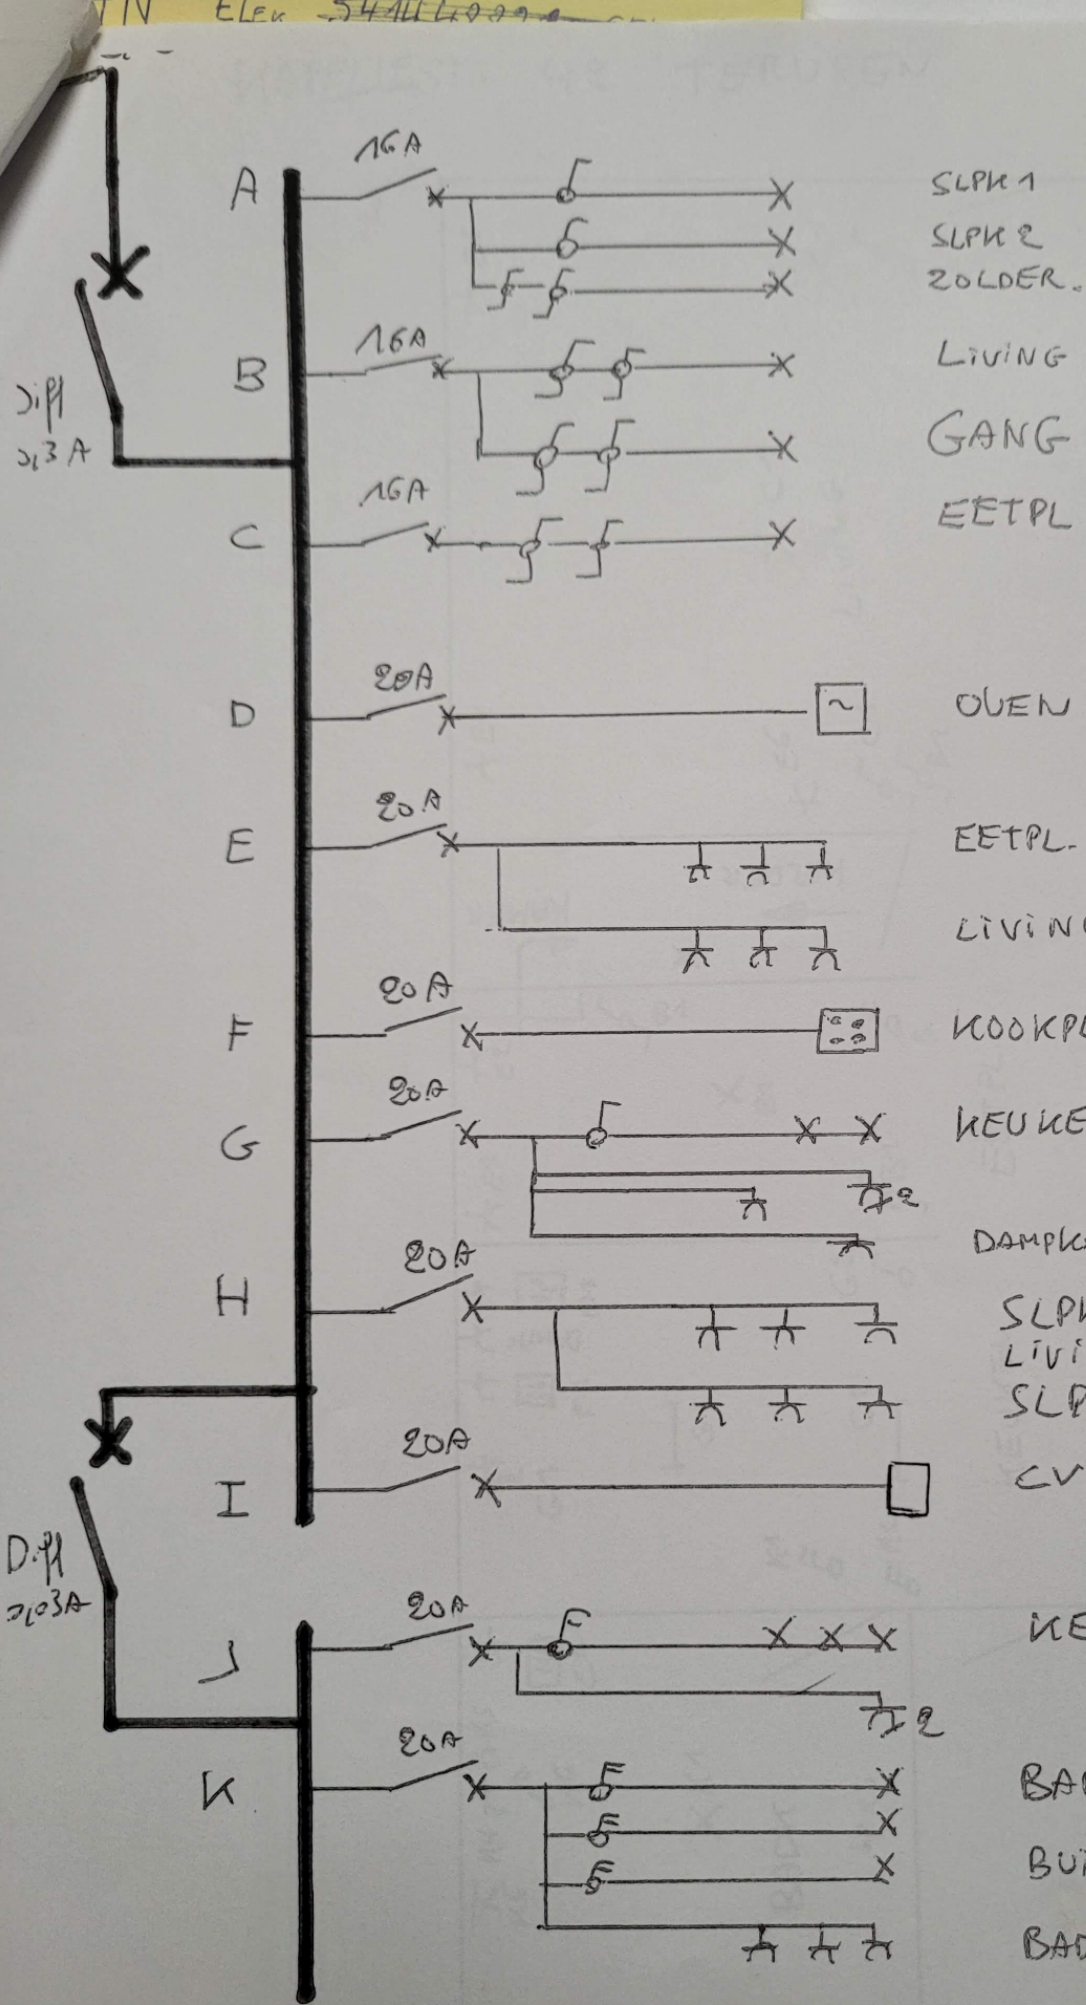


bvba STROOBANTS  
 Nieuwstraat 25  
 3020 Winksele  
 BE 651 555 155

KAPELLESTR 42 TERUREN

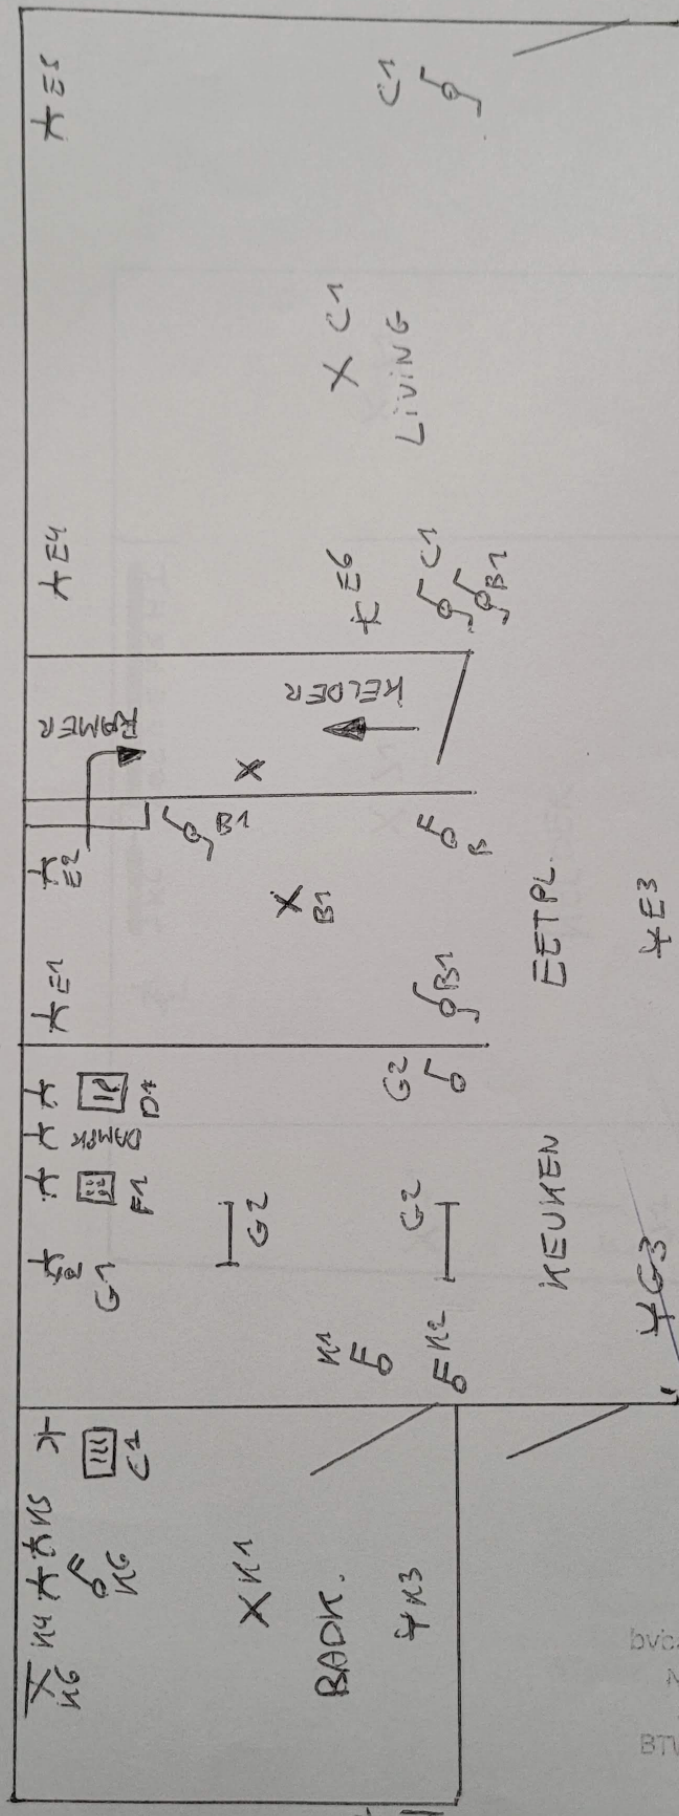


bvba STROOBANTS  
Nieuwstraat 25  
3020 Willebroek  
BTW-BE 081 558 114

bvba STROOBANTS  
 Neerijsestraat 25  
 3020 Winksele  
 BTW BE 861 556 156

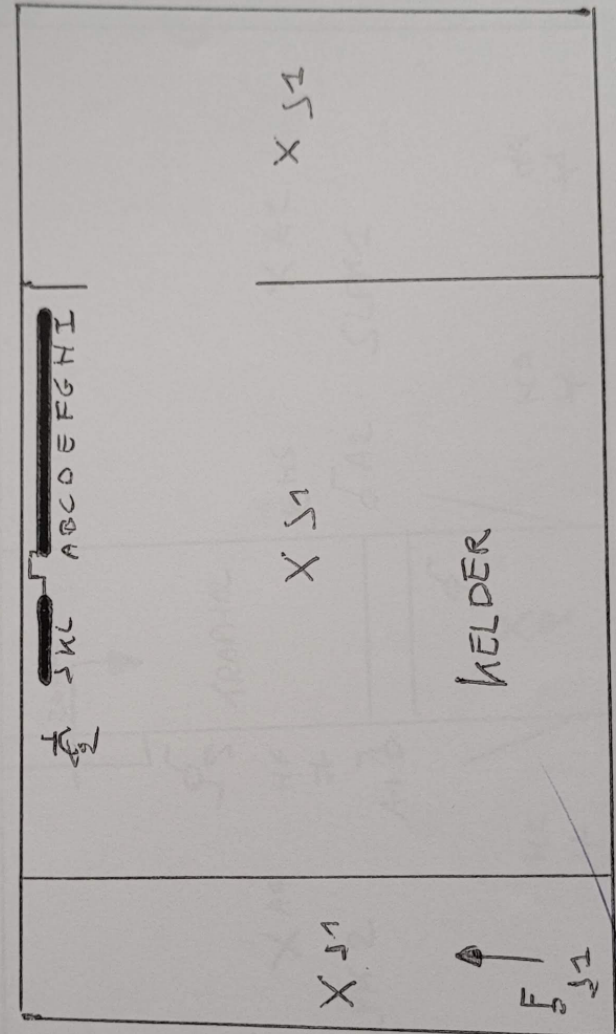

**GYBELS JO**  
 GSM 0496/290 014  
 jo.gybelis@ocb.be  
 www.ocb.be

bvba STROOBANTS  
 Neerijsestraat 25  
 3020 Winksele  
 BTW BE 861 556 156

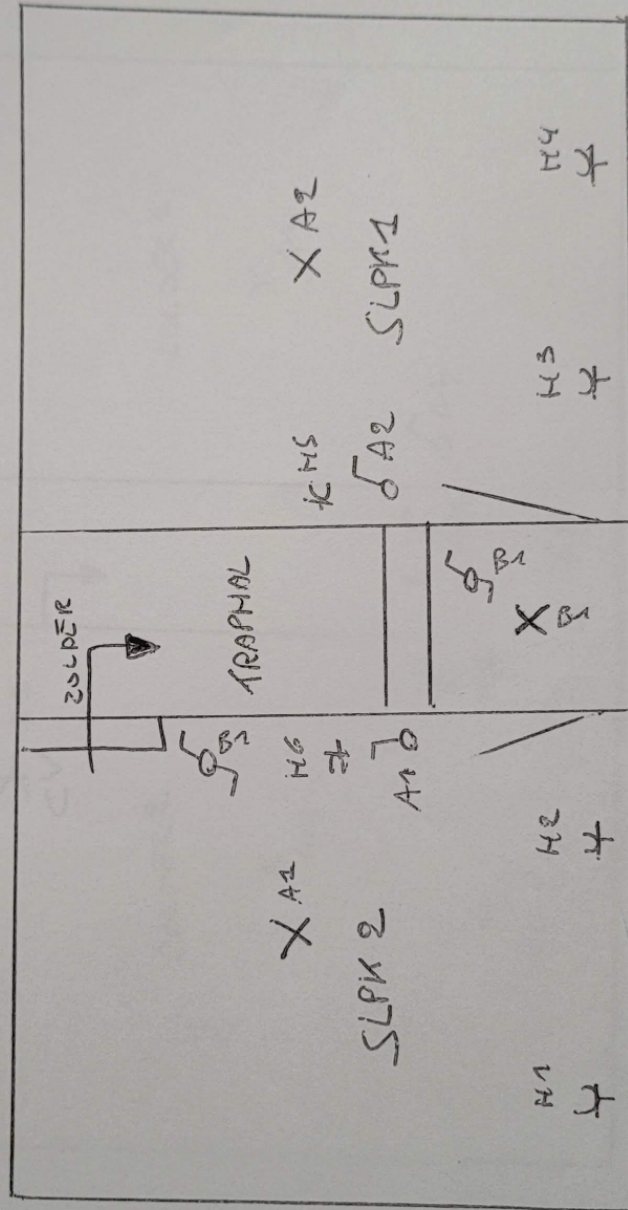

**GYBELS JO**  
 GSM 0496/290 014  
 jo.gybels@ocb.be  
 www.ocb.be

bvba STROOBANTS  
 Naarfvestrust 25  
 3020 Winkelo  
 BTW BE 081 568 155

