

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

**Datum keuring:** 24/11/2025

**Inspecteur:** Thibault Vanhoutte

**Mentor:**

**Installateur:** -

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel  
Eurotest ET61557

Serienummer: 19481279

**Datum verslag:** 01/12/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2130331

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Sint-Joannes Berchmansstraat  
Huisnummer 48  
Busnummer  
Postcode 2170  
Gemeente MERKSEM  
Land België

#### Eigenaar

Naam Ponsaert Mellissa  
Straatnaam Sint-Joannes Berchmansstraat  
Huisnummer 48  
Busnummer  
Postcode 2170  
Gemeente MERKSEM  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

**Type :** woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

**EAN :** 541448820046288866

**Teller Nr.:** : 1SAG1200170779



#### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 5.25 MΩ

RE: 11.58 Ω

OK

OK

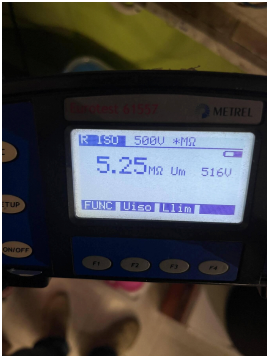

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| $I\Delta$ (mA) | In (A) | In - andere (A) | $I_{\Delta t}$   | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|----------------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300            | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 15                 | OK   | OK    |
| 30             | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 6                  | OK   | OK    |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|--------------|
| 2              | C     | 16                 |          | 2 | 1,5          |
| 2              | C     | 16                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 6                  |          | 2 | 2,5          |
| 8              | C     | 20                 |          | 2 | 2,5          |
| 1              | C     | 32                 |          | 2 | 10           |
| 1              | C     | 32                 | Intern   | 2 | 10           |

|                             |    |                                 |     |                     |    |
|-----------------------------|----|---------------------------------|-----|---------------------|----|
| Visueel nazicht (algemeen)  | OK | Directe aanraking               | OK  | Indirecte aanraking | OK |
| Aansluitingen               | OK | schema in bijlage door Aceg vzw | OK  |                     |    |
| Equipotentiale verbindingen | OK | Doorsnede geleiders             | OK  |                     |    |
| Continuïteit                | OK | Verlichting / toestellen        | NVT |                     |    |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N37 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

Nota: Woning bewoond en bemeubeld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/11/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.


Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:18 tot 13:19

De inspecteur Thibault Vanhoutte



**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die conform is:                               |                                                                                                       |                                                            |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                     | Stap 4                                                      |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/11/2050 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |





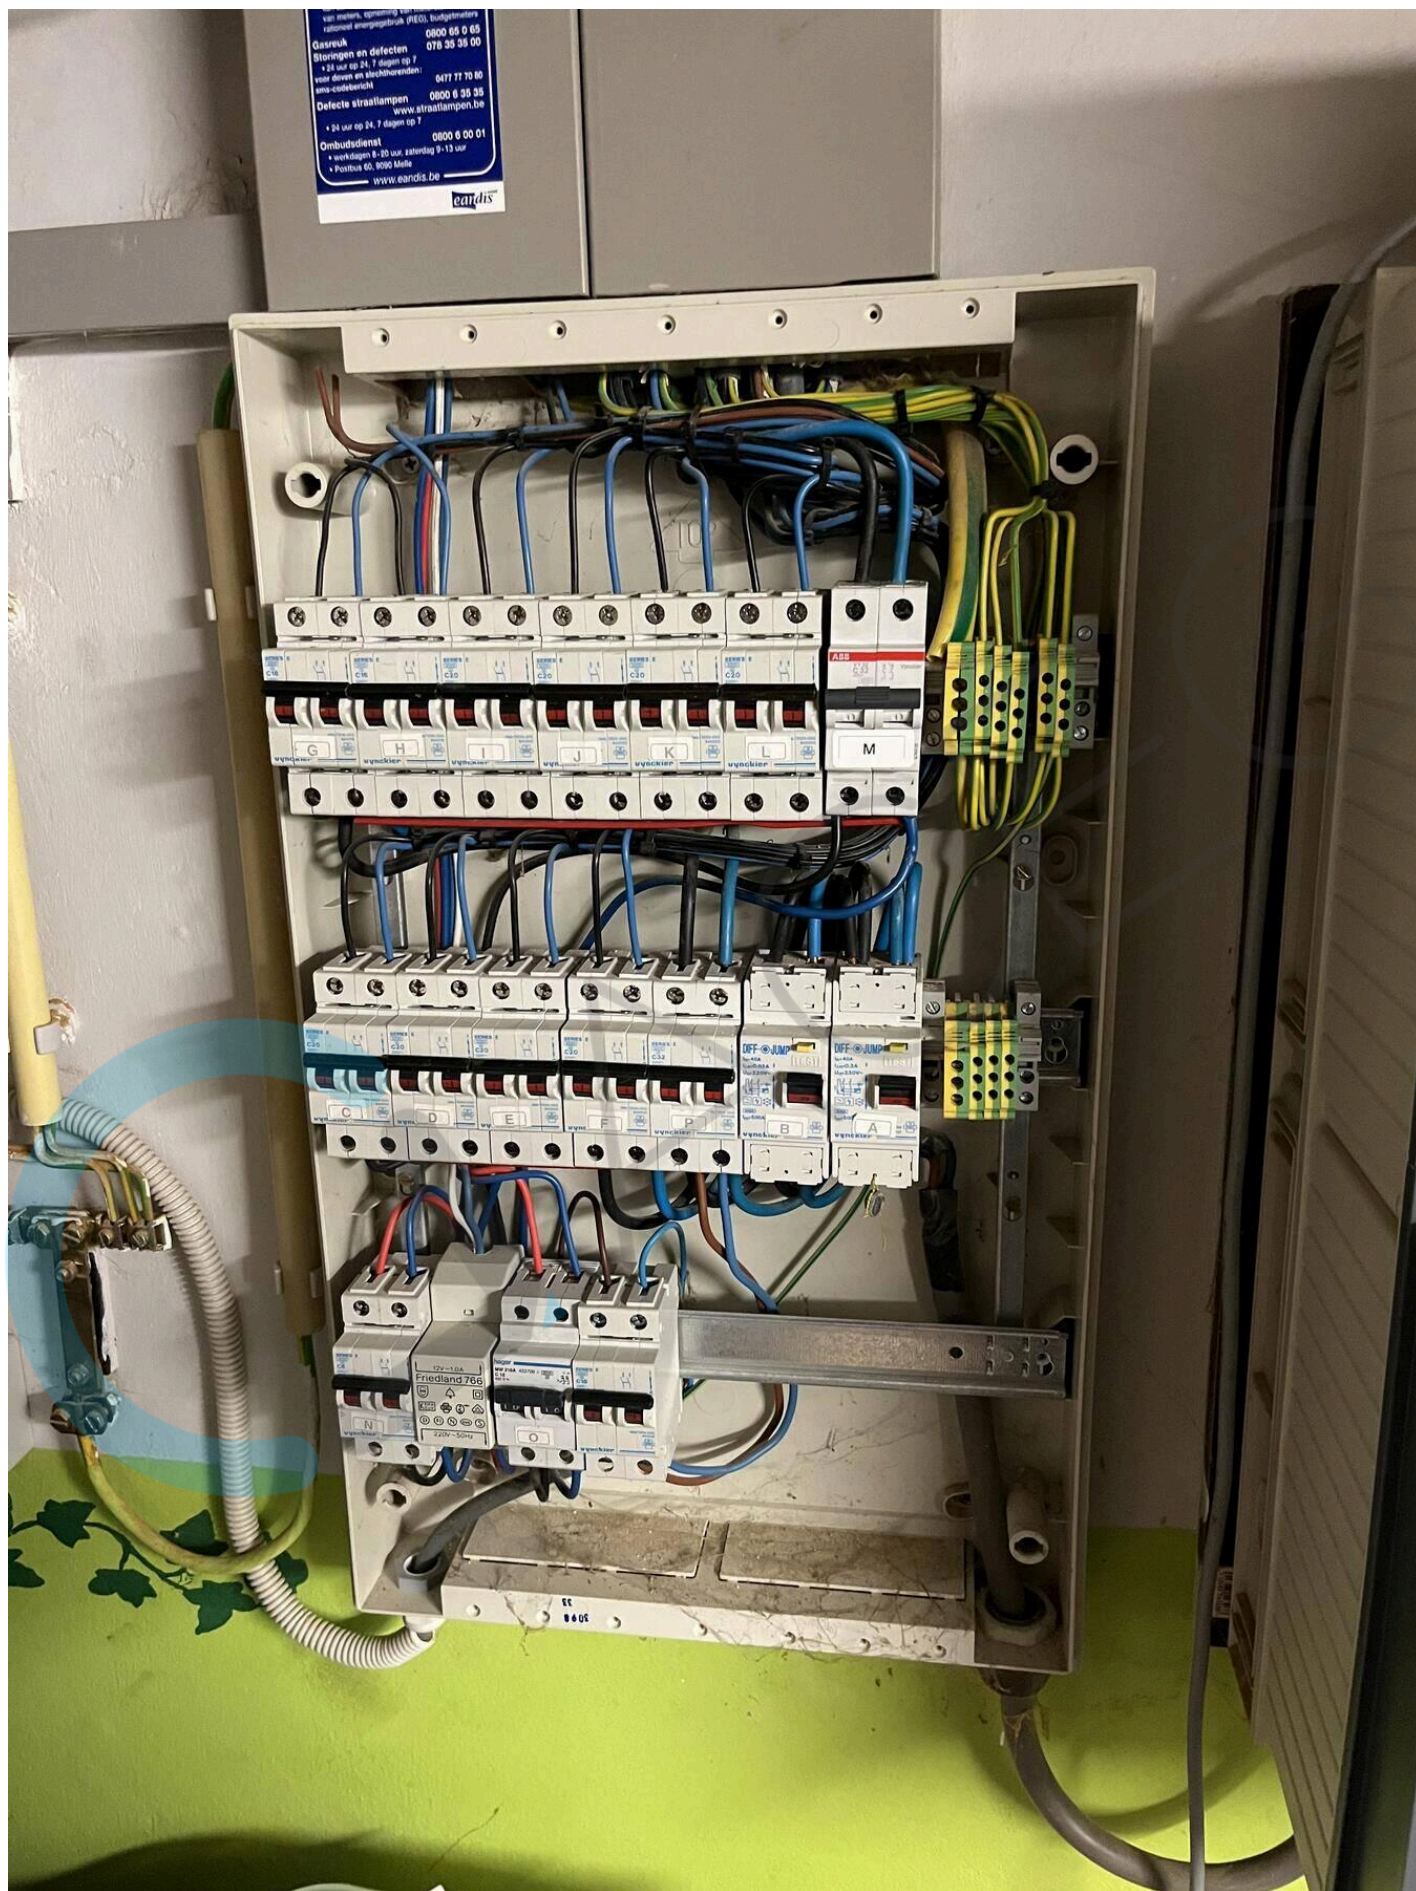



















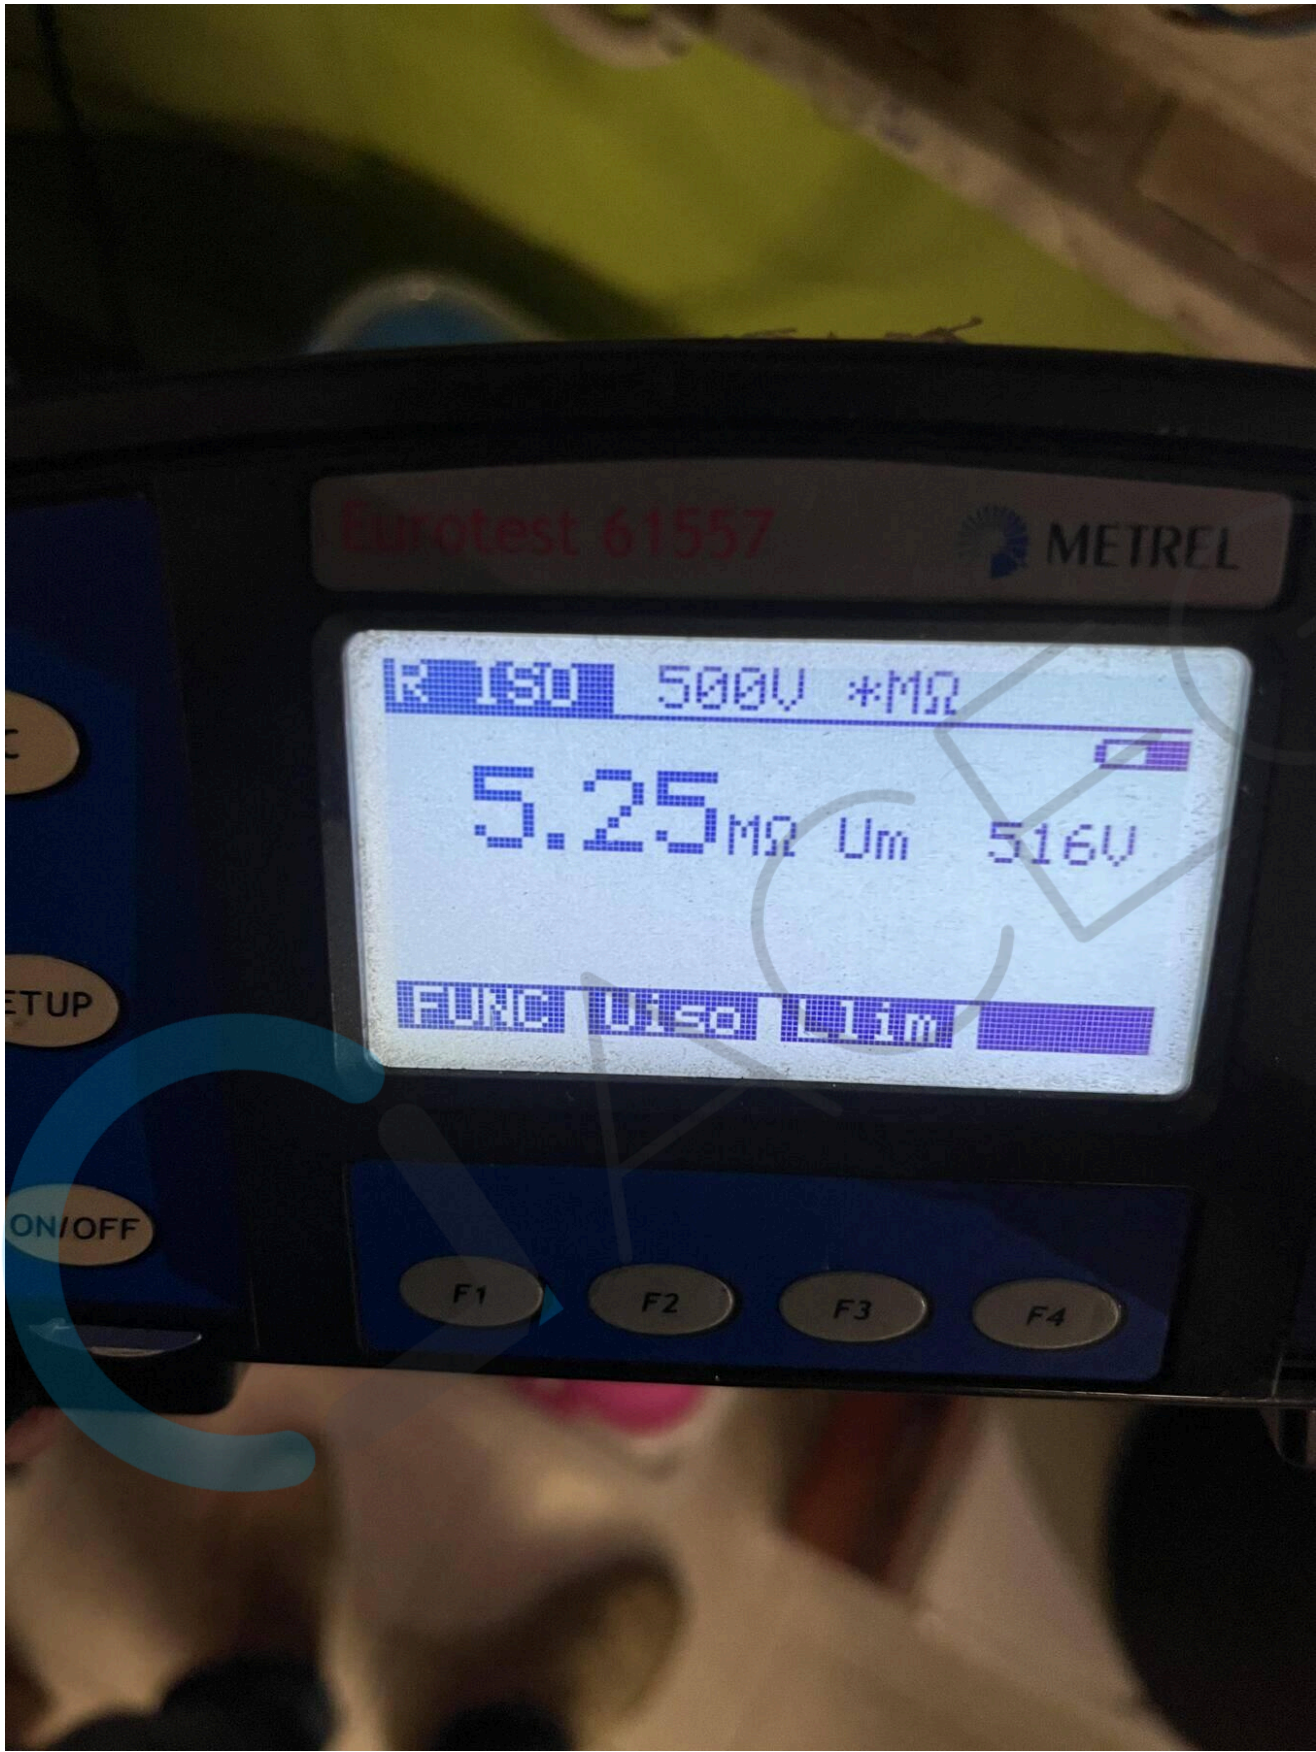



# SITUATIE SCHEMA.

MEYR VAN DEN BERG LITA.  
ST JOANNES DEWANS STR. N° 3  
2170 MERKSEM

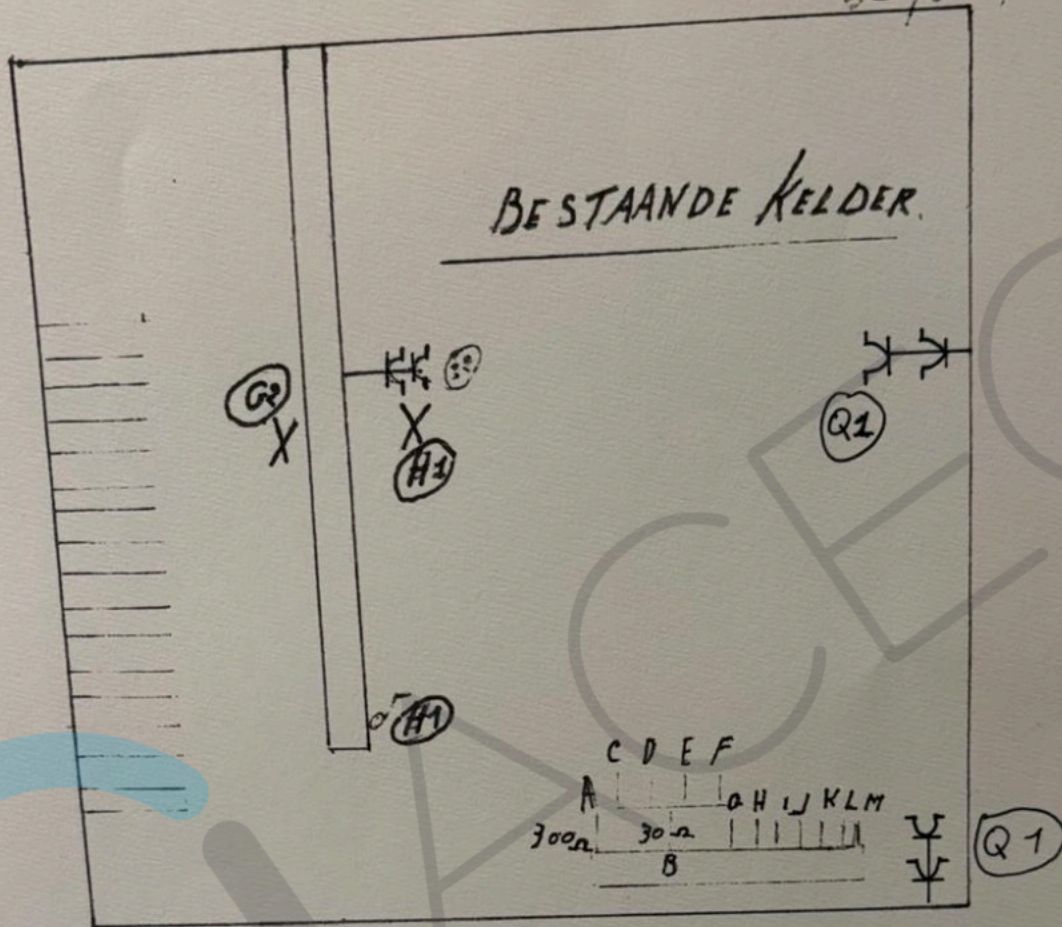

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR  
DE UITVOERING VAN HET WERK


8.1.1999




# SITUATIE SCHEMA.

## GELIJKVLOERS.

MEUR VAN DEN BERGH ANITA  
ST. JOANNES BERCHMANSTRAAT 48  
2490. M/ERKSEM

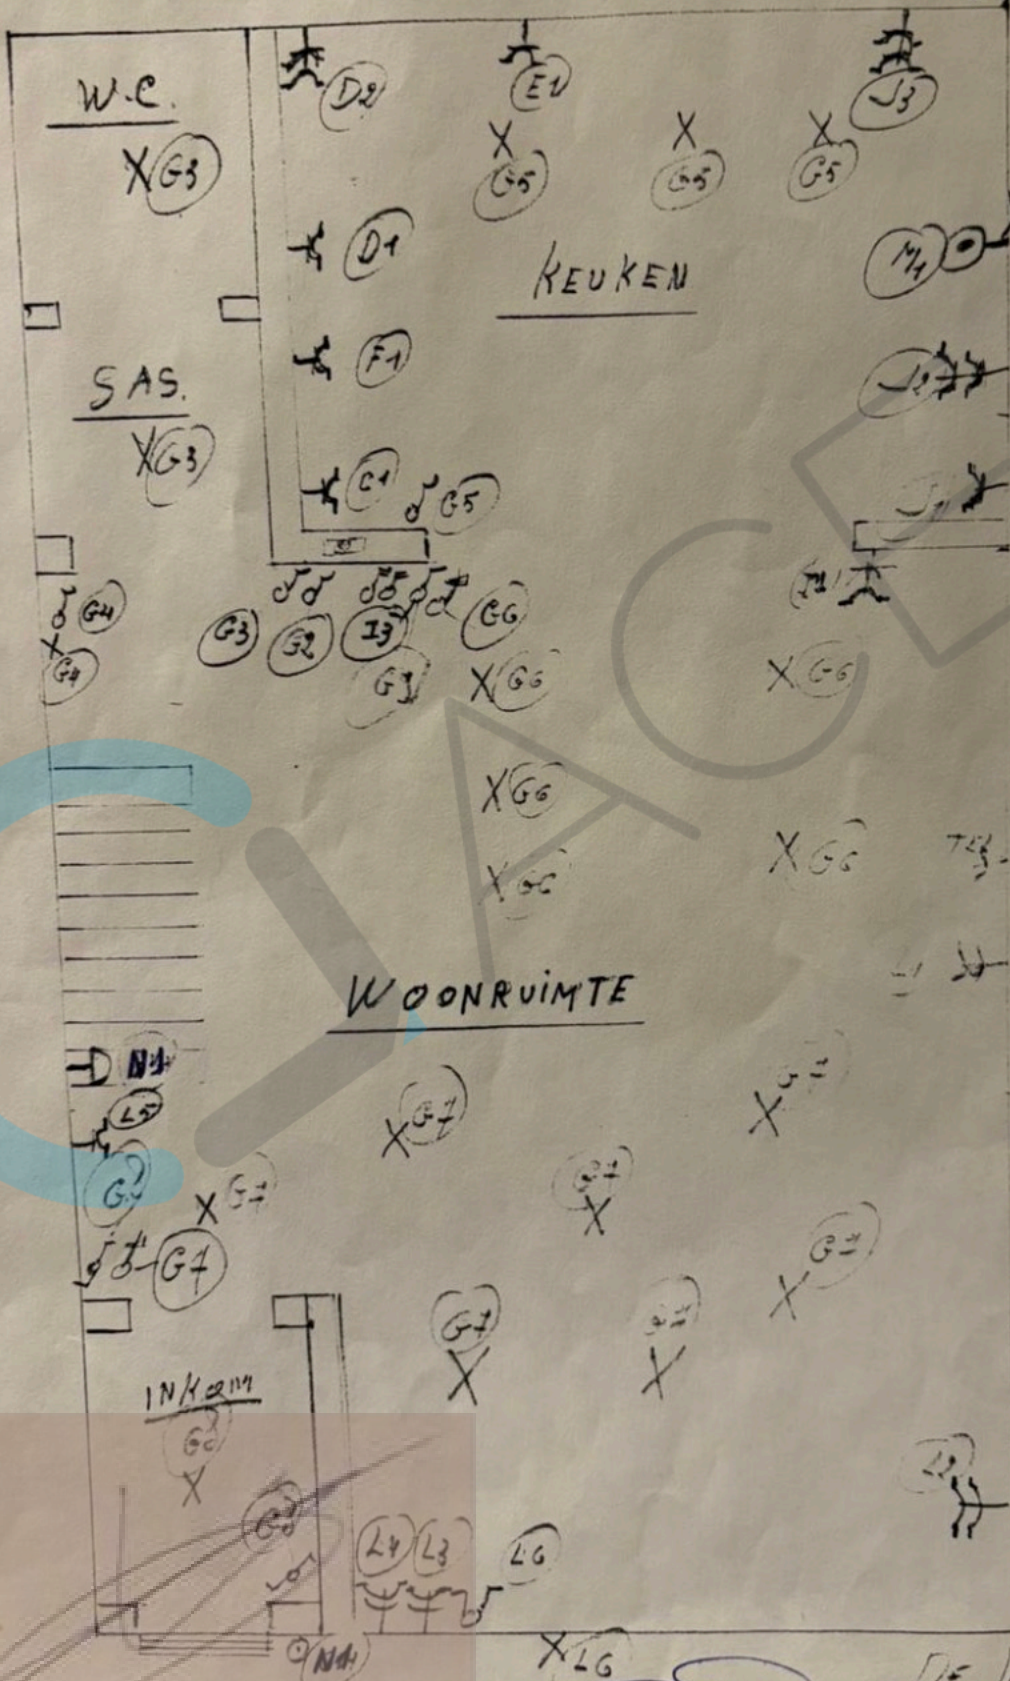






ACEG vzw  
Vanhoutte Thibault  
#136



# SITUATIE SCHEMA

2<sup>de</sup> VERDIEP

MEVR. VAN DEN BERGH ANITA.  
ST JOANNES BERCHMANSSTR 1-48.  
2170 MERKSEM.

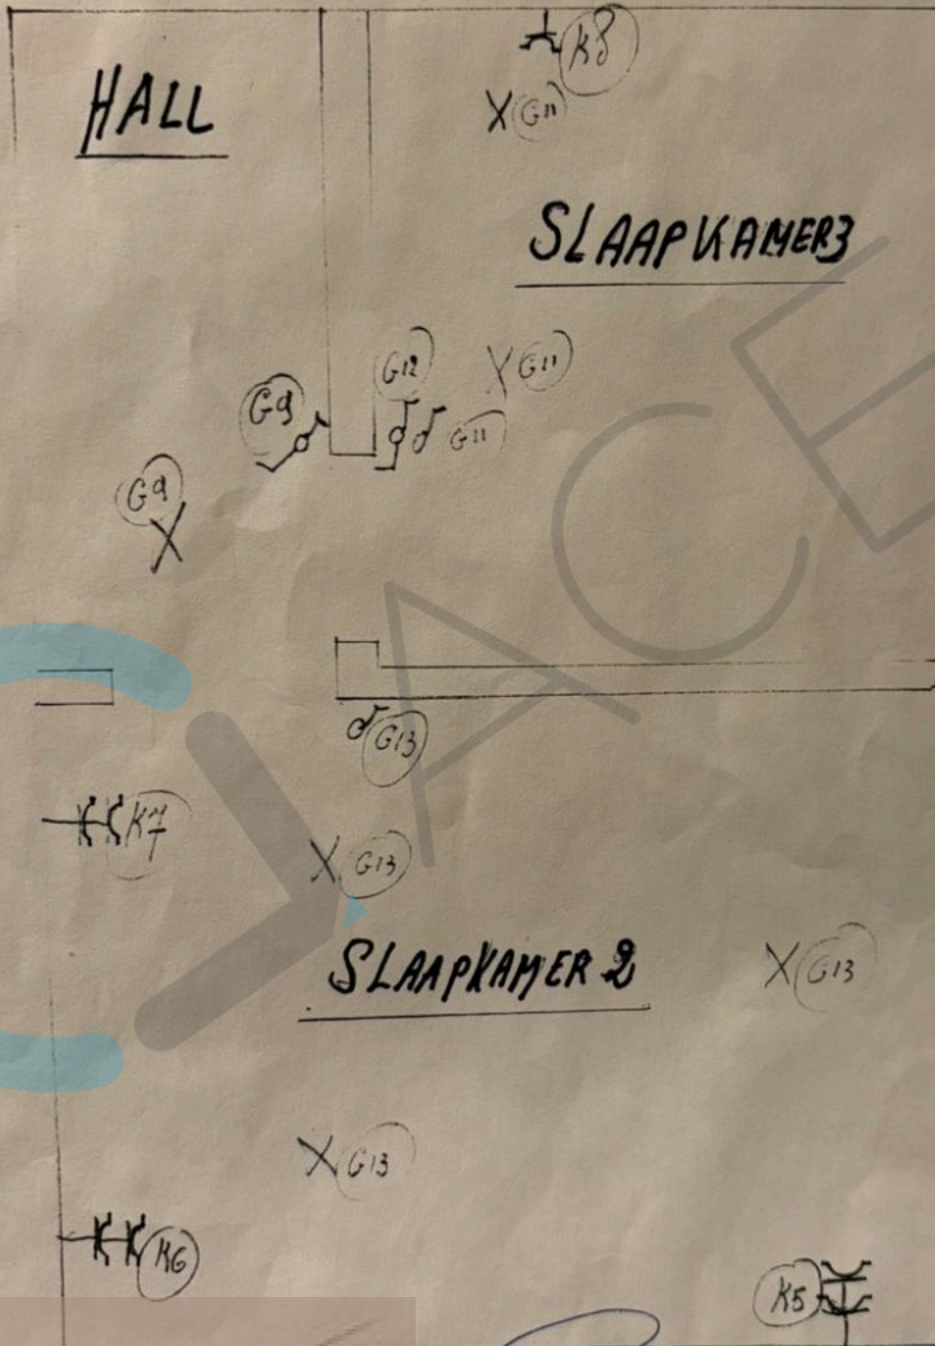

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR  
DE UITVOERING VAN HET WERK.

2-1-1999 *[Signature]*



# SITUATIE SCHEMA

1<sup>STE</sup> VERDIEP

MEVR. VAN DEN BERGH ANITA  
ST JOANNES. BERGH VANSSTB. 48.  
2170 MERKSEM.

