

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 16/05/2023

Inspecteur: Pieterjan Hombrouckx

Mentor:

Installateur: AEVP BV

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0652 786 838

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251309

Datum verslag: 16/05/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1124707

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Steenberg
Huisnummer 90
Busnummer E
Postcode 3460
Gemeente Bekkevoort
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Steenberg
Huisnummer 90
Busnummer E
Postcode 3460
Gemeente Bekkevoort
Land België

Installateur

Naam AEVP BV
BTW nr. BE 0652 786 838
Telefoonnummer +32 498 67 51 03
E-mail Philippe@aevp.be

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: 1SAG110520861

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 21

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 20.7 MΩ

RE: 2.9 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IA (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	21	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
4	C	16		2	1,5
16	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.
- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 16/5/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Pieterjan Hombrouckx

Hombrouckx P


Pieterjan Hombrouckx
ACEG VZW - #290

- Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**
- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 - Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 - Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
- Kwaliteit**
- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 - De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 16/5/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

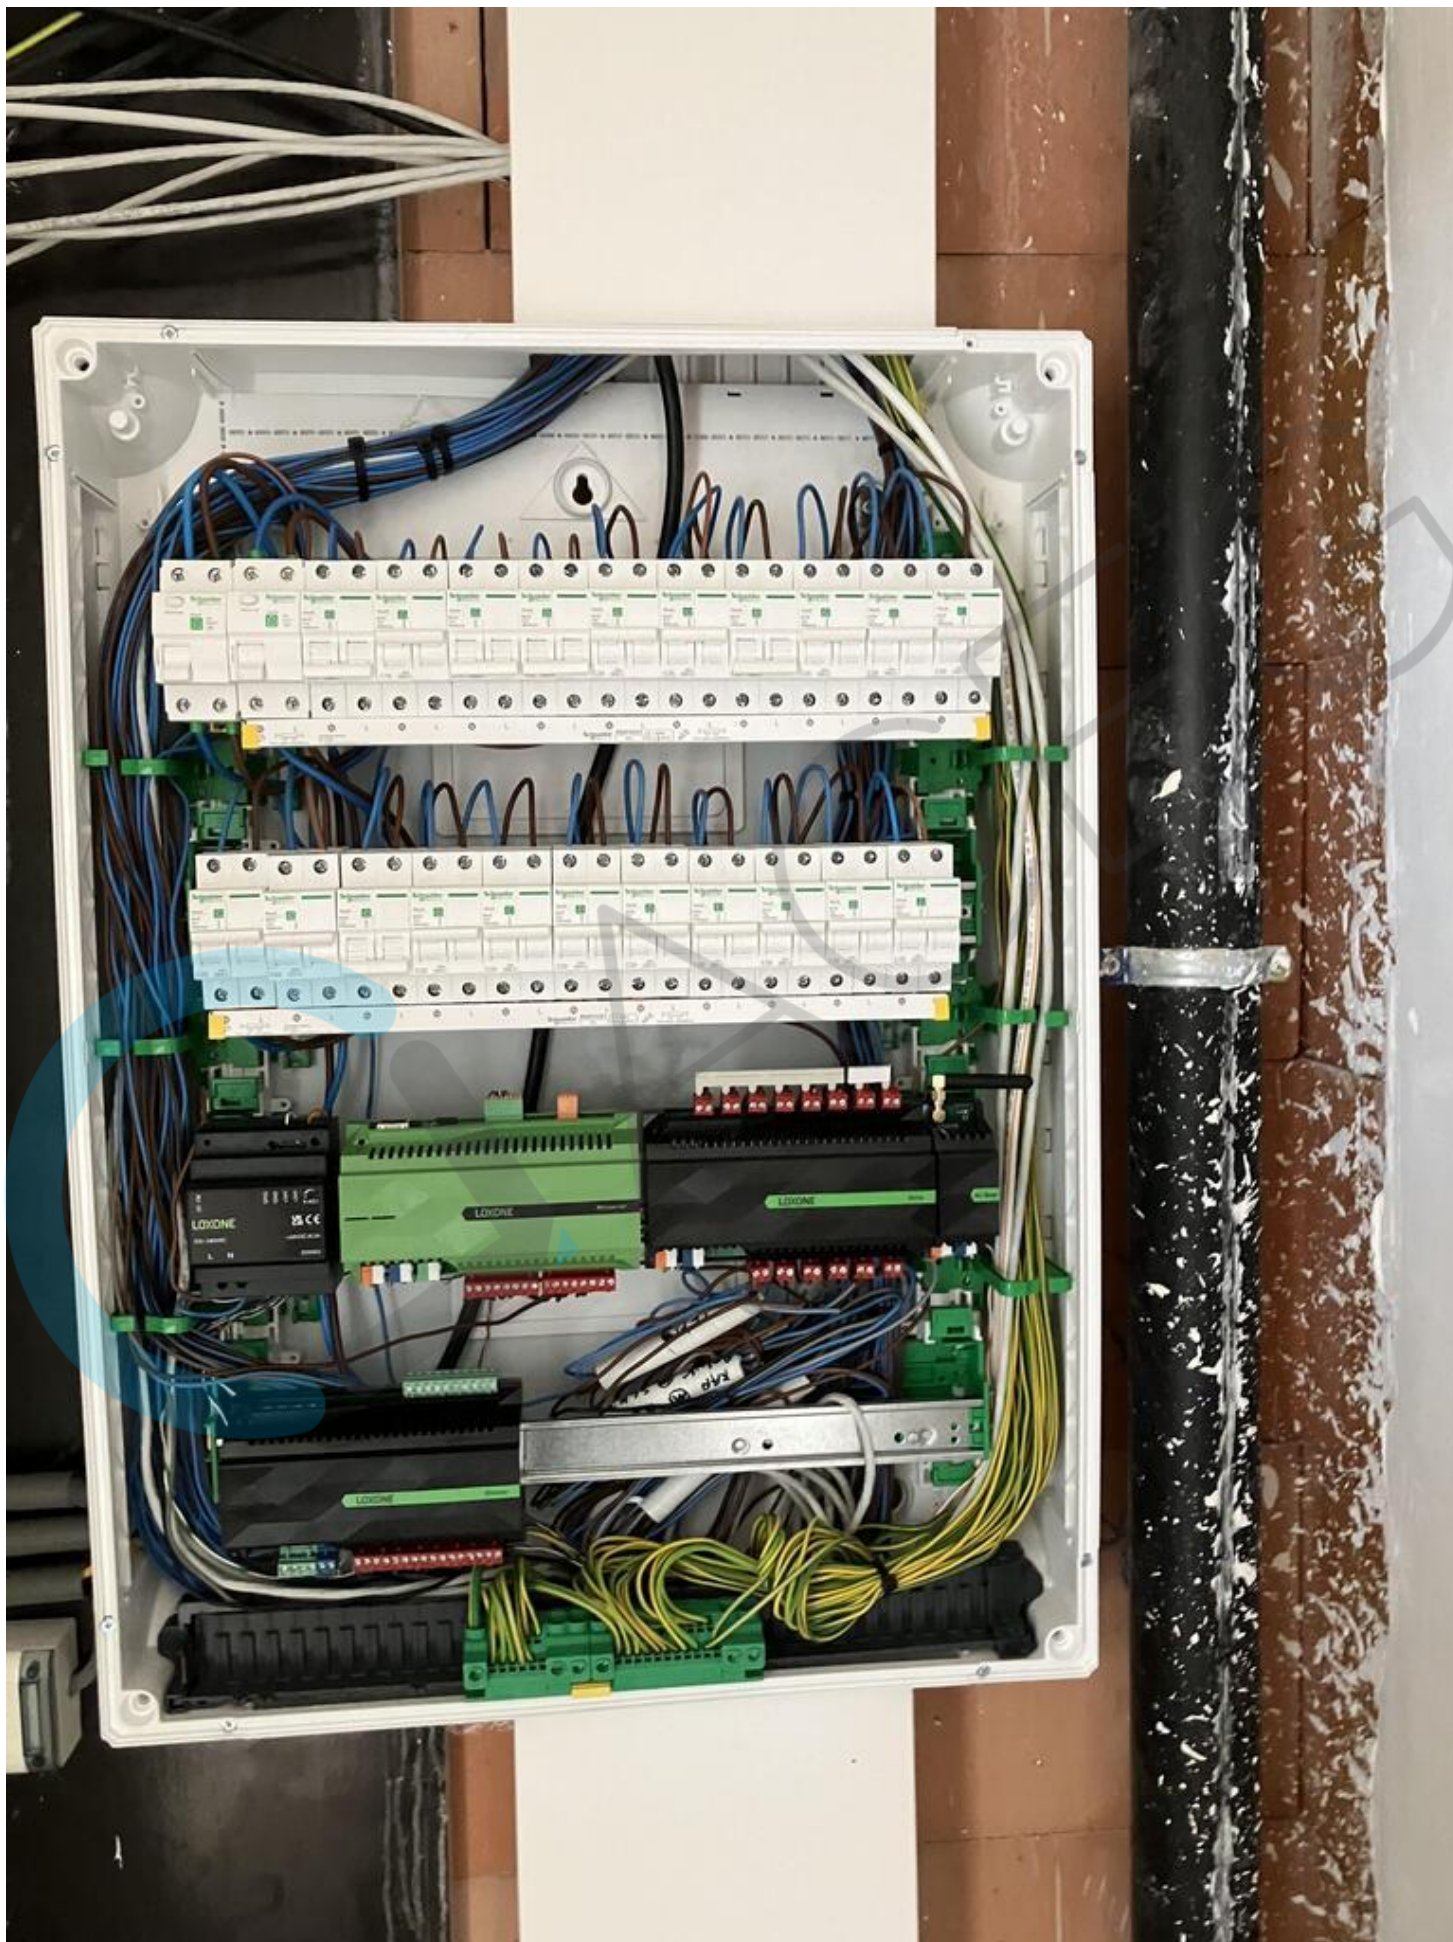





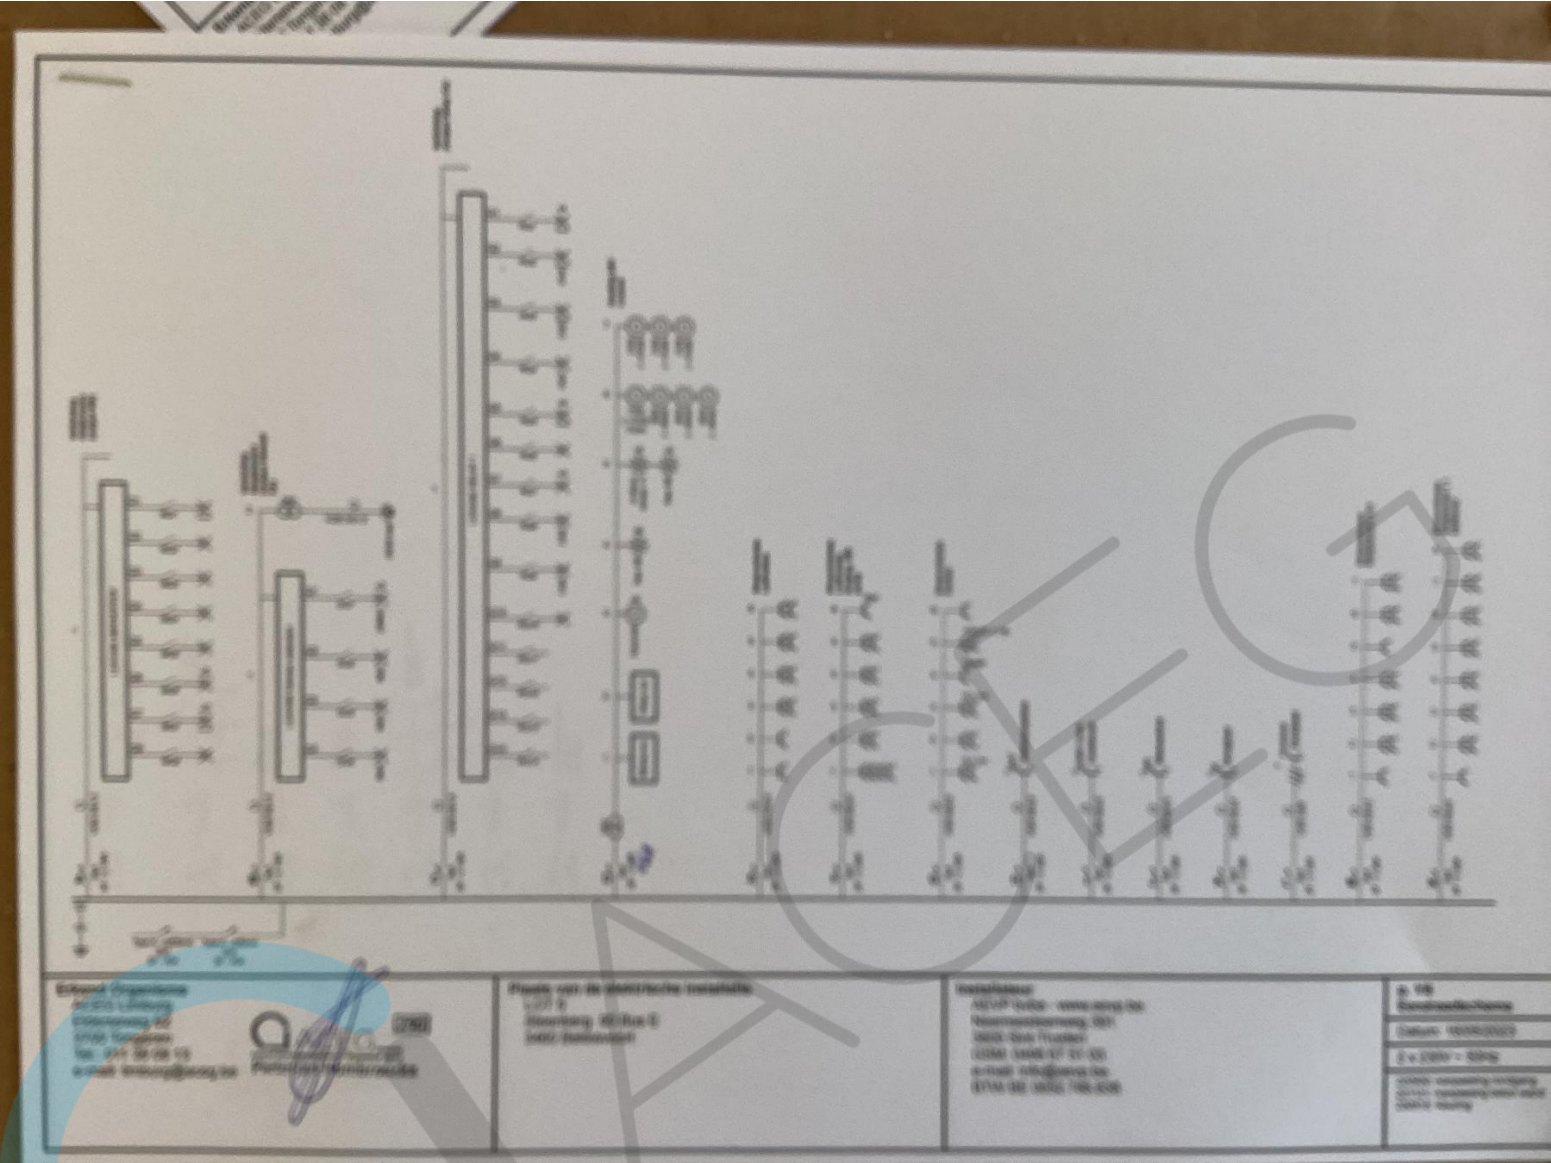

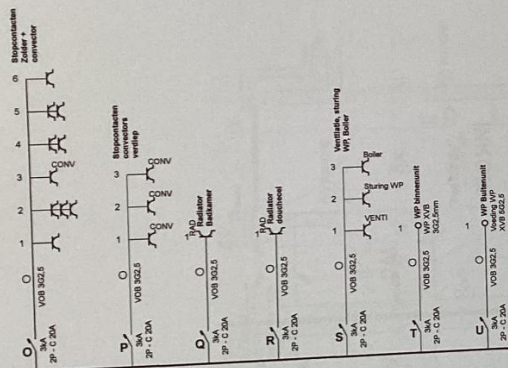

Erkend Organisme
ACEG Limburg
Eldersweg 62
3700 Tongeren
Tel.: 011 36 08 13
e-mail: limburg@aceg.be

ACEG
Pieter-Jan Hombroutx

290

Plaats van de elektrische installatie
LOT 5
Steenberg 90 Bus E
3460 Bekkevoort

Installateur
AEVP bvba - www.aevp.be
Naamsesteenweg 391
3800 Sint-Truiden
GSM: 0498 87 51 03
e-mail: info@aevp.be
BTW BE 0652.786.838

p. 2/6
Eendraadschema

Datum: 16/05/2023

2 x 230V ~ 50Hz

220930: Aanpassing rondgang
221121: Aanpassing beton w.o.
230515: Keuring



GACEG 290
Interni per la gestione / Organismo
Pietrangeli Hombrouckx

p. 3/6
Situatieschema
Datum: 16/05/2023
2 x 230V ~ 50Hz
220930: Aanpassing rondgang
221121: Aanpassing beton wand
230515: Keuring

