

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0564-190917-02

Datum van het onderzoek : 17/09/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : App 101
INFANTERIELAAN 7
2550 KONTICH

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : *
Adres : INFANTERIELAAN 7
2550 KONTICH

OPDRACHTGEVER : GOLD-LIGHT
Adres : ESPERANTOLAAN 13
3300 TIENEN

INSTALLATEUR : GOLD-LIGHT
Adres : ESPERANTOLAAN 13
3300 TIENEN

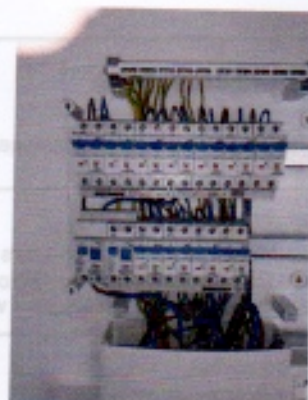

BTW of IK :

EAN : 541448860016987061

Teller nr.

1SAG1100026
568

Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe installatie / Uitbreiding /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,

VMA - 48.5

MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE



Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 2,4 Ohm RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema.

1xdiff 40A /300mA 2p

4x20A 2p 2,5MM2VOB

1x32A 2p 6mm2VOB

1x16A 2p reserve

1x16A 2p 2,5MM2VOB

1xdiff 40A/ 30mA 2p

3x20A 2p 2,5MM2VOB

1x16A 2p 2,5MM2VOB

FASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/09/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0564 HARRY KOEBRUGGE

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthoudingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materiaal in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtebreek en onrechtbreekse aansluiting;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutstroom en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materiaal dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroomdraden die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieschema's;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen, overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

VMA - 48.5

Verslagnummer 0564-190917-02



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die beslist is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2



Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.


STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 17/09/2044.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

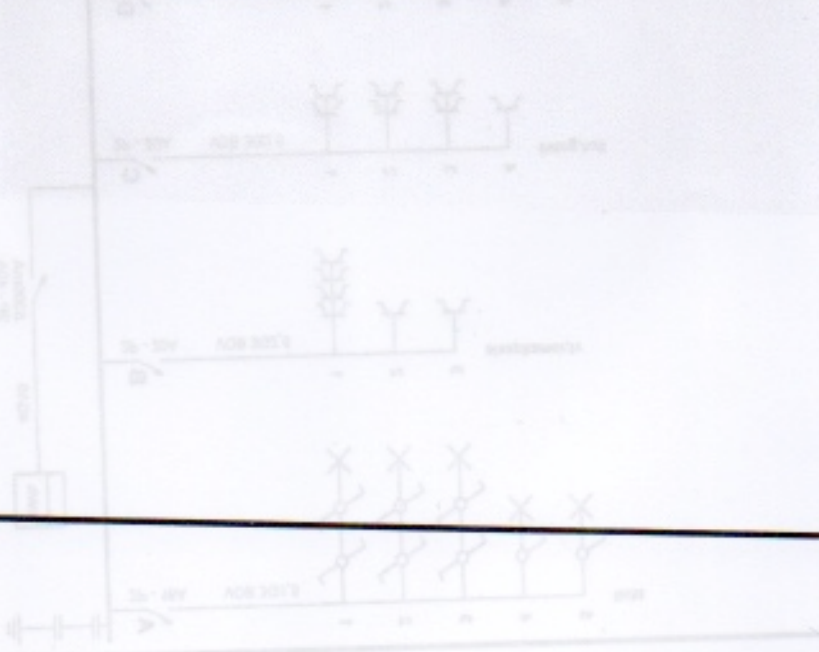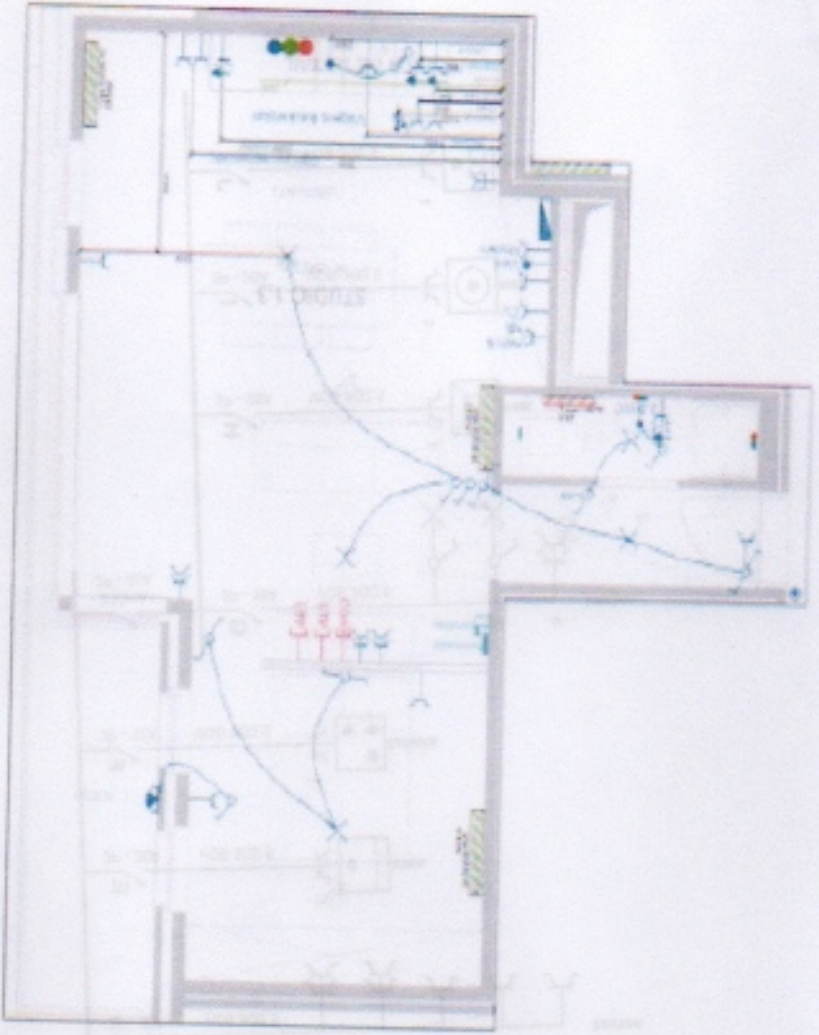

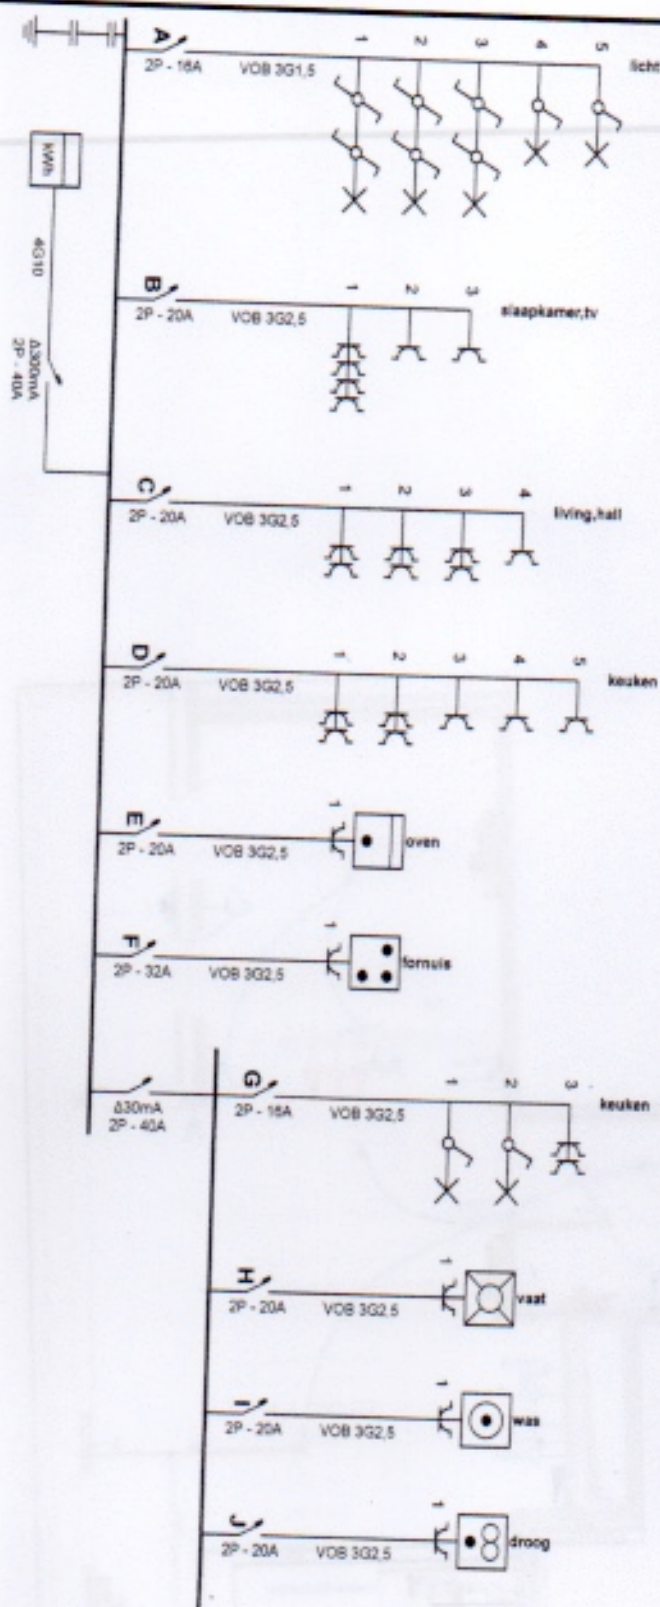



p-quadrat

Romelise Put 26 B 15
2650 Edegem

2650 Edegem

Datum:

16/09/2019

Localities

KONTICH

Infanterielaan 7/25 blok B app 101
2550 Kortich

2550 Kontich

Eendraadschema

2 x 230V - 50Hz

DATE RECEIVED
COST

p 3/4

A
B
C
D
E
E
F
G
H
I
J
K

Licht

- Stopcontacten slaapkamer en TV
- Stopcontacten living, hal
- Stopcontacten keuken
- Aansluiting oven
- Aansluiting fornuis
- Badkamer
- Stopcontact vaatwas
- Stopcontact wasmachine
- Stopcontact droogkast
- Aansluiting CV en ventilatie

 p-quaadmaat Kornelise Put 26 B 15 2650 Edgem	Datum: 16/09/2019 Locatie: KONTICH Infanterieaan 7/25 blok B app 101 2550 Kontich	Eendraadschema 2 x 230V - 50Hz	 p 4/4
---	--	--	--
