


IST V

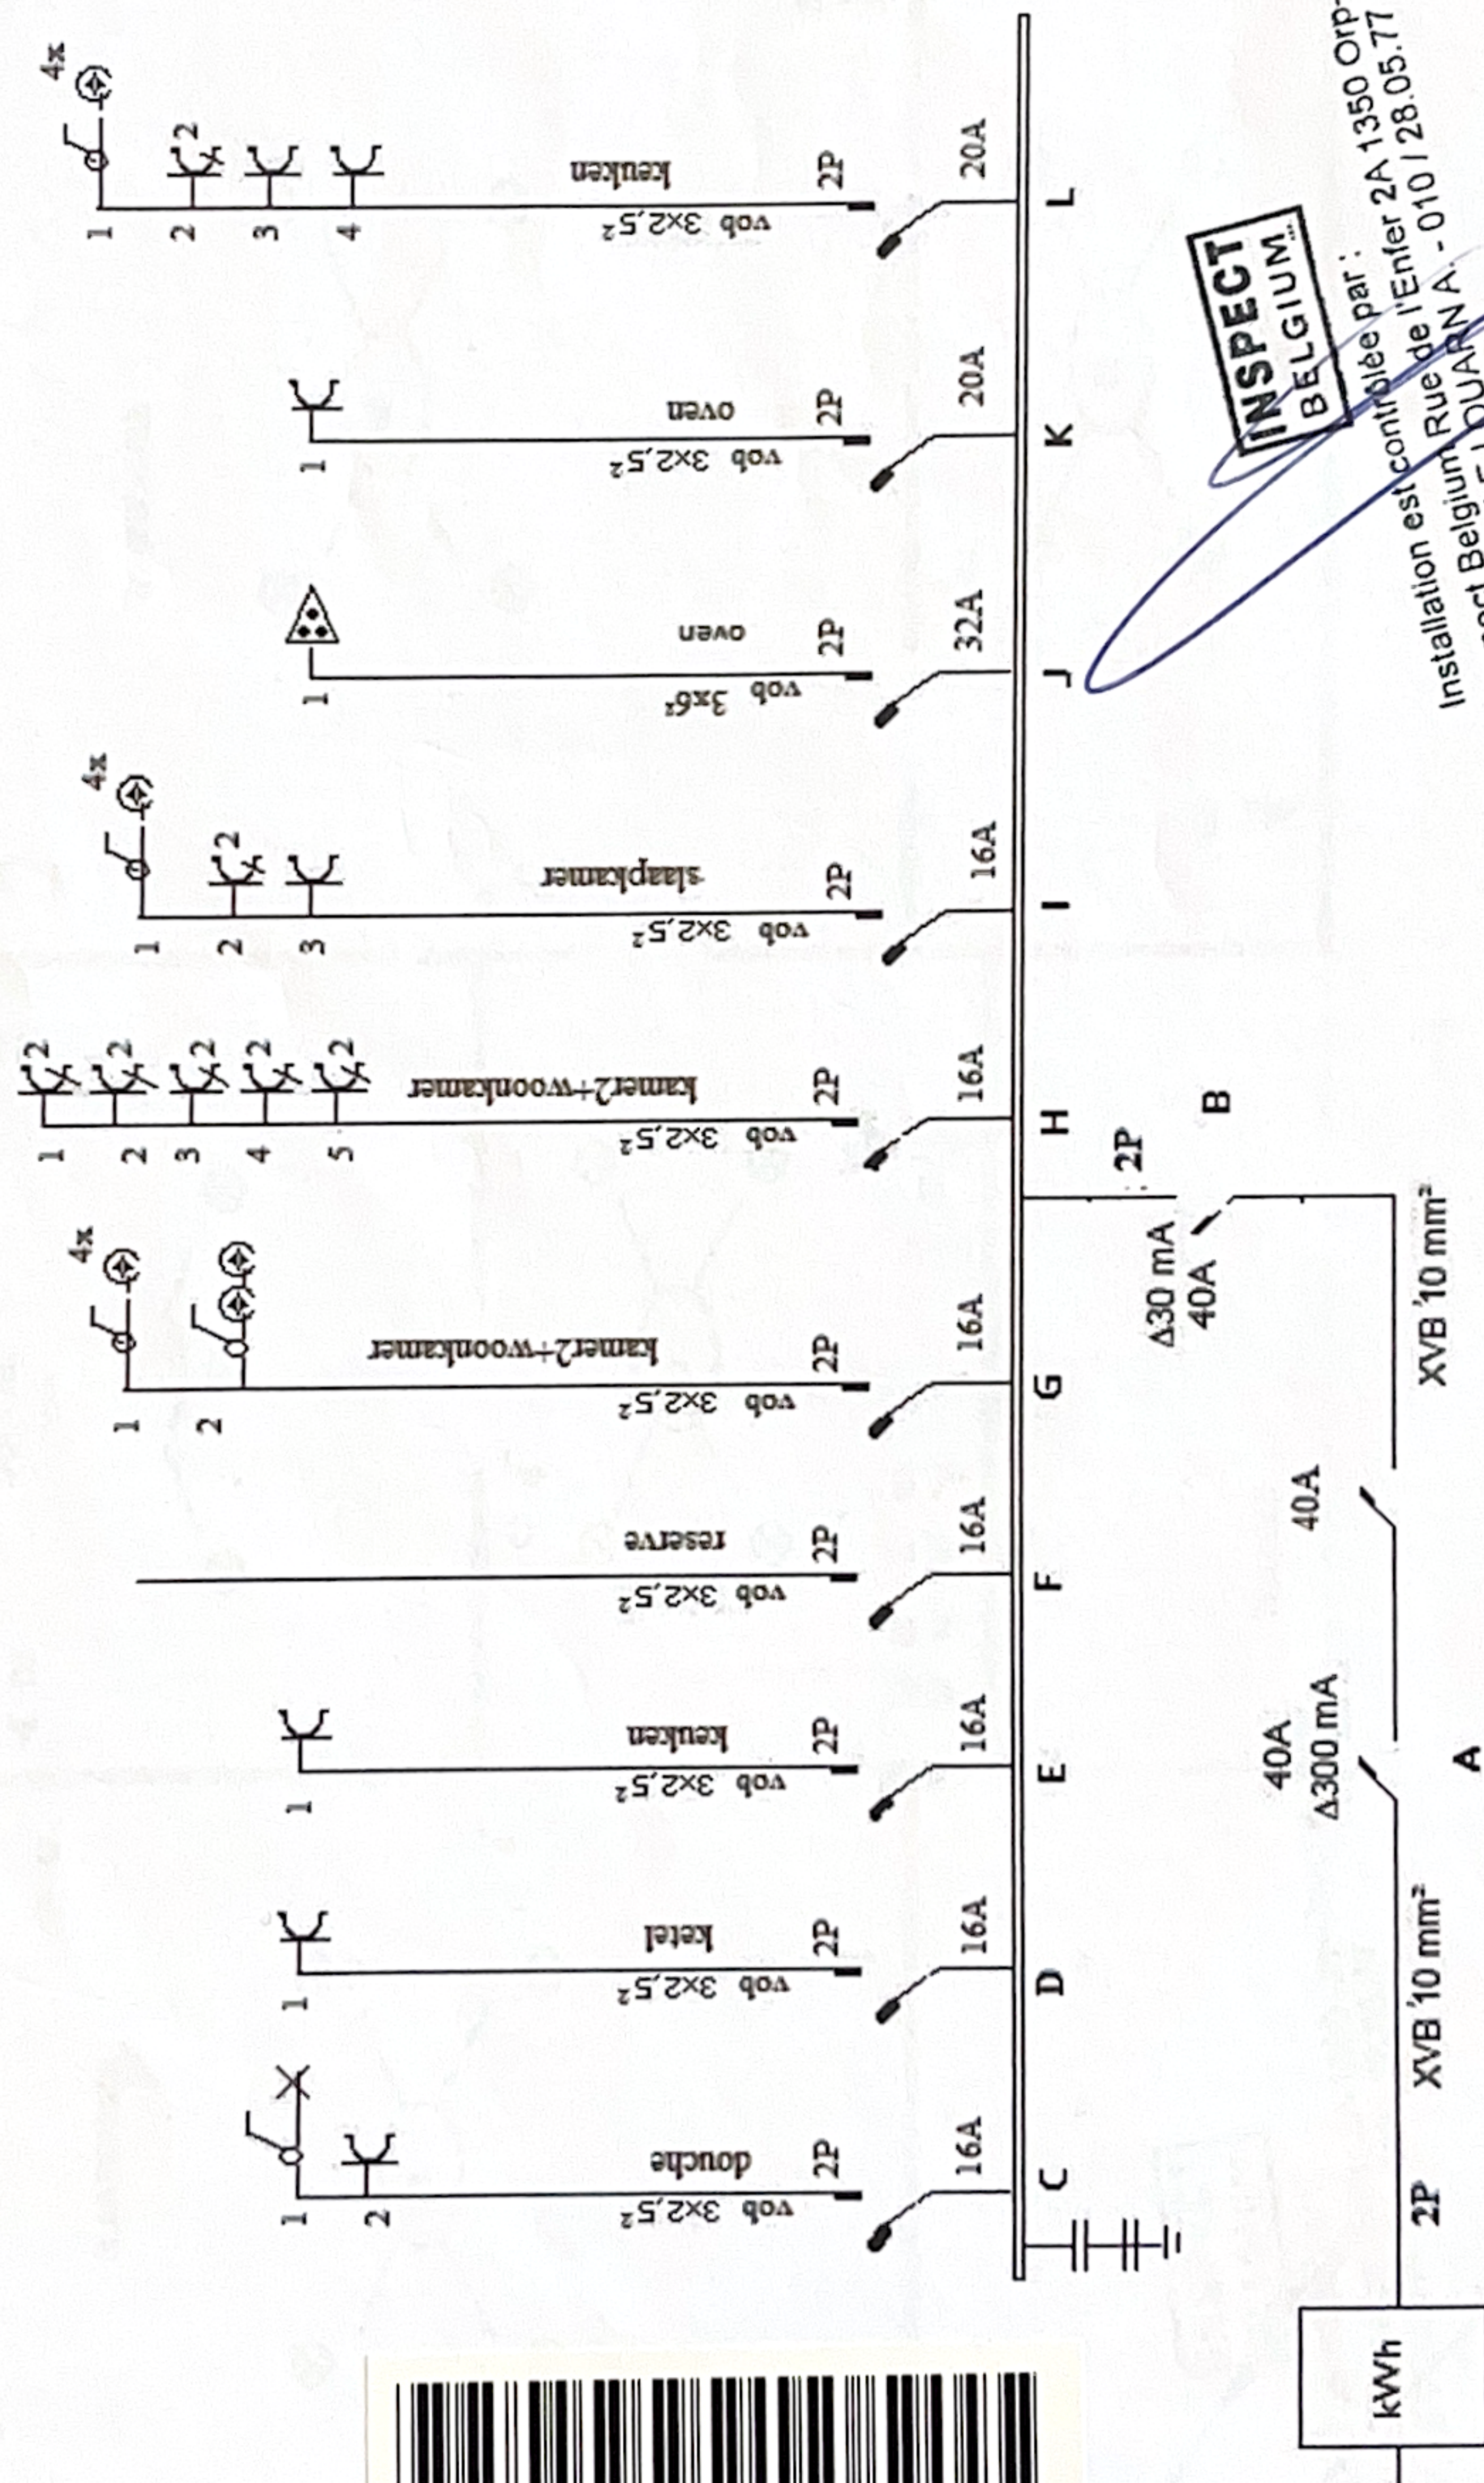

TV0006302


PV DE CONTROLE DE L INSTALLATI

**INSPECT
BELGIUM**

Installation est contrôlée par :
Inspect Belgium, Rue de l'Enfer 2A 1350 Orp-Jauche
Inspecteur: LELOUARN A. - 010 / 28.05.77

Date:
PV n°:
Signature:

IST V

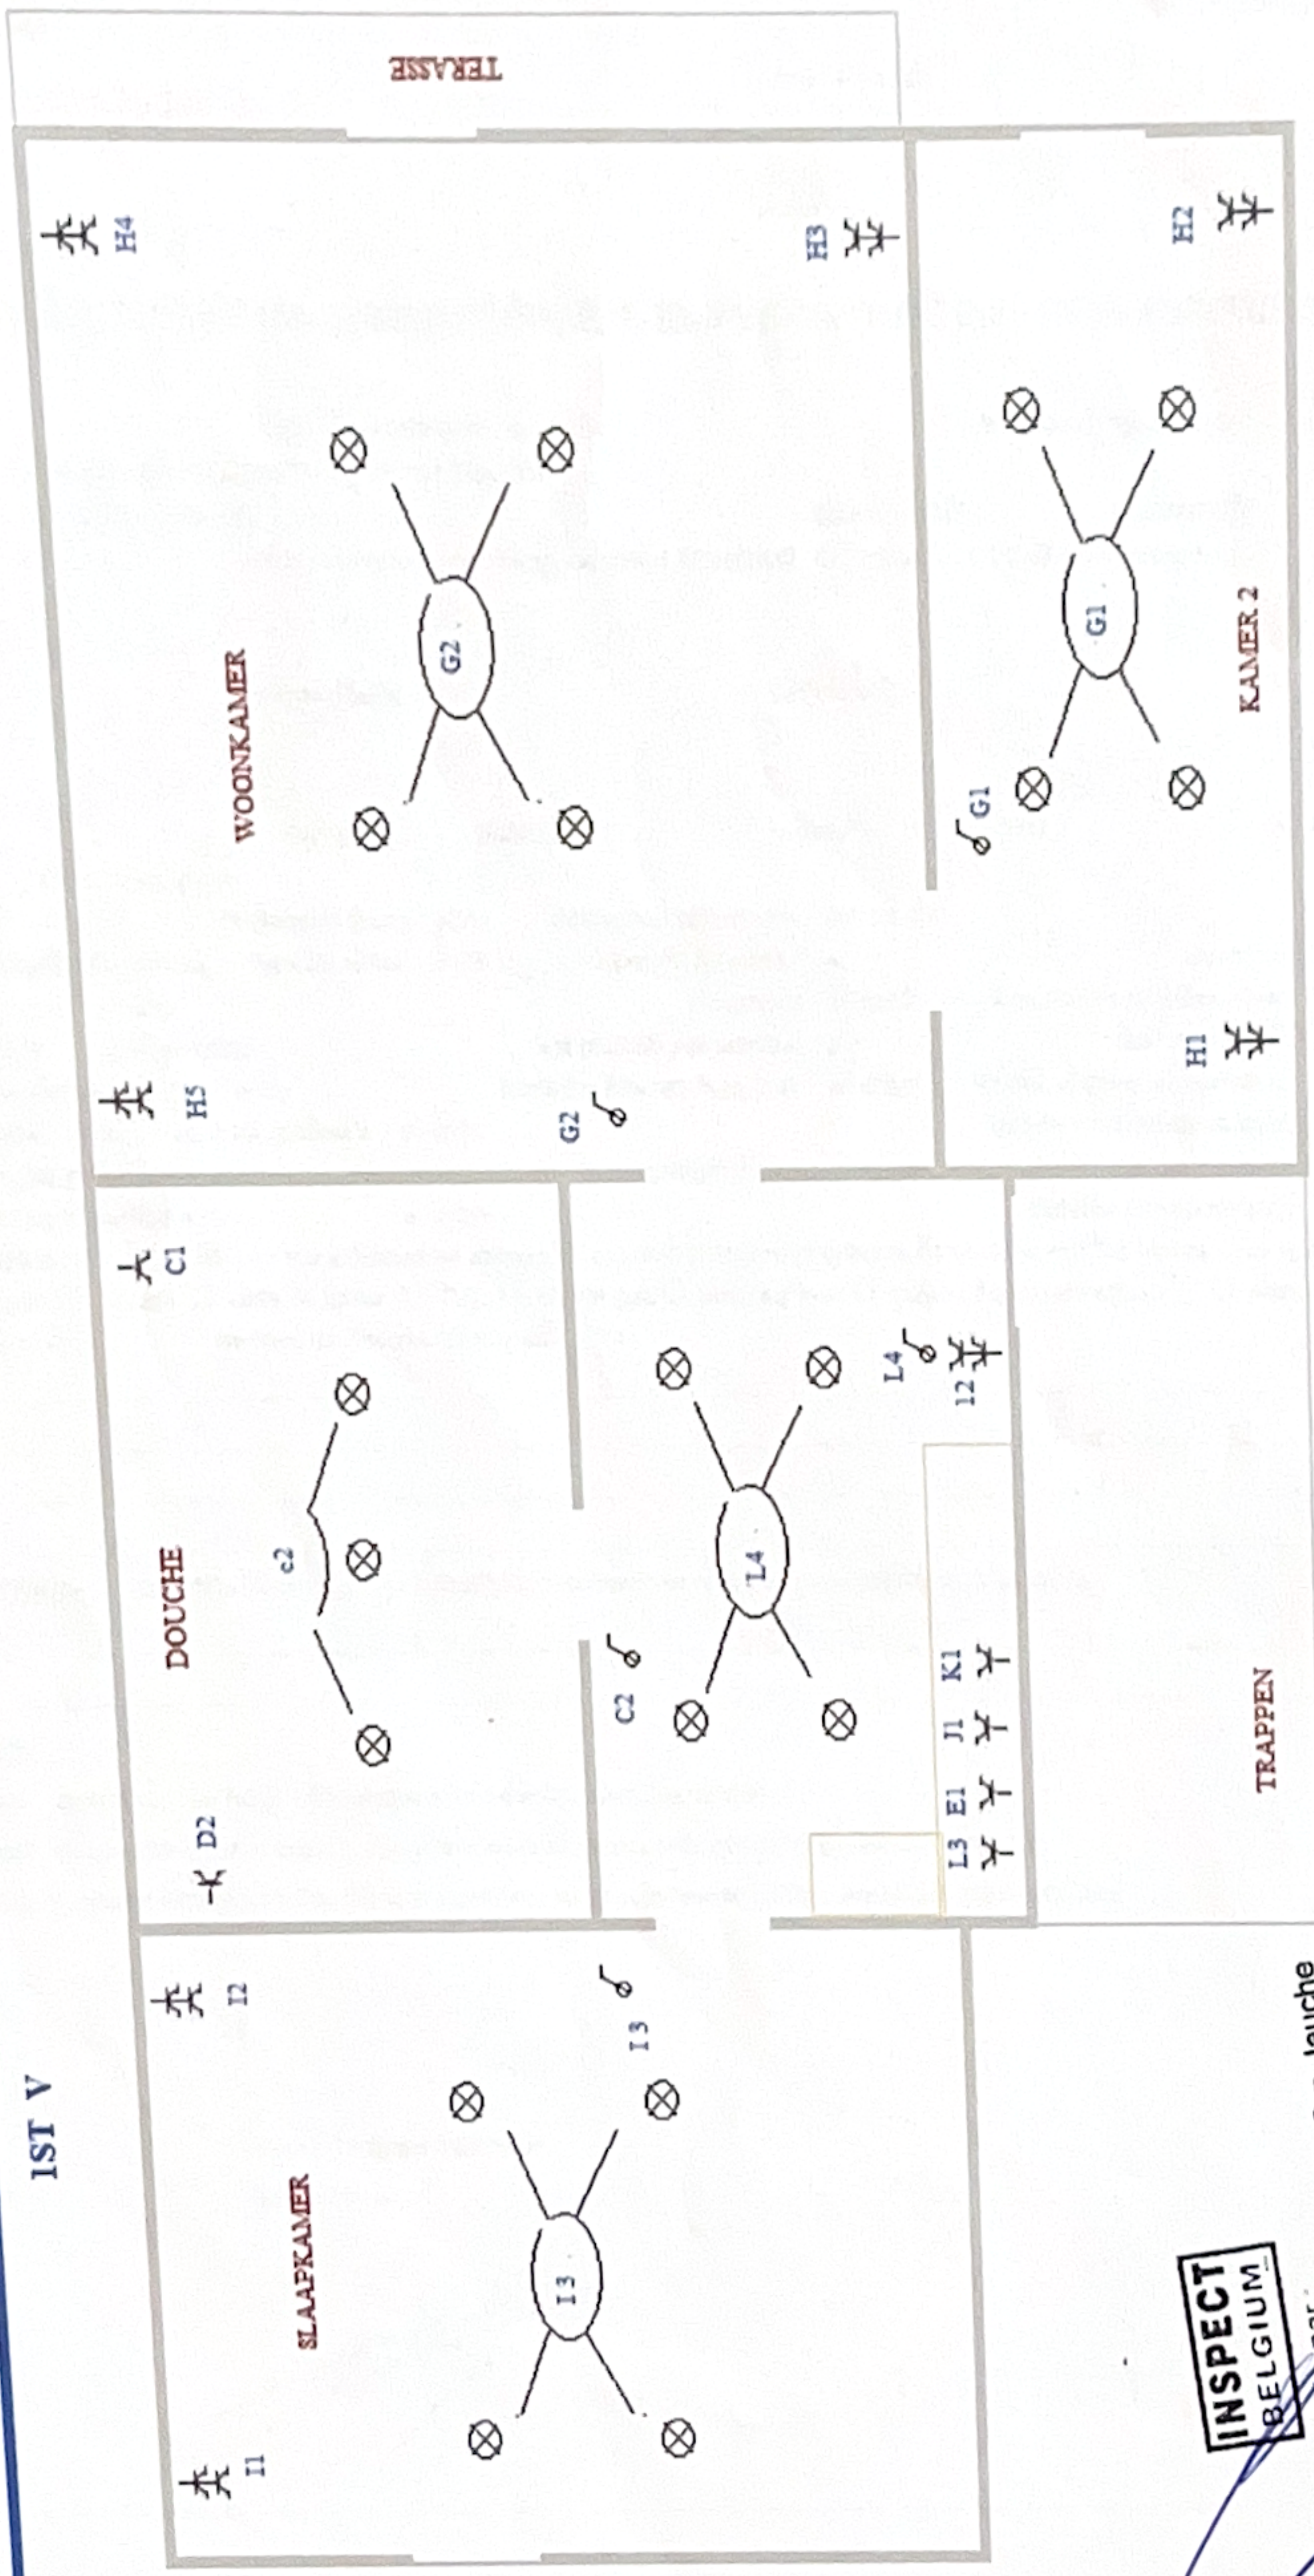

INSPECT
BELGIUM

Installation est contrôlée par :
Inspect Belgium Rue de l'Enfer 2A 1350 Orp-Jauche
Inspecteur: LE LOUARN A. - 010 / 28.05.77

Date:
PV n°:
Signature:

Client: LE LOUARN, Alexandre - 002
Commande: 20170320000038
Client: 201700000138
Cont.:



A:
ail: Jamal.naissi@gmail.com

Ko.: ELEC-06
n. rapport:
m. PV précédent:
te: 20/03/2017

201700000047

Client / Mandat:
Trône Properties SA
Rue Souveraine n°96
1050 IXELLES
0898661151

partement: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

GENERALITE

Appareil/Install. ID: Type d'installation: Nouvelle Type de locaux: Appartement
Lieu d'inspection: Avenue Clays n°54(app+1) 1030-SCHAERBEEK
Type d'inspection: examen de conformité Suivant RGIE.: Art86/Art270/
Date du contrôle: 20/03/2017 Contrôle suivant dans - mois, ou avant 20/03/2042 Contrôleur: LE LOUARN, Alexandre
Propriété de: Idem
Installateur: NG
T.V.A.: Carte E-ID: Délivré à: Date:

DESCRIPTION

EAN num.: Compteur: 15889005 Index I: 035002.7 Index II:
Raccordement: Réseau souterrain
Tension de serv.: 2x230V Protection Max.: 40A Protection principale: aut. 2p 40A
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: XVB nombre de cond.: 4 section: 10 mm2
Electrode de terre: type: piquets section: 16 mm2 Résistance de dispersion: <10 Ohm
Interr. Diff.: Général: 2p 40A/300mA est plombé par scelles: p.a Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle Boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolement général: >1 MOhm
Installation exécutée conformément au schéma's: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre Matériel fixe ou mobile: en ordre
Description Installation: ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ C.C. ☐ compt.gaz ☐ compt.d'eau ☐ liaison équip. principale ☐ équip.-supp.
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 10

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11, N12, N13,

CONCLUSION

L'installation est **conforme** au RGIE. L'installation peut rester/ être mise en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE,
ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date

Pour le Directeur Technique,
Le contrôleur,
