

QUALIWATT – Q1

Formulaire de notification de mise en service, de demande de compensation et de soutien garanti (prime QUALIWATT) pour une installation solaire photovoltaïque neuve de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 2.00 - 18/03/2015

En vigueur du 01/04/2015 jusqu'au (date du contrôle RGIE faisant foi)

4. DONNÉES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION

4.1. Récapitulatif du site de production

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION NOUVELLE OU EXISTANTE AVANT MODIFICATION

	Nombre de modules	Marque des modules	Type des modules	Technologie des modules*	Position*	Puissance par module (Wc)	Suiveur	Puissance installée totale (kWc)	
Installation PV 1	18	Bisoh	poly	<input checked="" type="radio"/> C / CM	<input checked="" type="radio"/> T / F / AS	270 Wc	<input checked="" type="radio"/> Oui / non	4,860 kWc	
Installation PV 2				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Installation PV 3				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Installation PV 4				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Pays du site de production des modules indiqué sur le FIC				Slovenie		Code pays (ISO 3166)	SI	TOTAL kWc	4,860 kWc

	Nombre	Marque onduleur	Type onduleur	N° série onduleur	Phase d'injection	Puissance maximale (kVA)
Onduleur 1	1	SMA	SB5000TL-21	2130391314	<input checked="" type="radio"/> L1/L2/L3/N	4,6 kVA
Onduleur 2	1				L1/L2/L3/N	
Onduleur 3	1				L1/L2/L3/N	
Onduleur 4	1				L1/L2/L3/N	
Micro Onduleurs						
Micro Onduleurs						
TOTAL kVA						4,6 kVA

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION APRÈS MODIFICATIONS (à remplir uniquement en cas de modification d'une installation existante)

	Nombre de modules	Marque des modules	Type des modules	Technologie des modules*	Position*	Puissance par module (Wc)	Suiveur	Puissance installée totale (kWc)	
Installation PV 1				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Installation PV 2				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Installation PV 3				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Installation PV 4				C / CM	T / F / AS		Oui / non		
Pays du site de production des modules indiqué sur le FIC						Code pays (ISO 3166)		TOTAL kWc	

	Nombre	Marque onduleur	Type onduleur	N° série onduleur	Phase d'injection	Puissance maximale (kVA)
Onduleur 1	1				L1/L2/L3/N	
Onduleur 2	1				L1/L2/L3/N	
Onduleur 3	1				L1/L2/L3/N	
Onduleur 4	1				L1/L2/L3/N	
Micro Onduleurs						
Micro Onduleurs						
TOTAL kVA						

*Veuillez barrer la ou les mention(s) inutile(s) : TECHNOLOGIE DES MODULES : C = Cristallin ; CM = Couches Minces / POSITION : T = Toiture ; F = Façade ; AS = Au Sol



QUALIWATT - Q1

Formulaire de notification de mise en service, de demande de compensation et de soutien garanti (prime QUALIWATT) pour une installation solaire photovoltaïque neuve de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 2.00 - 18/03/2015

En vigueur du 01/04/2015 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

4.2. Données relatives à la facture – uniquement en cas de première installation ou extension

Date de la commande (acompte)	Coût de l'installation HTVA	Taux de TVA appliqué	Puissance crête se rapportant au coût mentionné ci avant [kWc]
02 / 11 / 2015	8262 €	21%	4,860 kWc

5. L'INSTALLATEUR

Nom de l'installateur	ETS GOFFLOT Yanny		
Label NRQual PV	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Si oui : numéro de label :	N P C 1.1.14 / 0111
Numéro d'entreprise	0864 440 613	Forme juridique	SPRL
Pays	Belgique		
Légalement représentée par :			
Nom	GOFFLOT	<input checked="" type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme	
Prénom	Yanny		
Tél. ligne directe	0611249295	Courriel	yanny.gofflot@skynet.be
Numéro du certificat de compétences comme installateur de systèmes solaires photovoltaïques délivré par RESCERT à la personne physique employé par l'installateur ayant visé l'installation			00685

6. CONTRÔLE DE L'ORGANISME AGRÉÉ

Nom de l'organisme agréé RGIE	Vincotte (Rapport n° GEN/151030440534)		
Date de visite	16 / 12 / 2015		
Installation conforme RGIE	OUI <input checked="" type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>	

6.1. Relevés des index du ou des compteurs du Gestionnaire de Réseaux de Distribution

Dans tous les cas, un relevé des index de tous les compteurs doit être réalisé le jour de la visite de l'organisme agréé RGIE.

Dénomination (ex : heures pleines, heures creuses, exclusif nuit)	N° de série	Marque	Index							
Heures pleines	32662609	PAFAL	9	9	9	9	8	3	.	2
Heures creuses	32662609	PAFAL.	0	0	0	0	0	5	.	9
									.	
									.	
									.	
									.	
									.	
Signature et cachet de l'agent de l'OA :						TOUSSAINT José Inspecteur Electricité n° 1112				



QUALIWATT – Q1

Formulaire de notification de mise en service, de demande de compensation et de soutien garanti (prime QUALIWATT) pour une installation solaire photovoltaïque neuve de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 2.00 – 18/03/2015 En vigueur du 01/04/2015 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

7. ANNEXES OBLIGATOIRES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE

Les annexes ci-après sont à joindre obligatoirement au formulaire et n'exemptent pas le demandeur de compléter celui-ci. En cas d'annexe(s) manquante(s), la demande sera irrecevable.

Enfin, le GRD se réserve le droit de demander à tout moment des informations supplémentaires.

Veuillez cocher	Annexes à fournir :
<input checked="" type="checkbox"/> Annexe 1 :	Copie du <u>rapport de contrôle de conformité</u> au Règlement Général des Installations Électriques (RGIE) de votre installation de production d'électricité et de son raccordement au réseau par un organisme agréé
<input checked="" type="checkbox"/> Annexe 2 :	Copie de toutes les <u>factures</u> d'acquisition du système (installation comprise)
<input checked="" type="checkbox"/> Annexe 3 :	<u>Schéma électrique unifilaire de l'entièreté de l'installation photovoltaïque</u> (y compris l'emplacement du compteur « réseau »), <u>validé et signé par l'organisme agréé (RGIE)</u> Le schéma unifilaire doit mentionner la section et la longueur entre le(s) onduleur(s) et le compteur réseau et identifier les différentes phases de raccordement du (des) onduleur(s).
<input checked="" type="checkbox"/> Annexe 4 :	<u>Photos datées et lisibles</u> des panneaux photovoltaïques posés définitivement, du ou des onduleurs et du ou des compteurs réseau Les photos doivent reprendre l'ensemble du compteur et pas seulement l'index.
Dans le cas où l'installation est réalisée par un installateur qui n'est pas labellisé	
<input type="checkbox"/> Annexe 5 :	Certificat de compétences comme installateur de systèmes solaires photovoltaïques délivré par RESCERT Ce certificat doit avoir été délivré à une personne physique employé par l'installateur renseigné au point 5 du formulaire au moment de la réception RGIE et ayant visé l'installation.
<input type="checkbox"/> Annexe 6 :	Copie du Factory Inspection Certificate (FIC) qui reprend le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques
Dans le cas où le demandeur est un client protégé	
<input type="checkbox"/> Annexe 7 :	Copie de la dernière facture d'électricité attestant qu'il bénéficie du tarif social
Dans le cas où le demandeur est une personne physique qui dispose de revenus précaires (article 19 ter de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération)	
<input type="checkbox"/> Annexe 8 :	Copie du dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt sur les revenus
Dans le cas où le demandeur est une personne morale :	
<input type="checkbox"/> Annexe 9 :	Statuts

Une fausse déclaration peut donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.




QUALIWATT – Q1

Formulaire de notification de mise en service, de demande de compensation et de soutien garanti (prime QUALIWATT) pour une installation solaire photovoltaïque neuve de puissance ≤ 10,000 kVA

VERSION 2.00 – 18/03/2015

En vigueur du 01/04/2015 jusqu'au ... (date du contrôle RGIE faisant foi)

Installateur	Demandeur
<p>Je soussigné déclare sur l'honneur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - que les informations techniques communiquées au point 4 de la présente demande, ainsi que dans ses annexes (annexes 1 à 4), sont sincères et véritables, et correspondent à la déclaration de conformité visée ci-dessous ; - que l'installation de la présente demande est conforme en tout point aux prescriptions Synergrid en vigueur, entre autres la C10/11. 	<p>Je soussigné déclare sur l'honneur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - avoir pris connaissance des conditions d'application du régime QUALIWATT reprises dans la procédure QUALIWATT ; - pour les personnes morales, que je suis dûment habilité à représenter la société mentionnée dans la présente ; - que les informations présentées dans la présente demande, ainsi que dans ses annexes, sont sincères et véritables ; - qu'en cas de modification du bénéficiaire de la prime QUALIWATT ou de coordonnées bancaires, le formulaire Q2 sera transmis au GRD dans les 15 jours.
<p>Je soussigné déclare sur l'honneur disposer des documents suivants, exigés pour l'obtention de la prime Qualiwatt :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une déclaration de conformité de l'installation basée sur le modèle-type publié sur le site Internet de la DGO4-Energie ; - pour les bénéficiaires personnes-physiques, le contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site Internet de la DGO4-Energie, complété et signé par le producteur et l'installateur ; - la preuve que les panneaux photovoltaïques sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification doit être effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. <p>Je m'engage à conserver ces documents ainsi que copie de la présente demande et ses annexes, et à les tenir à disposition du GRD, de la CWaPE ou de la DGO4-Energie sur simple demande, pendant les cinq années de l'octroi du soutien à la production.</p>	
<p>J'ai pris connaissances que, sous quelque prétexte que ce soit, l'impossibilité ou le refus de fournir les documents précités et une fausse déclaration peuvent donner lieu, conformément aux articles 52 et suivants du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, à l'infliction d'amendes administratives ainsi qu'à des poursuites pénales.</p>	
LIEU :	Nuychâteau
DATE :	21/12/2015
NOM :	GOFFLOT Kevin
SIGNATURE :	

Déclaration sur l'honneur à compléter dans le cas où le demandeur est un locataire :

Je soussigné propriétaire de l'immeuble ou du terrain, déclare avoir pris connaissance du présent document.

Lu et approuvé, le


NOM et PRÉNOM :

SIGNATURE :

Attention : seul le demandeur se verra notifier le traitement de la présente demande par le GRD.

gofflor@yahoo.com
17-12-15 16:52
"gofflor" <gofflor@skynet.be>

20151217_151010_resized.jpg

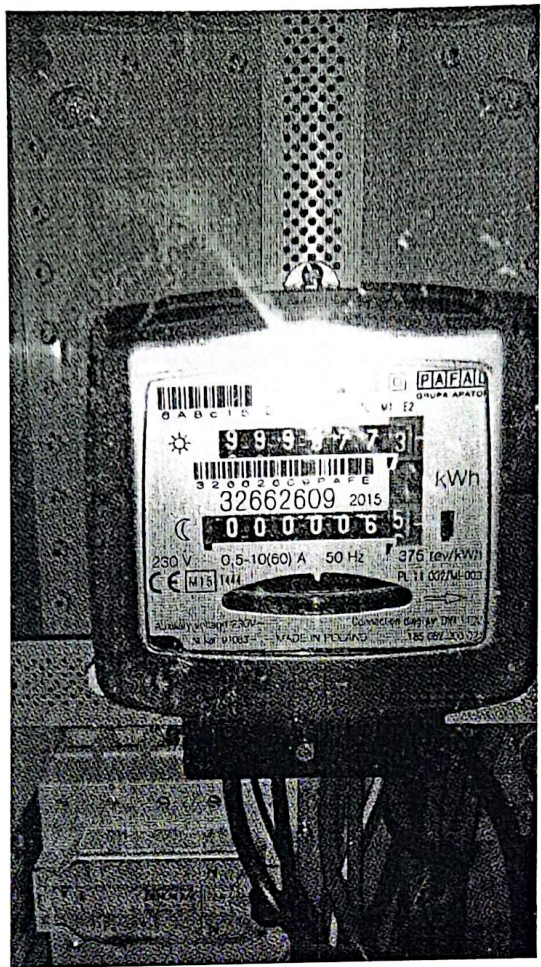

Photos prises
20151217_151010_resized.jpg

ellet ell [redacted] le 16/12/15

414 ko

gifford.gifford@yahoo.com
17-12-15 16:53
"gifford.gifford@yahoo.com" gifford.gifford@yahoo.com

20151217_151504_revised.jpg



Photo print
20151217_151504_revised.jpg

321 40

18 panneaux
et et elle [redacted] de 16/12/15

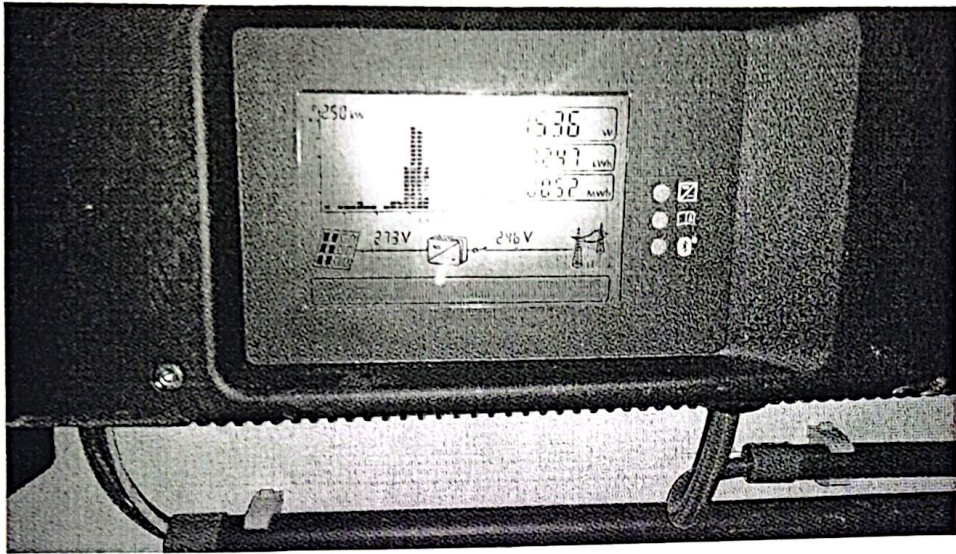


Photo name
20151217_151134_revised.jpg

414 Ko

ell et elle [REDACTED]

16/12/15



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n° : GEM/15/030440534



F 109160

Safety, quality and environmental services

Résul code :

○ Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11 ○ Oost & West -Vlaanderen tél : 09 244 77 11
○ Brabant tél : 02 674 57 11 ● Wallonie tél : 081 432 611

1

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :		Installation :		Propriétaire / gestionnaire :	
Nom, Prénom : <u>Jany</u>	Nom, Prénom : <u>[REDACTED]</u>				
<u>G.OFFLOIT</u>	Adresse : <u>Rue des Messanges 7</u>		<u>Liège</u>		
N° carte d'identité :	CP + Commune : <u>790 E. Lalle</u>				
N° TVA : <u>BE 0867 440 613</u>	Tél. : <u>1</u>				

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input checked="" type="radio"/> extension	<input type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input type="radio"/> Unité d'habitation
<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Unité de travail domestique		
<input type="radio"/> Art 274	<input type="radio"/> périodique	<input type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/> Art 88	<input checked="" type="radio"/> Art 235	<input type="radio"/> Parties communes	
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> renforcement	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/> Unité de travail		

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN <u>541449060015334555</u>	<input type="radio"/> EAN non communiqué	<input type="radio"/> Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° : <u>32662609</u>	Index jour : <u>9999832</u>	Index nuit : <u>000059</u>
Données installation	Conçue pour U _N : <input checked="" type="radio"/> 230 V		Type de prise de terre :
	Courant nominal maximum (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100		<input checked="" type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>2</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>V.O.B.S.</u>		<input type="radio"/>
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A / <u>300</u> mA		Nombre de tableaux : <u>1</u>
			Nombre de circuits terminaux : <u>14</u>
<input checked="" type="radio"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

<input checked="" type="radio"/> Contacts dir.	<input checked="" type="radio"/> Contacts indir.	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Appareils	<input type="radio"/> Matériel	<input checked="" type="radio"/> I>/section	<input checked="" type="radio"/> Schémas	<input type="radio"/> Contrôle bol de défaut
Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>11</u> Ω		Isolement général : <u>1</u> MΩ		Continuité de terre		Test dispositif diff.	

Le dispositif différentiel général : était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions Nouvelle installation		Visa GRD ou mandataire :
<input checked="" type="radio"/> Néant		
Infractions Installation existante		
<input type="radio"/> Néant		
Remarques	<u>Seul l'installation photovoltaïque a été vue.</u>	
<input type="radio"/> Néant		

Conclusion(s) :

La nouvelle installation est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~n'est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

le 16 de c.e.m.b.r.c. 2020 (*)

par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : Jose TOUSSAINT Agent n° : 1118 Date : 16/12/2015

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) : Schéma(s) de position : 1 Schéma(s) unifilaire(s) : 1 3



TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1118

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
 - Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
 - Nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
- (*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Annexe 1 au rapport : GEM / 15 / 030440534 .

Description d'une installation photovoltaïque.

Approuvé, le 16 décembre 2015



TOUSSAINT José
Inspecteur Electricité
n° 1115

1. Protection

- Différentiel mono :
- Disjoncteur bipolaire : 1 X C25 .
- Disjoncteur tripolaire :
- Disjoncteur tétrapolaire :

2. Compteur vert : Néant .

- Marque : Type :
N° Série :
Index : Marquage MID :
- Marque : Type :
N° Série :
Index : Marquage MID :
- Marque : Type :
N° Série :
Index : Marquage MID :
- Marque : Type :
N° Série :
Index : Marquage

3. Onduleur :

- Marque : S.M.A. Type: SB 5000 TL - 21 .
Pac: 4600 W . Index : 0,044 MWh .
N° de série : 2130391314 .
- Marque : Type:
Pac : Index :
N° de série :
- Marque : Type:
Pac : Index :
N° de série :
- Marque : Type:
Pac : Index :
N° de série :

4. Panneaux :

- Marque : BISOL BLEU . Nombre: 18 .
Puissance d'un panneau: 270 WC .
Puissance totale: 4860 WC .



Wechselrichtertyp: / Invertertype: / Type d'onduleur: / Omvormertype: **SB5000TL-21**
 Seriennummer: / Serialnumber: / Numéro de série: / Seriennummer: **2130391314**
 Code der Einstellung: / Code of the setting: / Code pour le réglage: / Code van de instelling: **BES204**
 Einstellung nach Norm: / Setting according to standard: / Réglage selon la norme: / Instelling volgens norm: **C10/11:2012**

Spannungs- und Frequenzüberwachung / Voltage and frequency monitoring / Surveillance de la tension et de la fréquence / Spannings- en frequentiebewaking	Grenzwert / Threshold / Valeur de seuil / Grenswaarde	Max. Zeit bis zur Trennung / Max. disconnection time / Max. Temps de déconnexion / Max. ontkoppelingstijd	Kundeneinstellung / Customer Settings / Réglage client / Eigen instellingen klant
Untere Grenze AC Spannung / Lower limit AC voltage / Limite minimum tension AC / Ondergrens AC-spanning	184.0 V	0.2000 s	
Obere Grenze AC Spannung / Upper limit AC voltage / Limite maximum tension AC / Bovengrens AC-spanning	264.5 V	0.2000 s	
Untere Grenze AC Frequenz / Lower limit AC frequency / Limite minimum fréquence AC / Ondergrens AC-frequentie	47.50 Hz	0.2000 s	
Obere Grenze AC Frequenz / Upper limit AC frequency / Limite maximum fréquence AC / Bovengrens AC-frequentie	51.50 Hz	0.2000 s	
Inselnetzerkennung / Loss of mains / Détection site isolé / Herkenning van het stand-alone network	Aktiv / active / actif	Max. Zeit bis zur Trennung / Max. disconnection time / Max. Temps de déconnexion / Max. ontkoppelingstijd	Kundeneinstellung / Customer Settings / Réglage client / Eigen instellingen klant
Aktive Erkennung des Inselbetriebes / Active islanding detection / Détection active du mode de fonctionnement en site isolé / Actieve herkenning van het stand alone network	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee	5 s	<input type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee
Wiederanschlusszeit / Time before reconnection / Temps de reconexion / Tijd herinschakeling	Aktiv / active / actif	Netzüberwachungszeit / Grid monitoring time / Temps de surveillance réseau / Netbewakingstijd	Kundeneinstellung / Customer Settings / Réglage client / Eigen instellingen klant
Zeit bis zur Wiederschaltung nach einem Netzfehler / Time to reconnection after a grid failure / Temps de reconexion après une défaillance du réseau / Tijd tot herinschakeling	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee	60.00 s	<input type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee
Netzqualität / Grid quality / Qualité du réseau / Netkwaliteit	Aktiv / active / actif	Grenzwert / Threshold / Valeur de seuil / Grenswaarde	Kundeneinstellung / Customer Settings / Réglage client / Eigen instellingen klant
Gleichstromspeisung - max. erlaubter Wert für Offset des AC-Stroms / DC injection - max allowed value for the offset of the AC current / Injection de courant continu - valeur max. autorisée pour l'offset du courant AC / Gelijkstroomvoeding - max. toegestane waarde voor offset AC-stroom	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee	0.2000 A	<input type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee
Spannungssteigerungsschutz-Überwachung des 10 min. Mittelwertes z. B. nach EN 50160 / Voltage rise protection-Monitoring of 10 min. mean value, e.g. as per EN 50160 / Protection contre l'élévation de tension - Surveillance de 10 valeurs moyennes par exemple selon EN 50160 / beveiliging tegen spanningsstijging - bewaking van 10 middelwaarden bijv. conform EN 50160	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee	253.0 V	<input type="checkbox"/> Ja/Yes/ Oui/Ja <input type="checkbox"/> Nein/No/ Non/Nee

(IT) Impostazioni di fabbrica di questo inverter

(PT) Ajuste de fábrica deste inversor

(ES) Ajuste de fábrica de éste inversor

(CZ) Výrobní nastavení tohoto střídače



Tipo di inverter: / Tipo de inversor: / Tipo de inversor: / Typ střídače:

SB5000TL-21

Numero di serie: / Número de serie: / Número de série: / Sériové číslo:

2130391314

Codice di impostazione: / Código de la configuración: / Código da configuração: / Kód nastavení:

BES204

Impostazione secondo norma: / Configuración según norma: / Configuração segundo a norma: / Nastavení podle normy: C10/11:2012

Monitoraggio della tensione e della frequenza / Monitorización de tensión y frecuencia / Monitorização da tensão e da frequência / Sledování napětí a frekvence	Valore limite / Valor límite / Valor limite / Limit	Tempo max. fino a disconnessione / Tiempo máx. hasta la desconexión / Tempo máx. até ao corte / Max. doba do odpojení	Impostazione del cliente / Ajuste de cliente / Ajuste por parte do cliente / Zákaznické nastavení
Limite minimo tensione CA / Margen inferior de la tensión CA / Limite inferior tensão CA / Spodní mez AC napětí	184.0 V	0.2000 s	
Limite superiore tensione CA / Margen superior de la tensión CA / Limite superior tensão CA / Horní mezi AC napětí	264.5 V	0.2000 s	
Limite minimo frequenza CA / Margen inferior de la frecuencia CA / Limite inferior frequência CA / Spodní mez AC frekvence	47.50 Hz	0.2000 s	
Limite superiore frequenza CA / Margen superior de la frecuencia CA / Limite superior frequência CA / Horní mez AC frekvence	51.50 Hz	0.2000 s	

Riconoscimento reti ad isola / Reconocimiento de red aislada / Detecção das redes isoladas / Identifikace ostrovního systému	attivo / activo / activa / aktivní	Tempo max. fino a disconnessione / Tiempo máx. hasta la desconexión / Tempo máx. até ao corte / Max. doba do odpojení	Impostazione del cliente / Ajuste de cliente / Ajuste por parte do cliente / Zákaznické nastavení
Riconoscimento attivo del funzionamento ad isola / Reconocimiento activo del funcionamiento aislado / Detecção activa das redes isoladas / Aktivní identifikace ostrůvkového režimu	<input checked="" type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne	5 s	<input type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne

Tempo di riconnessione / Tiempo de reconexión / Tempo antes de voltar a ligar / Doba do opětovného zapnutí	attivo / activo / activa / aktivní	Tempo di monitoraggio rete / Tiempo de monitorización de red / Tempo de monitorização da rede / Doba sledování sítě	Impostazione del cliente / Ajuste de cliente / Ajuste por parte do cliente / Zákaznické nastavení
Tempo di riconnessione dopo errore di rete / Tiempo hasta la reconexión después de un fallo en la red / Tempo até voltar a ligar após um erro da rede / Doba do opětovného zapnutí po výpadku sítě	<input checked="" type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne	60.00 s	<input type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne

Qualità della rete / Calidad de red / Qualidade da rede / Kvalita sítě	attivo / activo / activa / aktivní	Valore limite / Valor límite / Valor limite / Limit	Impostazione del cliente / Ajuste de cliente / Ajuste por parte do cliente / Zákaznické nastavení
Immissione di corrente continua - valore massimo consentito per offset della corrente CA / Inyección de corriente continua - valor máx. permisible para corriente de offset CA / Alimentação de corrente contínua - valor máx. admissível para desvio da corrente CA / Napájení stejnosměrným proudem - max. povolená hodnota offsetu AC proudu	<input checked="" type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne	0.2000 A	<input type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne
Protezione contro aumento tensione - monitoraggio di 10 valori medi, per es.: come da EN 50160 / Protección contra aumento de tensión - monitorización de 10 valores promedios, p.ej. según EN 50160 / Protecção contra o aumento de tensão - monitorização de 10 valores médios, por ex. segundo a norma EN 50160 / Ochrana proti zvýšenému napětí - sledování 10 průměrných hodnot, např. podle EN 50160	<input checked="" type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne	253.0 V	<input type="checkbox"/> Si/Si/ Sim/Ano <input type="checkbox"/> No/No/ Não/Ne
