

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



O. ref.: 21.166

U. ref.: \_\_\_\_\_ VERSLAG NR. Boes 21/06

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Huist 86

EIGENAAR: Van der Pijcken

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: Jefaepe

Adres: Mouchten

BTW of IK: \_\_\_\_\_

STROOMLEVERANCIER: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. 34427026  
Index: 5045 kwk.

Datum van het onderzoek: 21/03/02 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) Zwabelok

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 380/220 V Bescherming van de aansluiting do A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type 40A/10/1300V defo, 3H

Type van de aardelektrode: lus baren pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 14 Ohm; RI tot 50,7H MOhm

BESCHRIJVING:

6 eedf. kringen 16A of defo, 03A  
1 eedf. " 3x25A  
13 eedf. " 16A

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangegeven van de stroomverdelers
naam:
handtekening:


### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndrags en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/03/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


2. De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER  
nr. + naam + handtekening

De directeur,

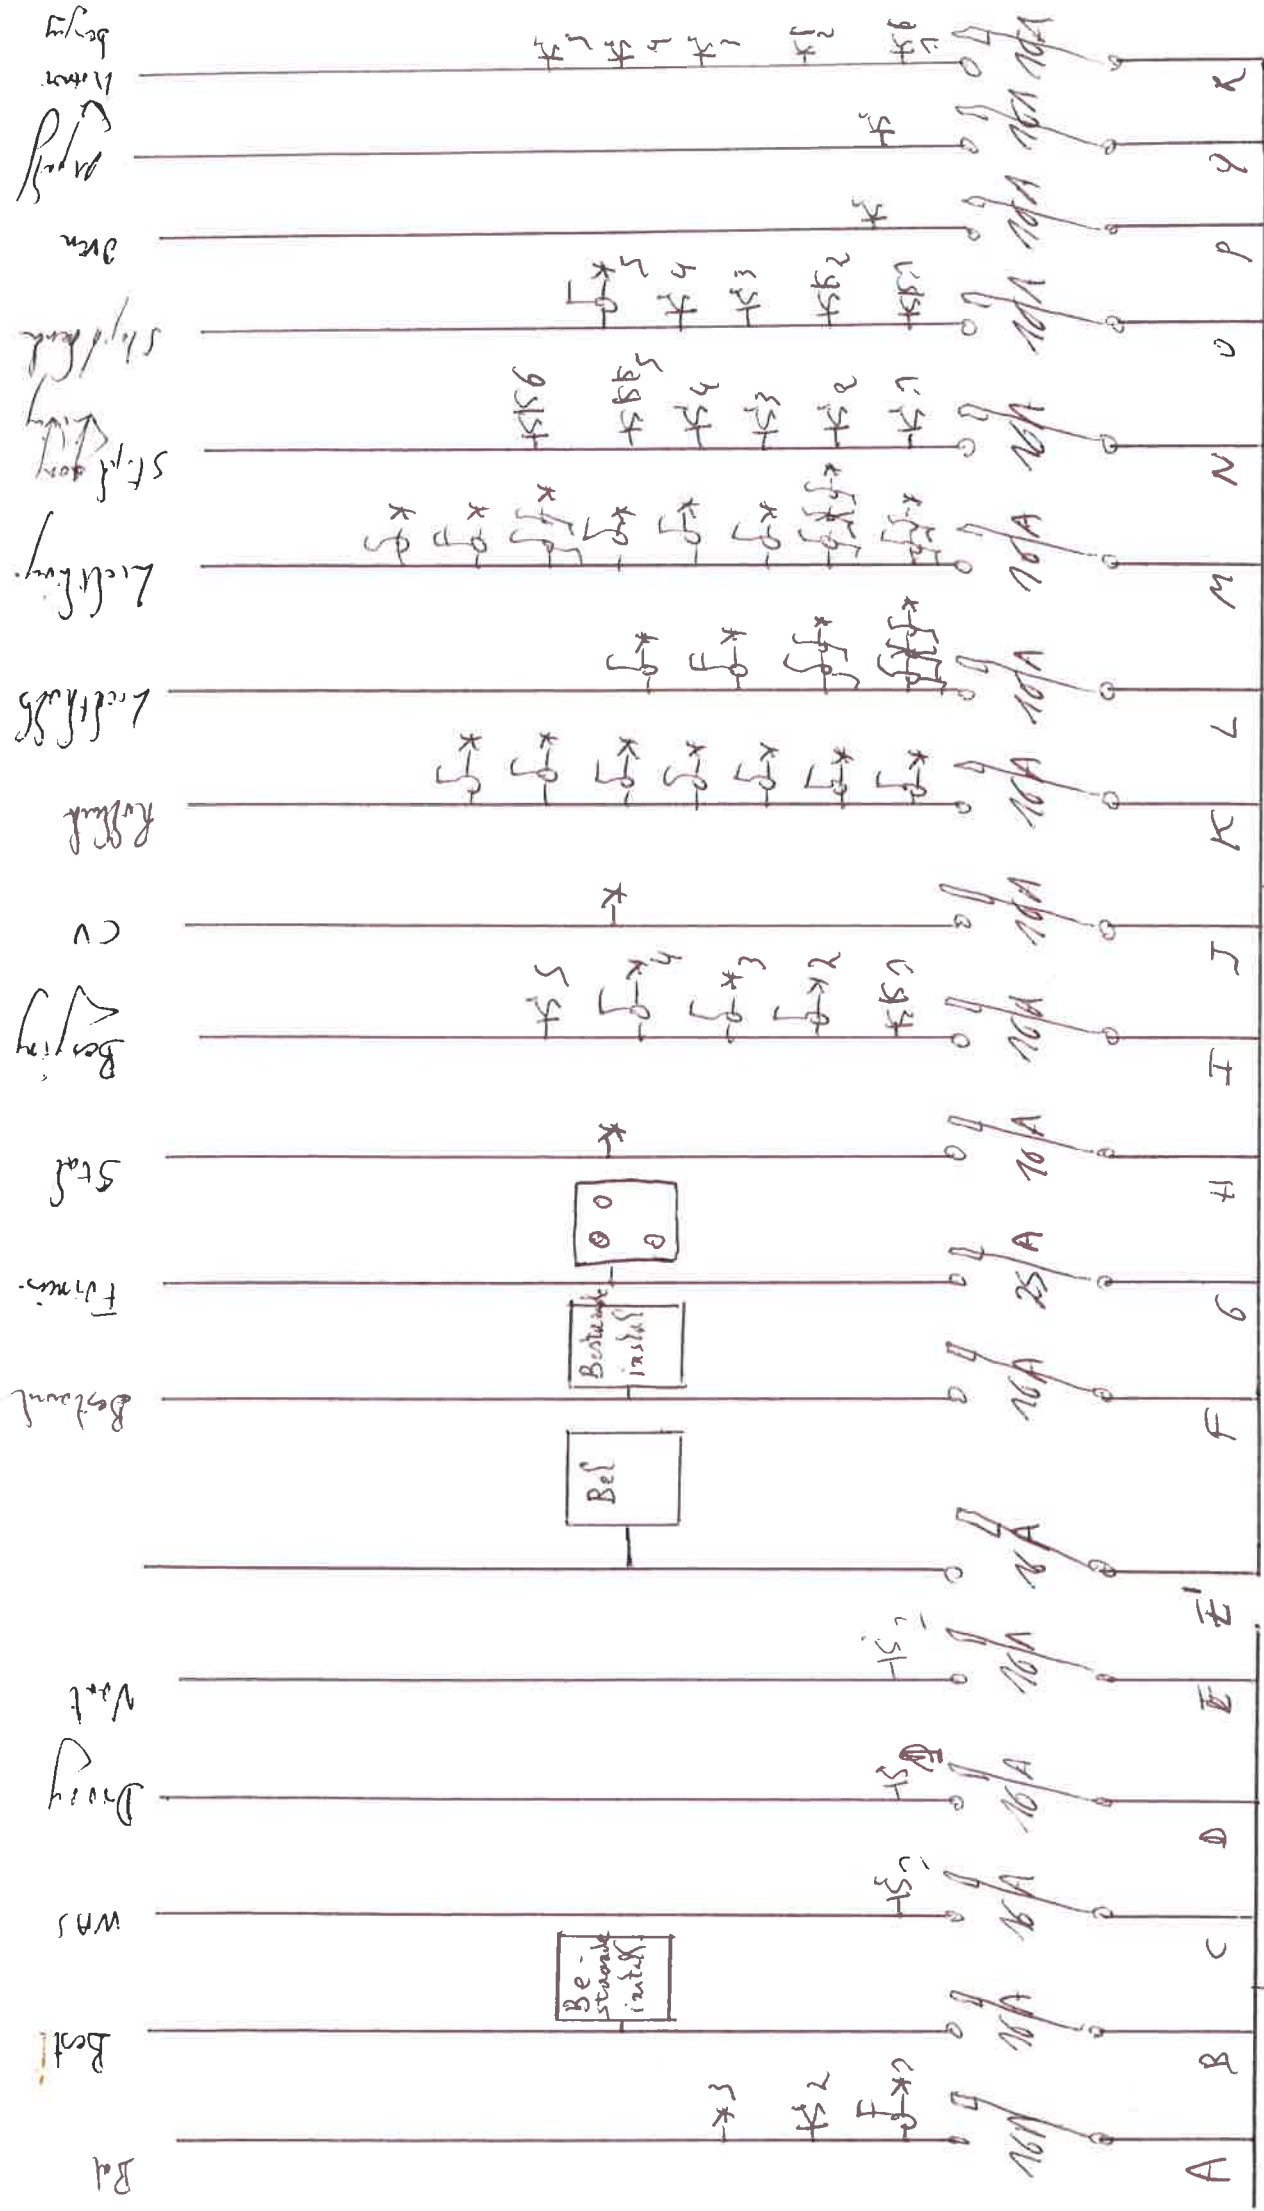

Van der Staaten  
Hulst  
Opind.



VERZIEN: H. H. H. H.  
 Inspecteur BTW nr. 123  
 AELRECHT

Situationschart  
 Von der Link

