

3258050

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. 3226129

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitting motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : APPARTEMENT

Plaats van onderzoek : F. VAN EEDENPUIEN 5/17 2050 APEU

Eigendom van : VAN TILBORGH LIEVE

Opdrachtgever : " " "

Installateur :

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : POOTERS Datum van onderzoek : 11/6/2010

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 250 Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : MDA 25A 4P A Schak. : 300mA 40A 4P 3kA 22.5 kA

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOD aantal geleiders : 4 doorsnede : mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net~~ - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ke / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 270 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 50 MΩ

Diff. schak. : algemene : 300 4P mA bijkomende : 30 4P mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelomschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 11/6/2015, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook

voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

POOTERS Stephan
GSM: 0493/246.111

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.


1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUURDEERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische


03/005W/09/15D

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontici
 Onderzoeker: POOTERS Stephan

is gecontroleerd door:
 KCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Zoeker: POOTERS Stephan

Datum: 11/6/10
 PV nr.: 3258050
 Handtekening: 

1:
 :
 kening:

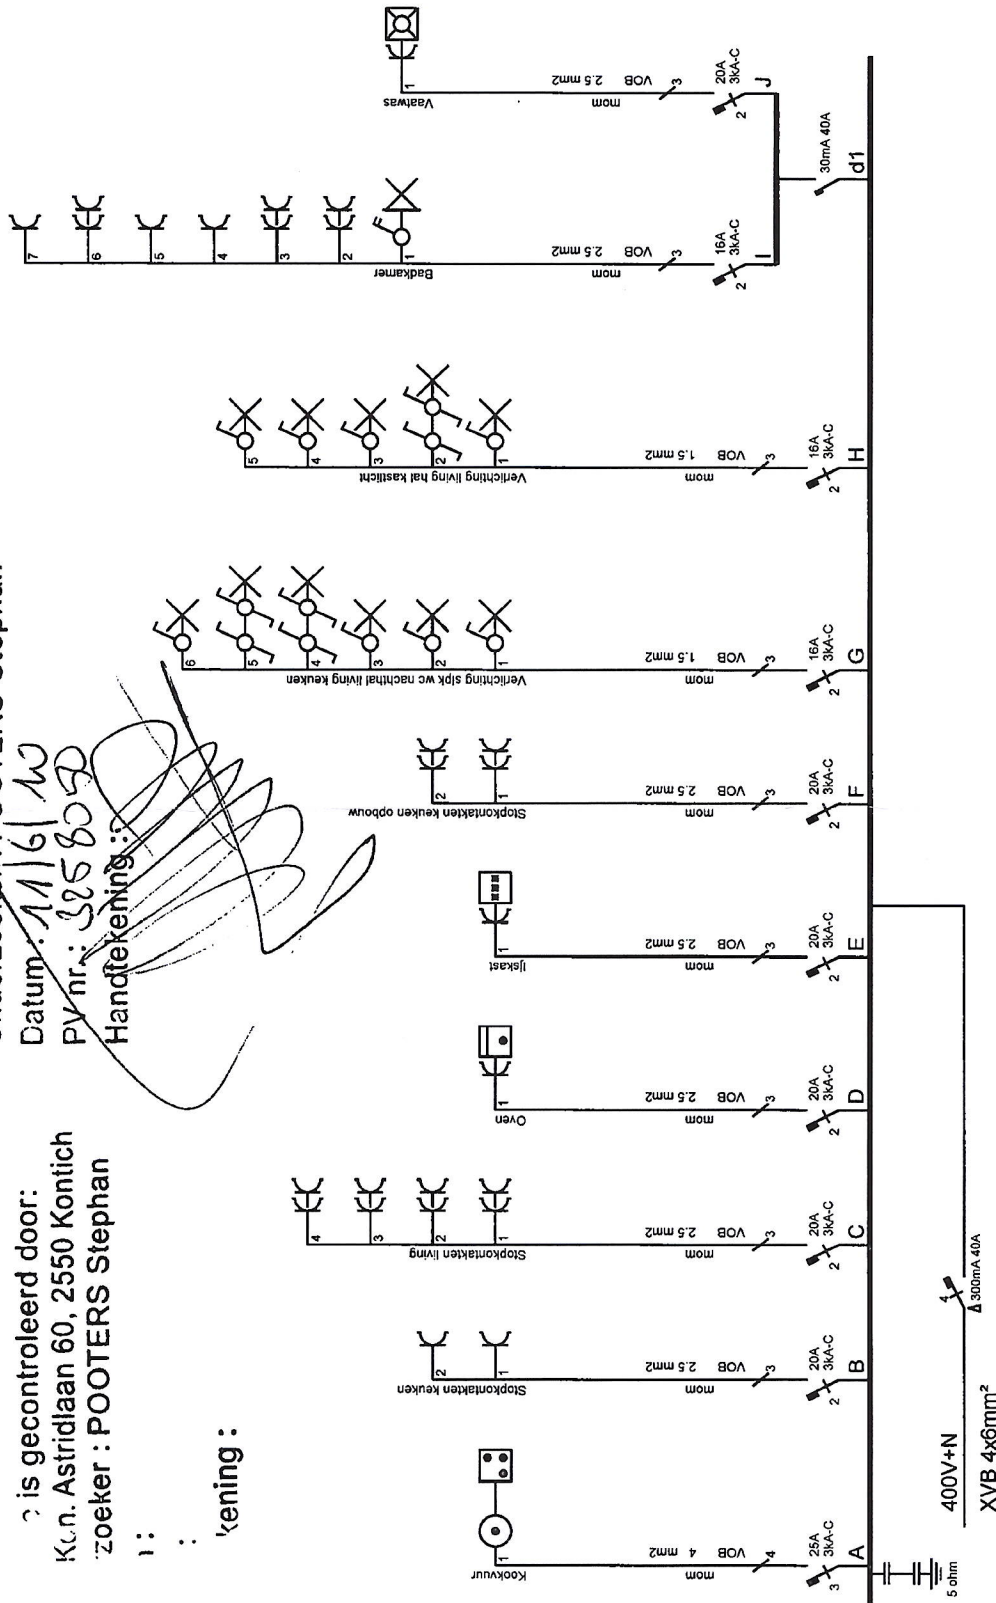

Afgev. erkend organisme
 .. / .. / ..

Van Tilborgh
 Frederik Van Eedenplein 5
 B-2050 ANTWERPEN

Verantw. uitvoering
 .. / .. / ..

ALEKTRO bvba
 Lintsesteenweg 158
 B-2570 DUFFEL
 BE 0460.355.070

