

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 154/090226/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

Datum van het onderzoek: 26 feb 2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A

Bedingskabel hoofdbord: 3 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Teco

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3; RA: 2,9 Ohm; RI tot >1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Controlebezoek van bestaand gelamineerd met gedeeltelijk vernieuwde elektrische installatie

- Badkamer niet geïsoleerd
- verleiding in afleiding
- Schema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/26/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____


DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-08/2008


251. geldig

MARIA THERESIA STRAAT 63 111
3000 LEUVEN

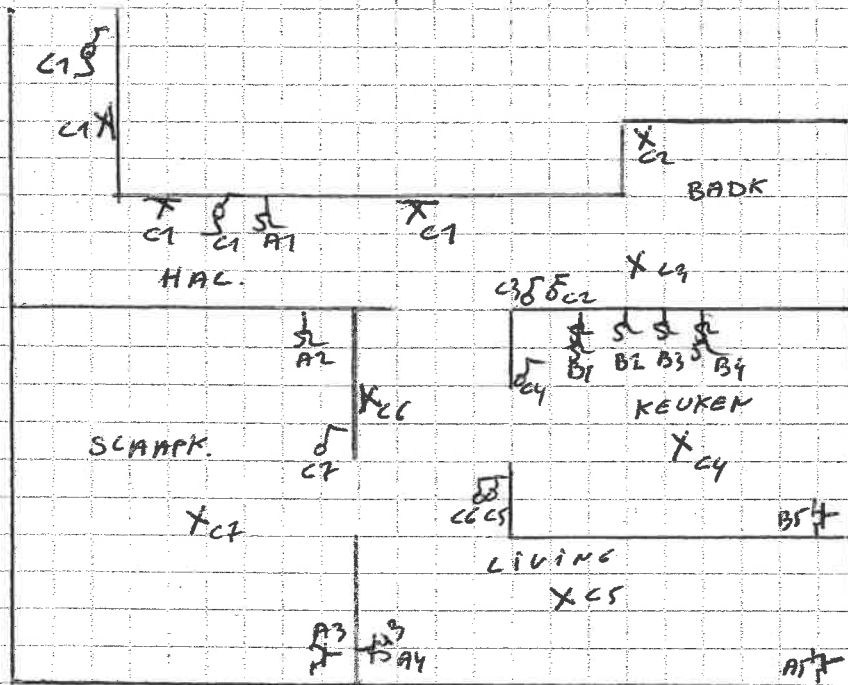


DIFF 0,3

DIFF 0,03

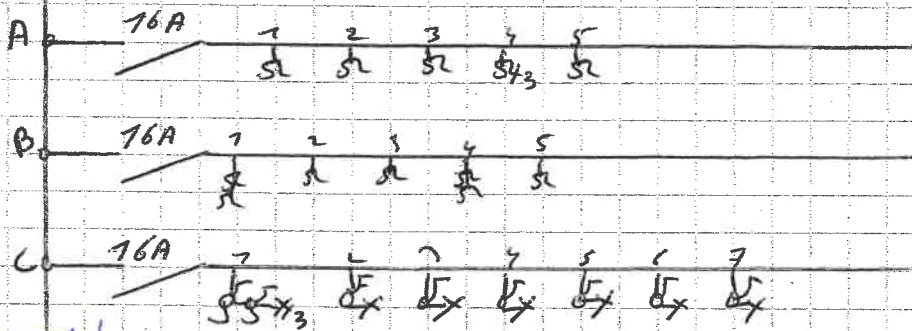


~~BTU~~
154 B2
26/009

MARIA THERESIA STRAAT 63 111
3000 LEUVEN

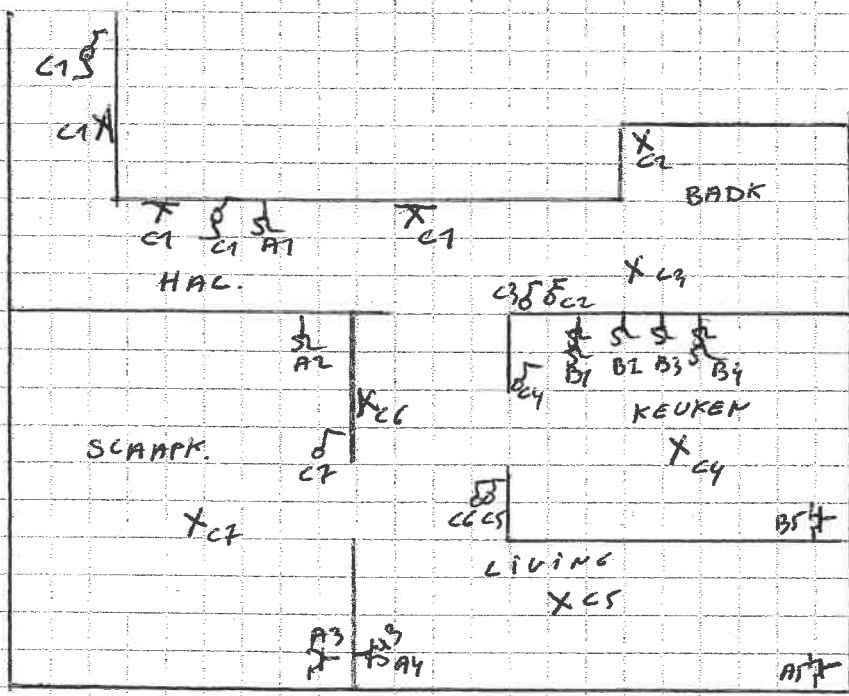

DIFF 0,3

DIFF 0,03

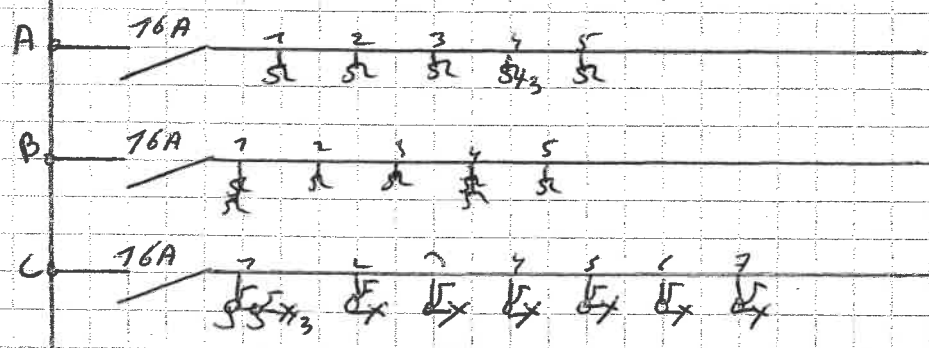

BTU
152A
26/10/09
