



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 2021-08-20



N 260871

Resi code:

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
O Brabant tel.: 02 674 57 11

O Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
O Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>HUYSMANS</u>	Naam, voornaam : <u>HUYSMANS</u>
Ident. Kaart nr. : <u>591-4269691-76</u>	Adres : <u>MAESTRUM 5</u>
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>2600 MOL</u>
	Tel. : <u>2600 MOL</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☒ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarende	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr. : <u>10492304</u>	meterstand dag : <u>26549</u>	nacht :
Beschrijving installatie	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. :	
	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☐	
	Voedingsleiding hoofdbord :	Aantal eindstroombanen : <u>12</u>	
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>30</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>14.2</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>10</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil
Visum DNB of aangestelde :	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet aan het AREI.
- ☒ De bestaande installatie ☒ voldoet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Hans Fama Agent nr. : 2014 Datum : 05/12/2023

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema('s) : 3 ☒ Eéndraadsschema('s) : 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór


05/12/2023 door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

no-VINGOTTE BELGIUM
no-VINGOTTE Electricity
S. RANK
6731.1000

2044
5/12/13

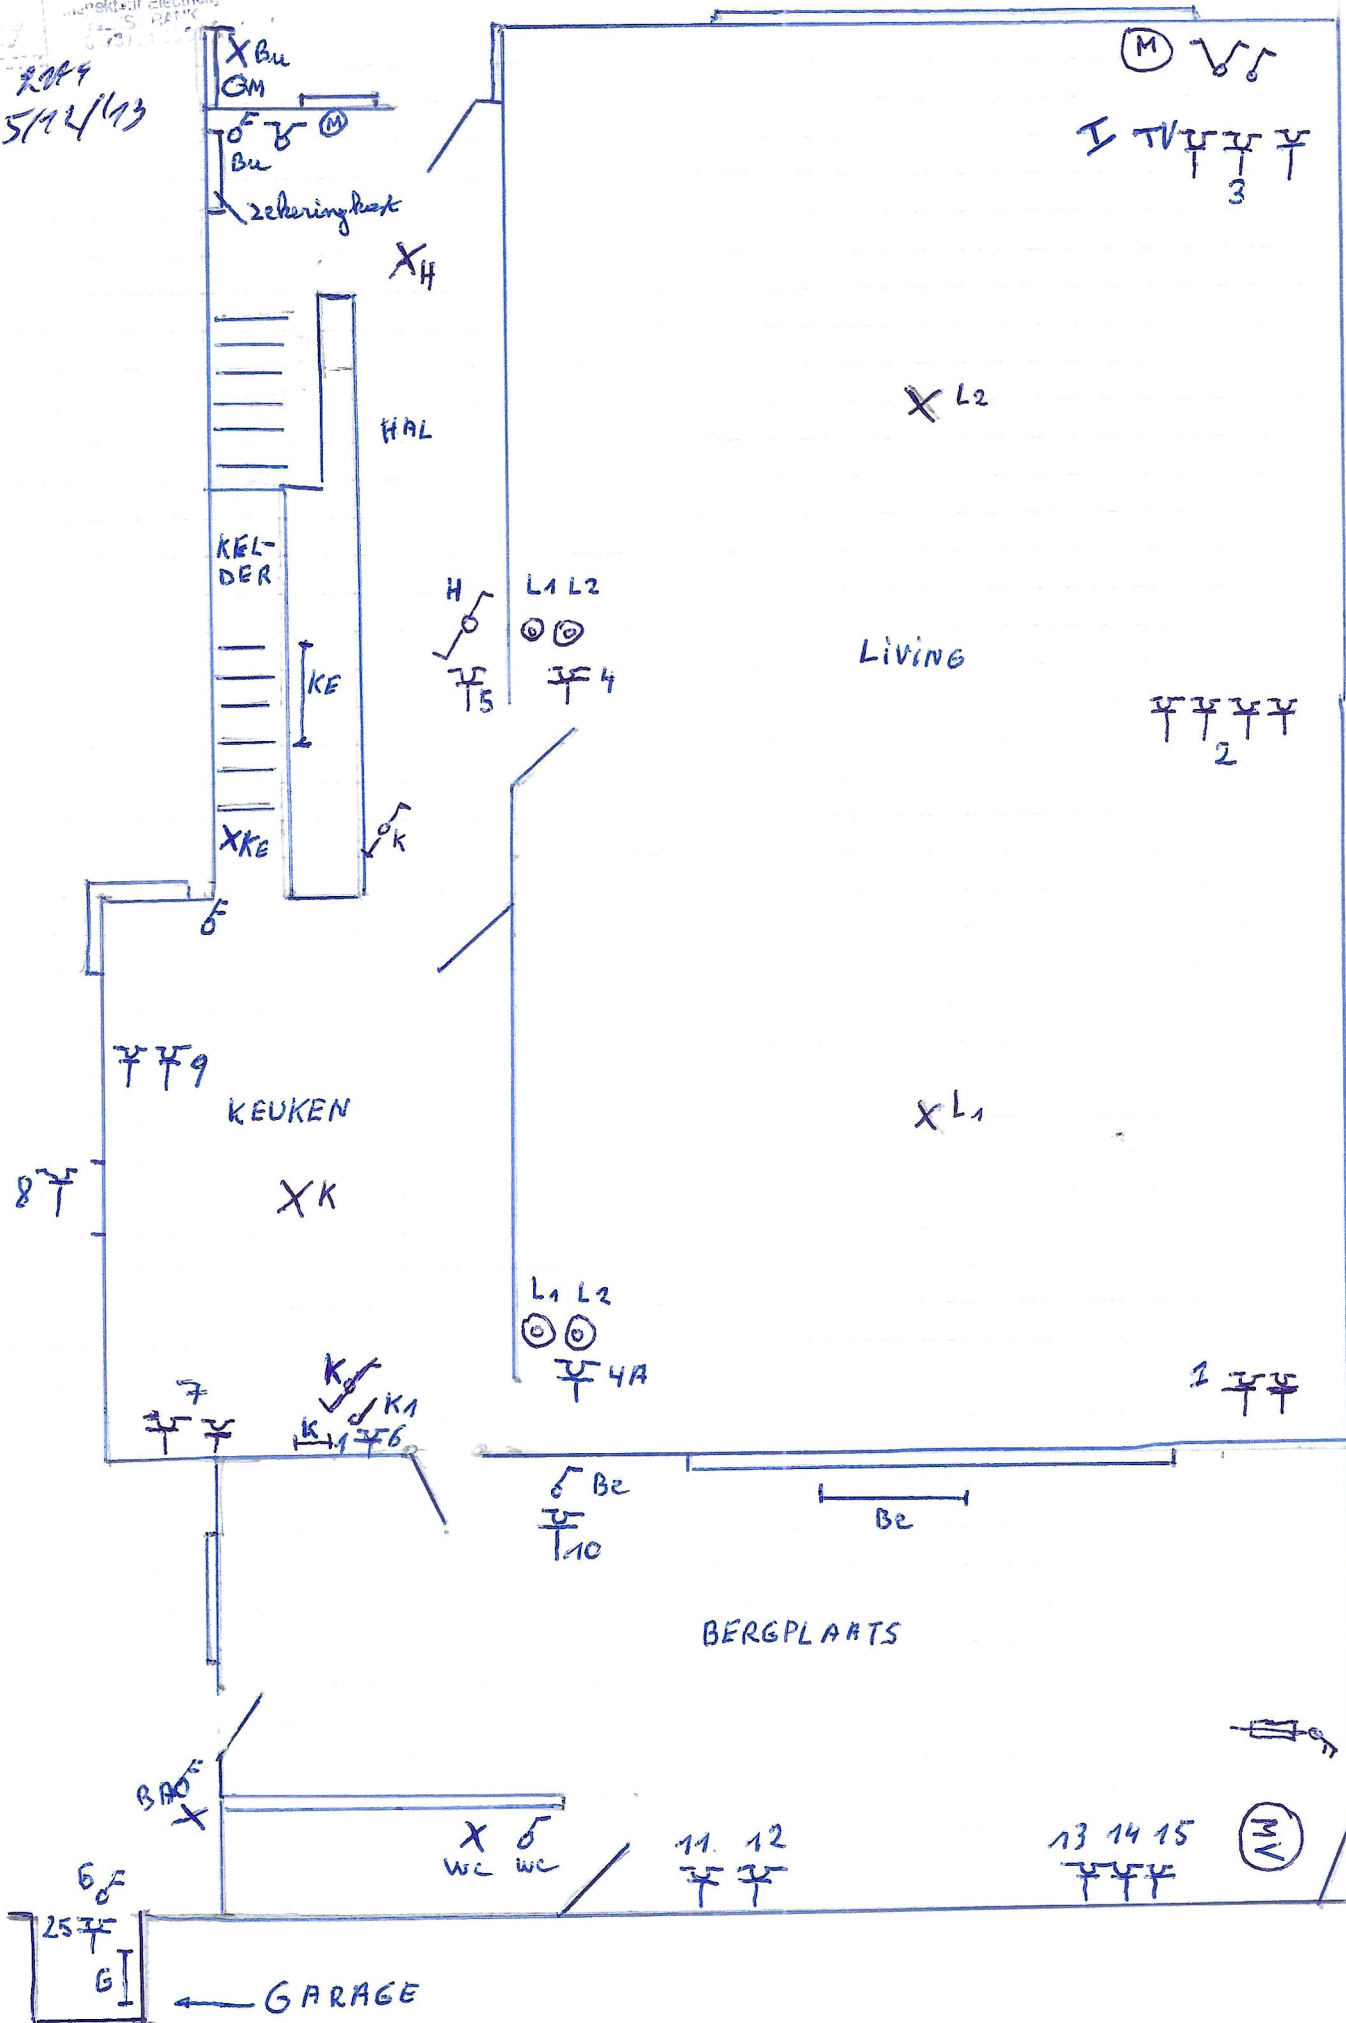




WOLFF & BECK
Elektrotechnik
F. 51111
67311
67311


PASTOORVAARSTRAAT 5 2400-MOL. GOMPEL


2005 5/12/13

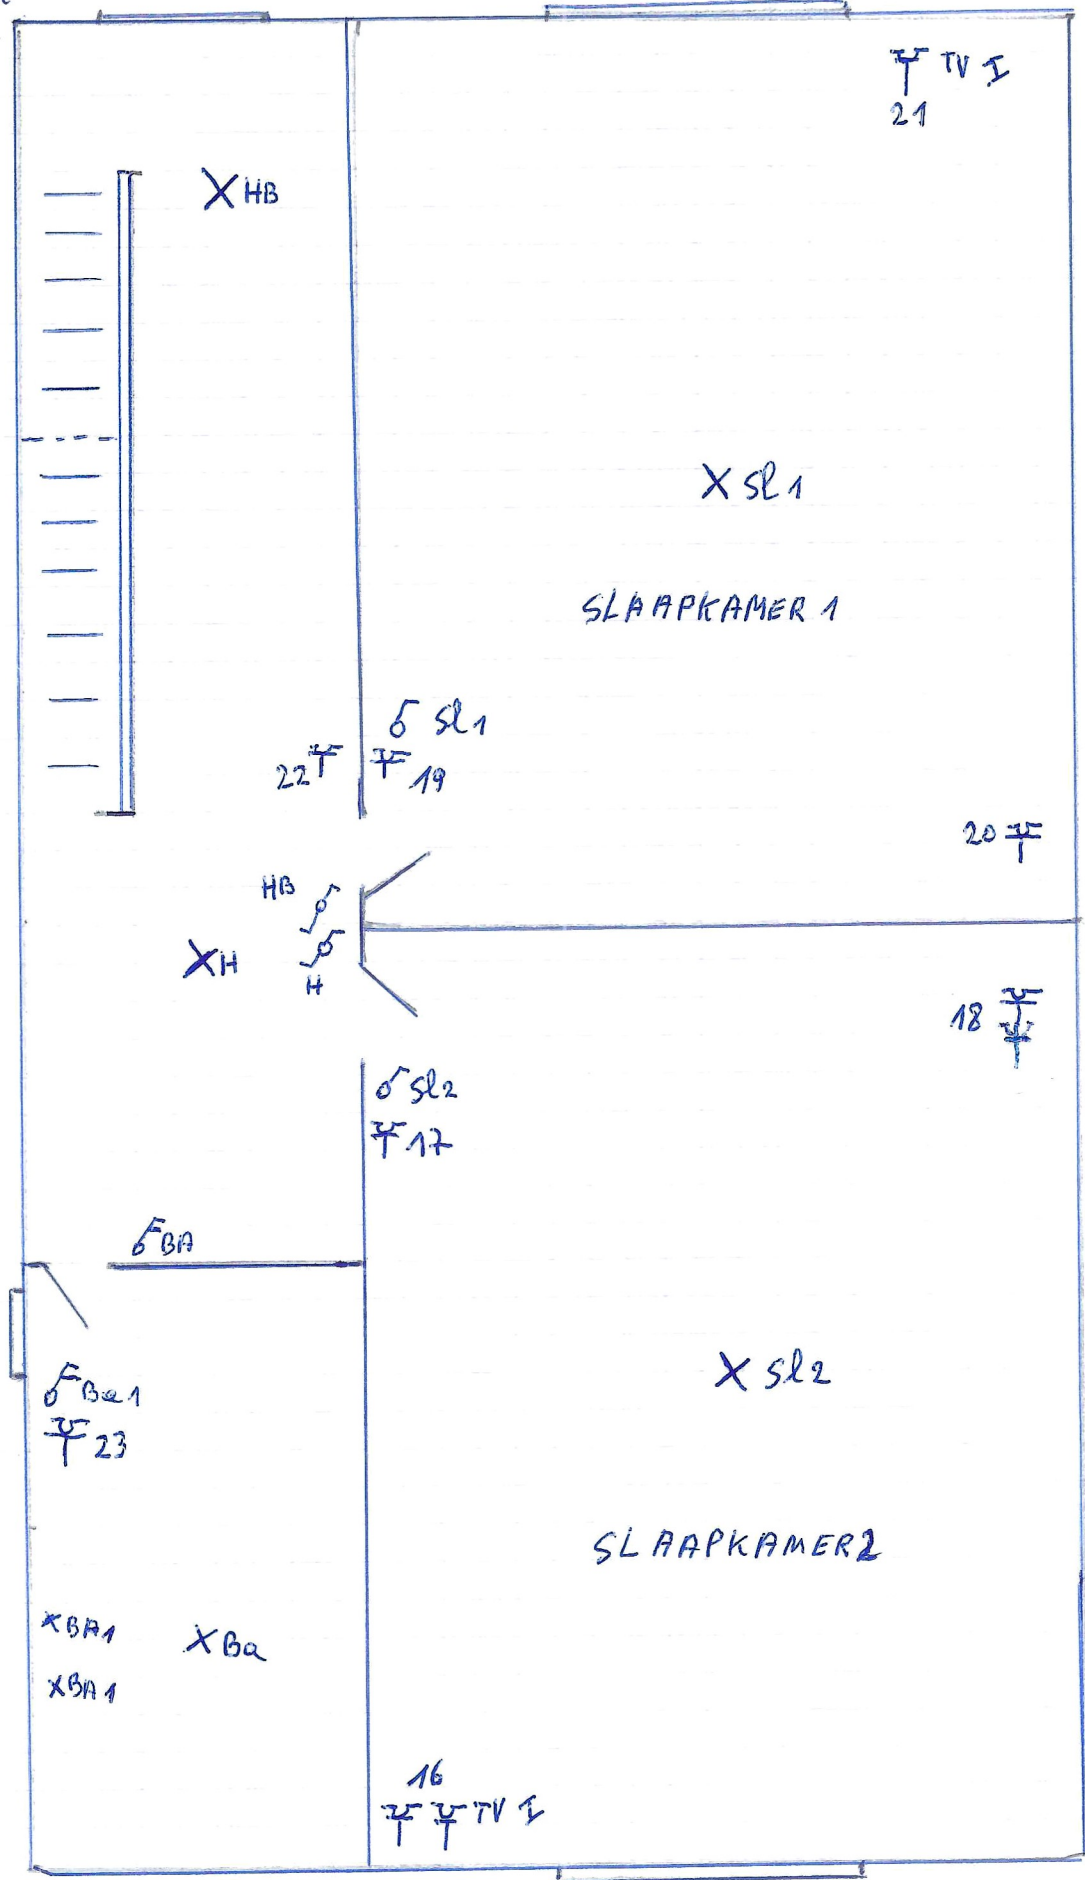


2024
 15.12.11/13

PRÜFUNG VORSTRICH 5 2400 - MOL - GONDEL

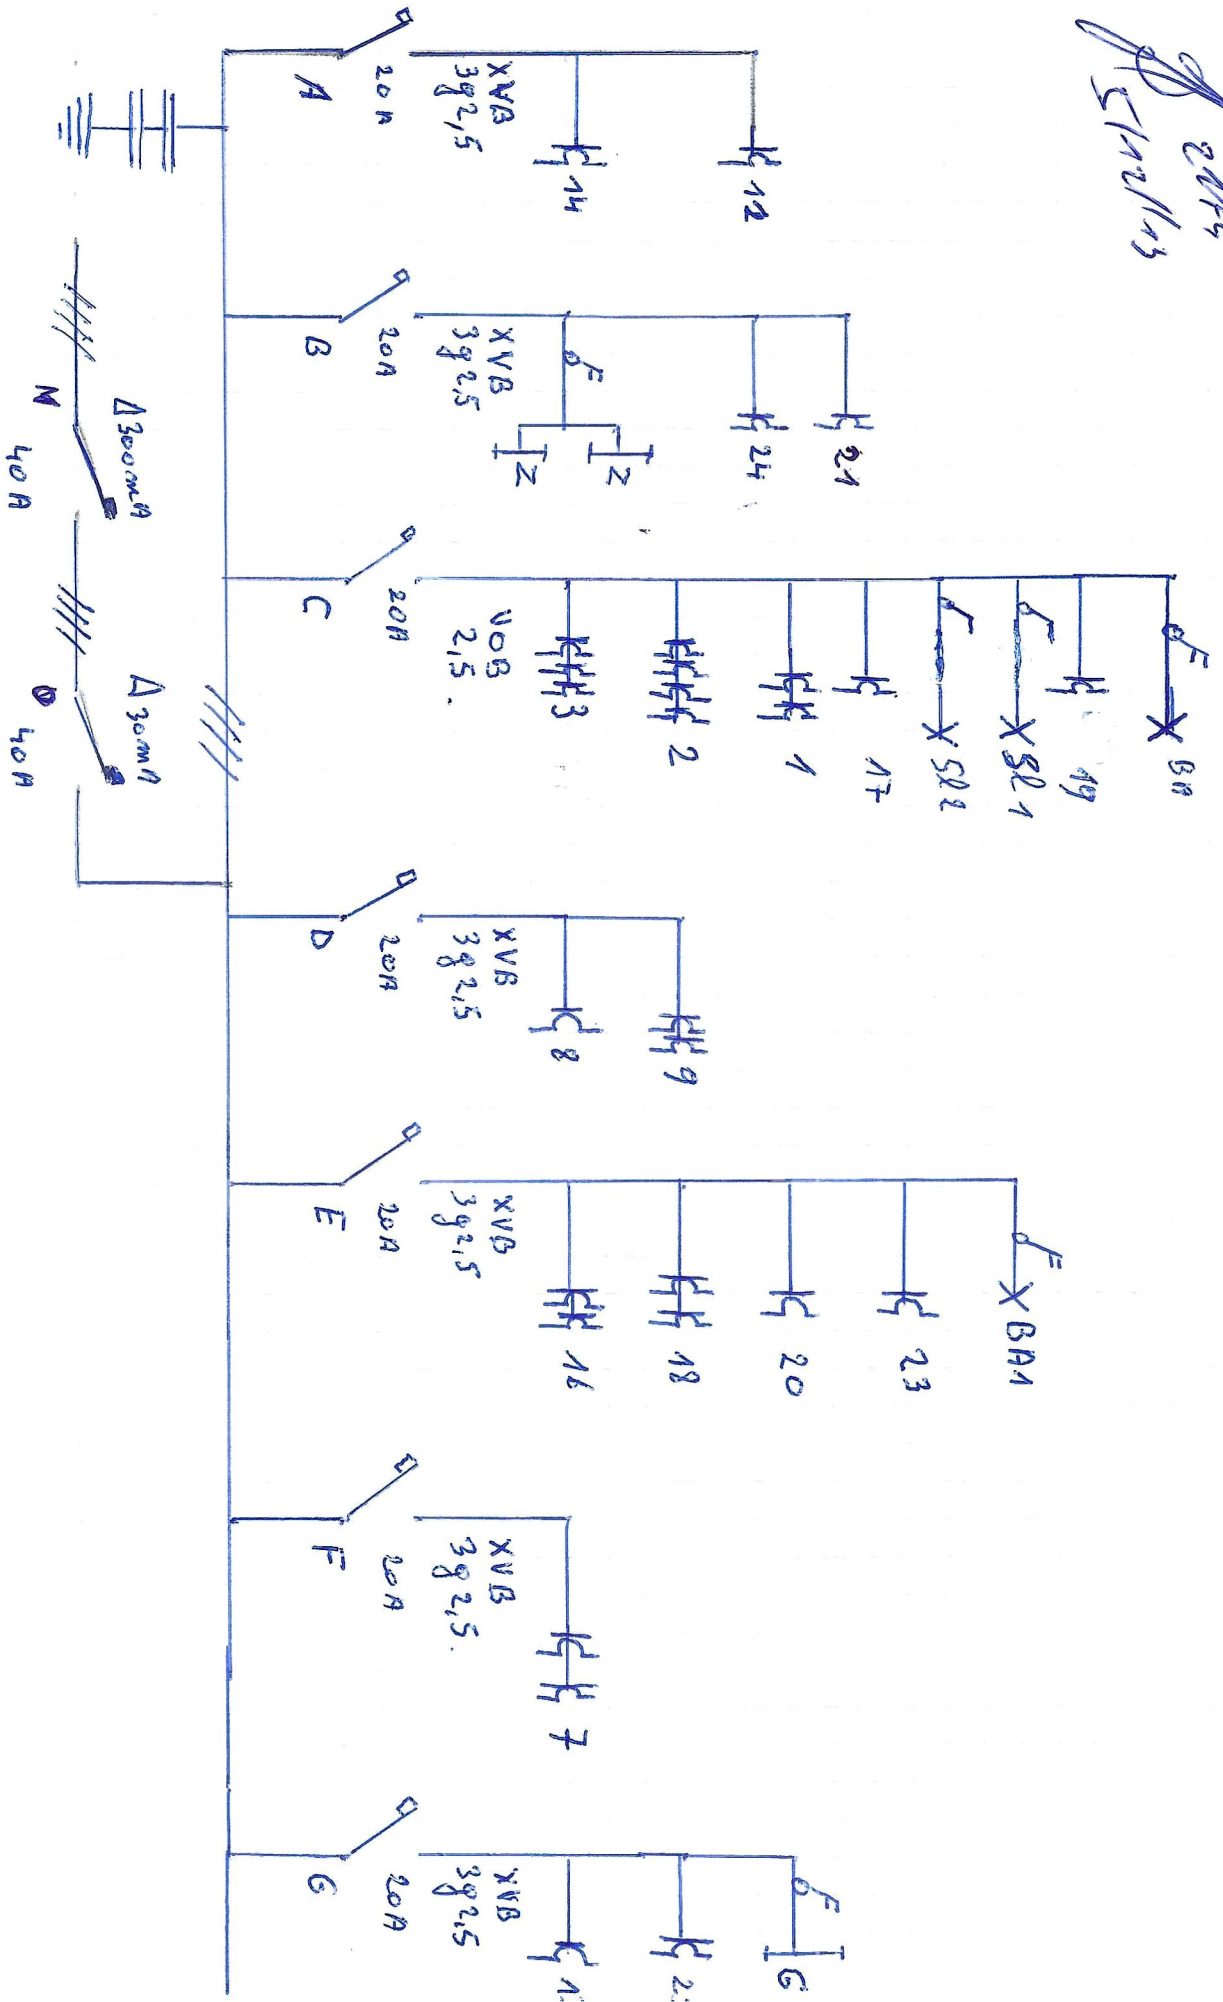



2044
5/12/13

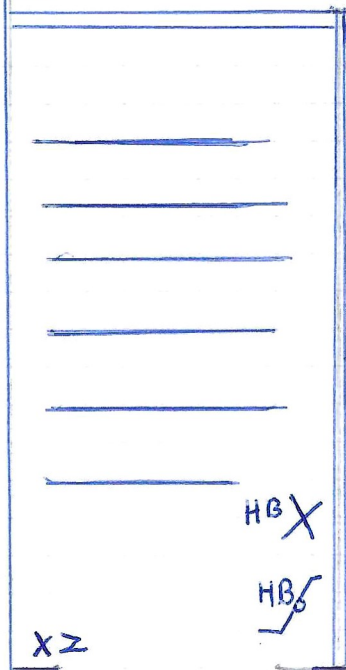

Z

Z

FZ
T24

ZOLDER

PASTOORVAARSTRAAT 5 2400 MOL-GORPEL

- A - Middenste stop tegen verwarmingsketel en stop links tegen WC.
- B - Licht + stop solder + stopcontact slaapkamer 1 (21)
- C - stop living 3-4-2 licht badkamer
licht slaapkamer 1+2 + stop onder vloerkleed.
- D - stop rechts boven elektrisch vuur (8) en (9)
- E stop slaapkamer 2 volledig + stop slaapkamer 1 tegen muur
van slaapk 2 - licht + stop bad tegen buitenmuur (23)
- F stop keuken rechts van afwasbak (7)
- G stop rechts naast verwarmingsketel + licht en stop garage.
- H - licht keuken + stop onder vloerkleed.
- licht living + 2 stop onder vloerkleed.
- licht helder + stopcontact.
- licht chassieffage phonos + stop
- licht WC.
- I - Verwarming.
- J - 1ste stop tegen verwarmingsketel + rechts stop tegen WC (11)
- K - Belknausfo
- L - Buitenlicht aan voordeur + elektrisch aan voordeur.
- M - Elektrisch vuur.
- N - Differentieel 40A - 300mA
- O - Differentieel 40A - 300mA
