

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: totti_ercom@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4658757
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/03/2016

Klant / Opdrachtgever:
Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25 v1
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie: bestaande Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: Max Elskampstraat 25 v1 ANTWERPEN 2 2020
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 271
Datum onderzoek: 10/03/2016 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/03/2041 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILIA
Eigendom van: Akdemir Mehmet
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAAN nr.: - Teller nr.: 34723519 Stand I : 12480 Stand II -
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverblindng: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: VOB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 17 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 1 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 4+2

Zie schema's in bijlage

FASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuk

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

4. LEIDING BUITEN HET GEBOUW

Zichtbaar / niet zichtbaar : ...
 Type leiding : ...
 Diameter : ...
 Lengte : ...

5. LEIDING BINNEN HET GEBOUW

Voeding	Type	Diameter	Lengte
Staal	Fe"1	Fe"1	Niet na te gaan
Koper	Cu15	Cu15	Niet na te gaan

6. IDENTIFICATIE LEIDINGEN

De identificatie van de leidingen is gebeurd door het aanbrengen van de okergele kleur.

7. HOOFDKRAAN

Voor gasteller : zichtbaar

8. KRANEN IN DE INSTALLATIE

- Stopkraan CV-ketel Junkers 24kW C13
- Stopkraan fornuis type A met 4 pitten

9. VERBINDINGEN

- Schroefverbindingen voor staal
- Knelverbindingen voor koper

10. VERLUCHTINGSOPENINGEN

Lokaal gasteller :	boven:	cm	x	cm =	cm ²
(gascabine maat.) :	onder:	cm	x	cm =	cm ²
	boven + onder:	cm	x	cm =	cm ²
Stookplaats :	boven:	cm	x	cm =	cm ²
	onder:	cm	x	cm =	cm ²
	boven + onder:	cm	x	cm =	cm ²

11. DICHTHEID:

De installatie werd getest met de gasmeter op bedrijfsdruk van 25mbar

INBREUKEN

Geen.

NOTA


- De niet zichtbare gedeelte van de leidingen behoren niet tot de controle
- Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

BESLUIT

- ☐ De installatie is goedgekeurd.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker



Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -, Fax: -
GSM: - e-mail: totti_ercom@hotmail.com



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: GA33
Verslagnr.: 4694657
Voorl. verslagnr.:
Datum: 23/05/2016

Akdemir Mehmet
Max Elskampstraat 25
2020 ANTWERPEN 2

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install. ID:
Plaats van onderzoek:
Datum van onderzoek:
Basis onderzoek:
Onderzoeker:
Eigendom van:

Max Elskampstraat 25 v1 ANTWERPEN 2 2020
23/05/2016

Periodiciteit: 0 maanden
Volgende onderzoek vóór: 31/05/2016
Aanwezige persoon:

AKCAOGLU ATILLA

ALGEMEENHEDEN

De installatie is gecontroleerd volgens de voorschriften het ARAB art. 52.11 en de norm NBN D51-003 en NBN D51-004 en beperkt zich tot de punten hieronder beschreven.

Specifiek lastenboek van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.
Exploitatatievoorwaarde van toepassing op de installatie is ons niet voorgelegd.

CONTROLE GASINSTALLATIE

1. **GASTELLER**


Plaats : Kelder
Merk : ITRON
Type : G4
Jaar : 2011
Index : 6926 m²
Fabricatienummer : 11535170

2. **DRUK**

Maximale dienstdruk : 25mbar

3. **AANSLUITING OP HET OPENBAAR NET**

Type leiding : ...
Diameter : ...
Lengte zichtbaar gedeelte : ...

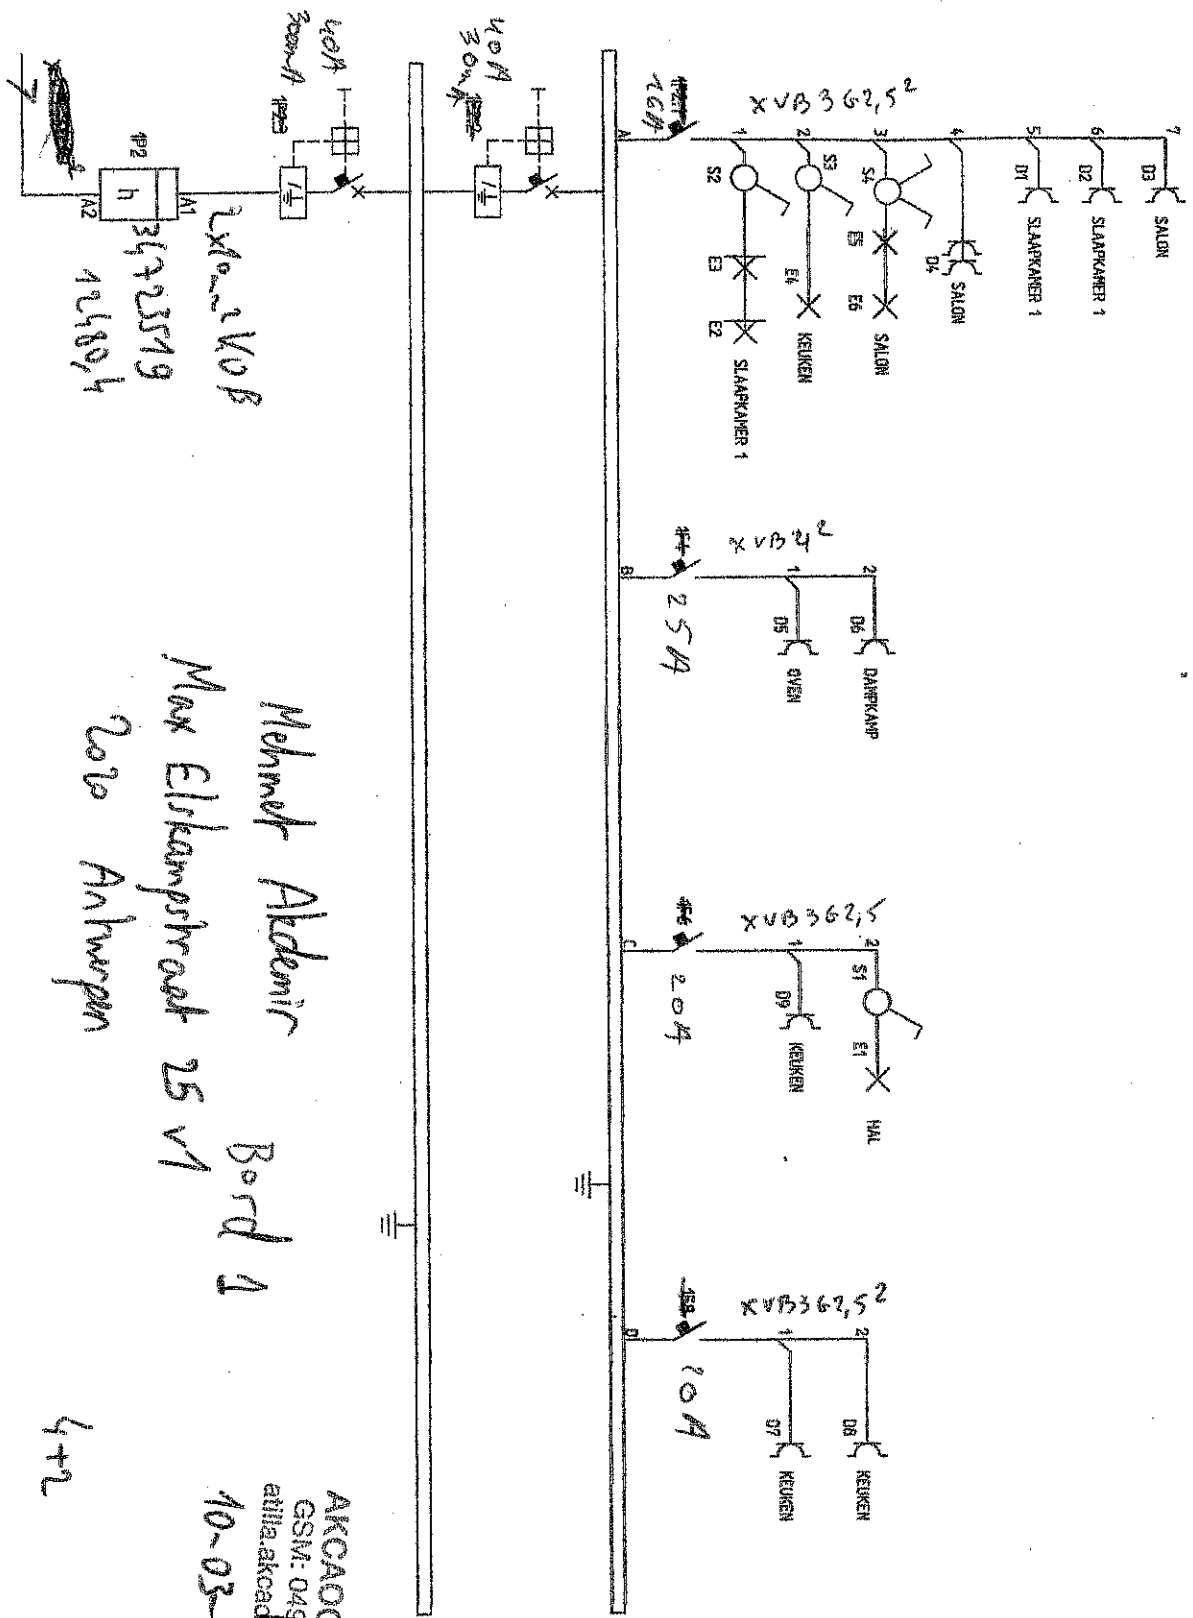

2x10-2K0B
34923519
12480,4


Mehmet Akdemir
Max Elskampstraat 25 v1
2020 Antwerpen

4+2


AKCAOGLU Atilla
GSM: 04937446.132
atilla.akcaoglu@ocp.be
10-03-2016

EENDRAADSCHEMA

Projectnaam:	MIT WILRIJK 2	Tekeningnr.:		Com.:		Tek.:	
Datum:	17/12/2015	Functie:		Locatie:		Bld.:	Van:
						1	1

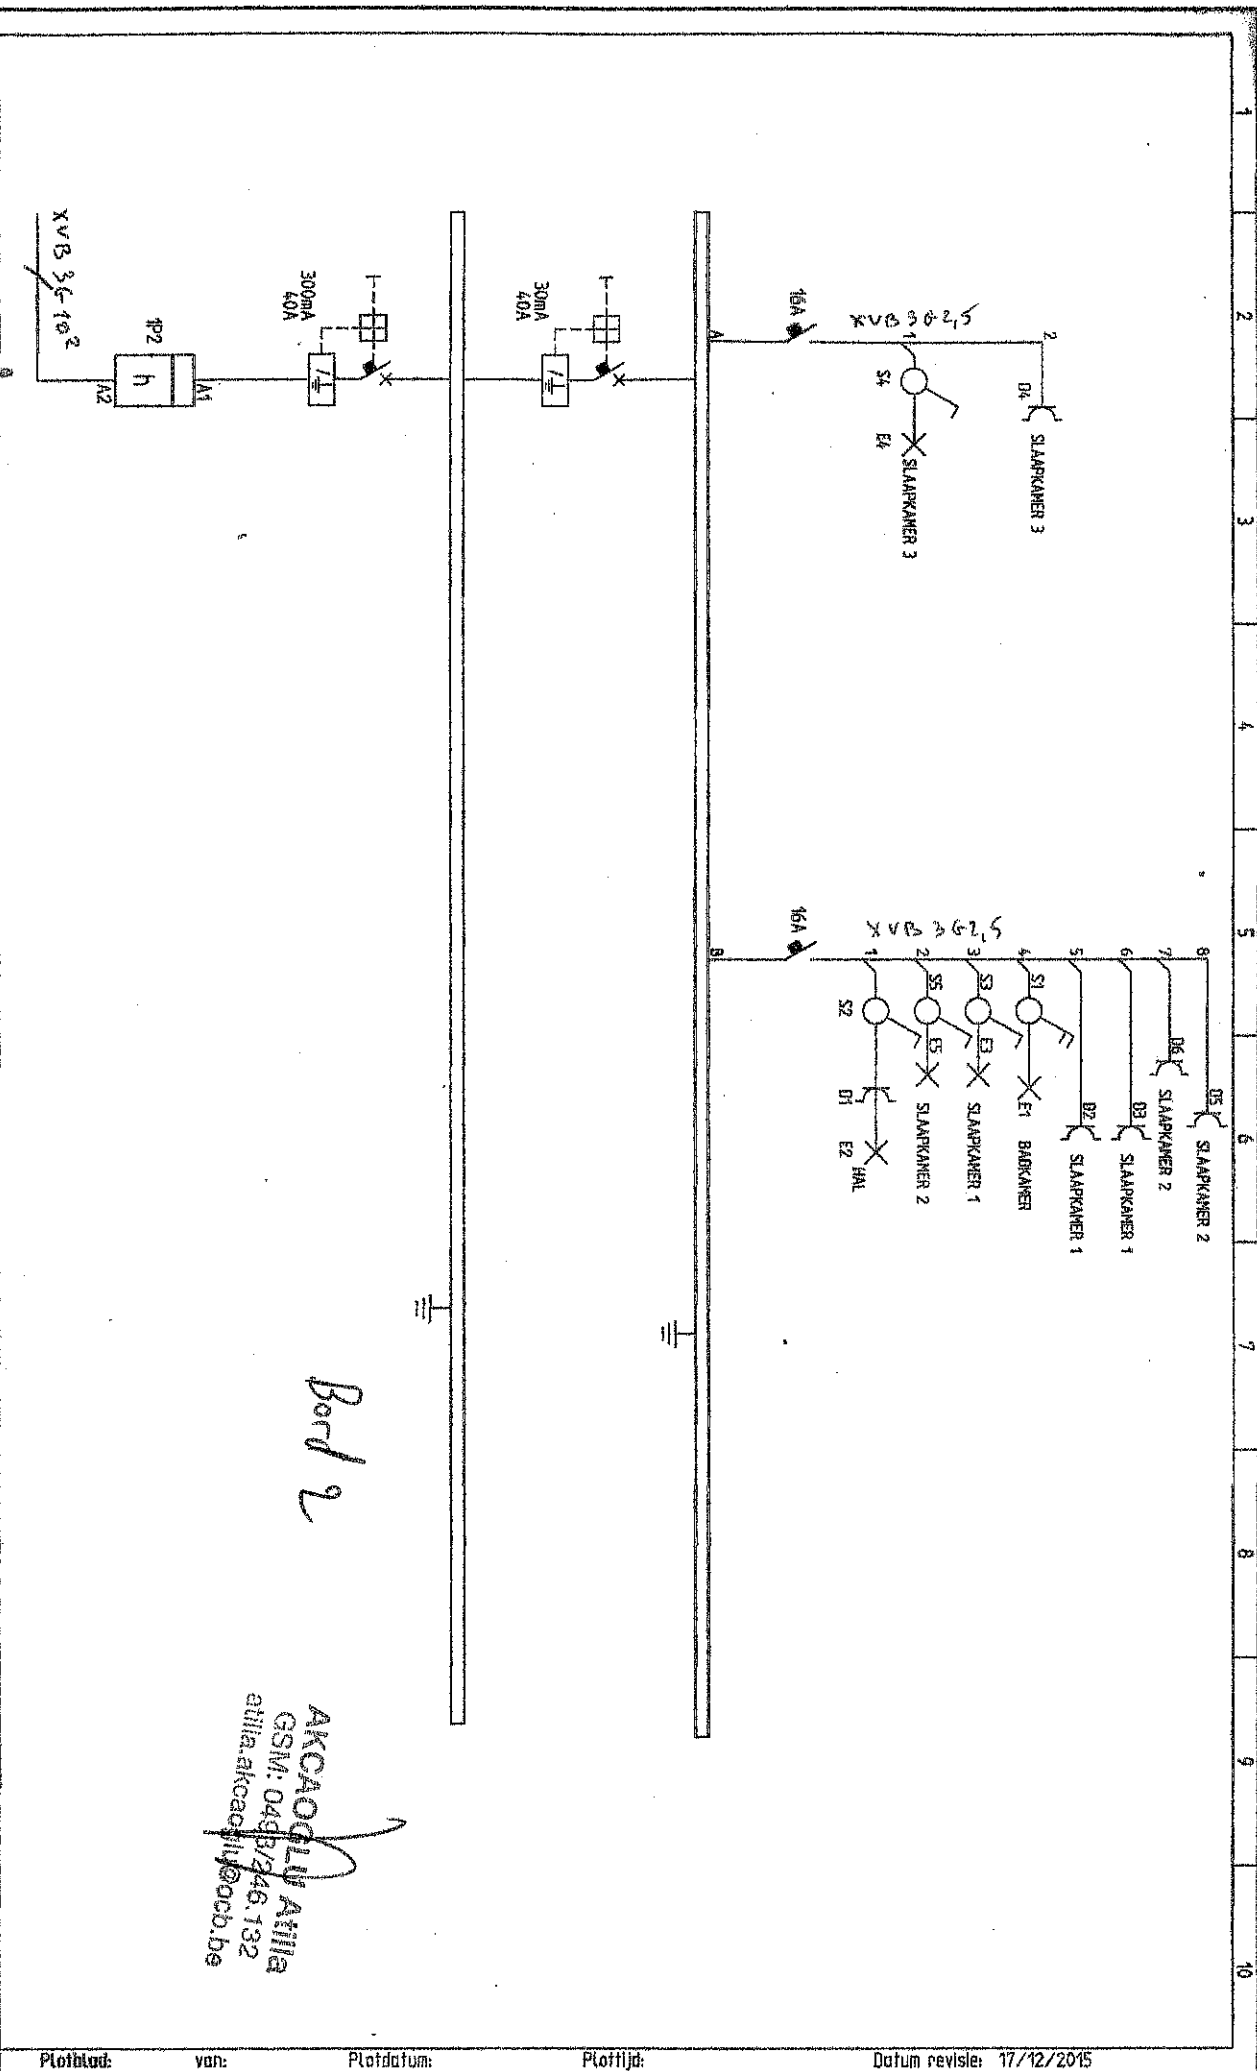

eendtruckschema		Projectnaam: Mr. Wilrijk		Tekenlijst:		Corr.:		Tek.:	
Datum: 17/12/2015		Functie: z		Locatie: +		Blad: 1		Van: 1	

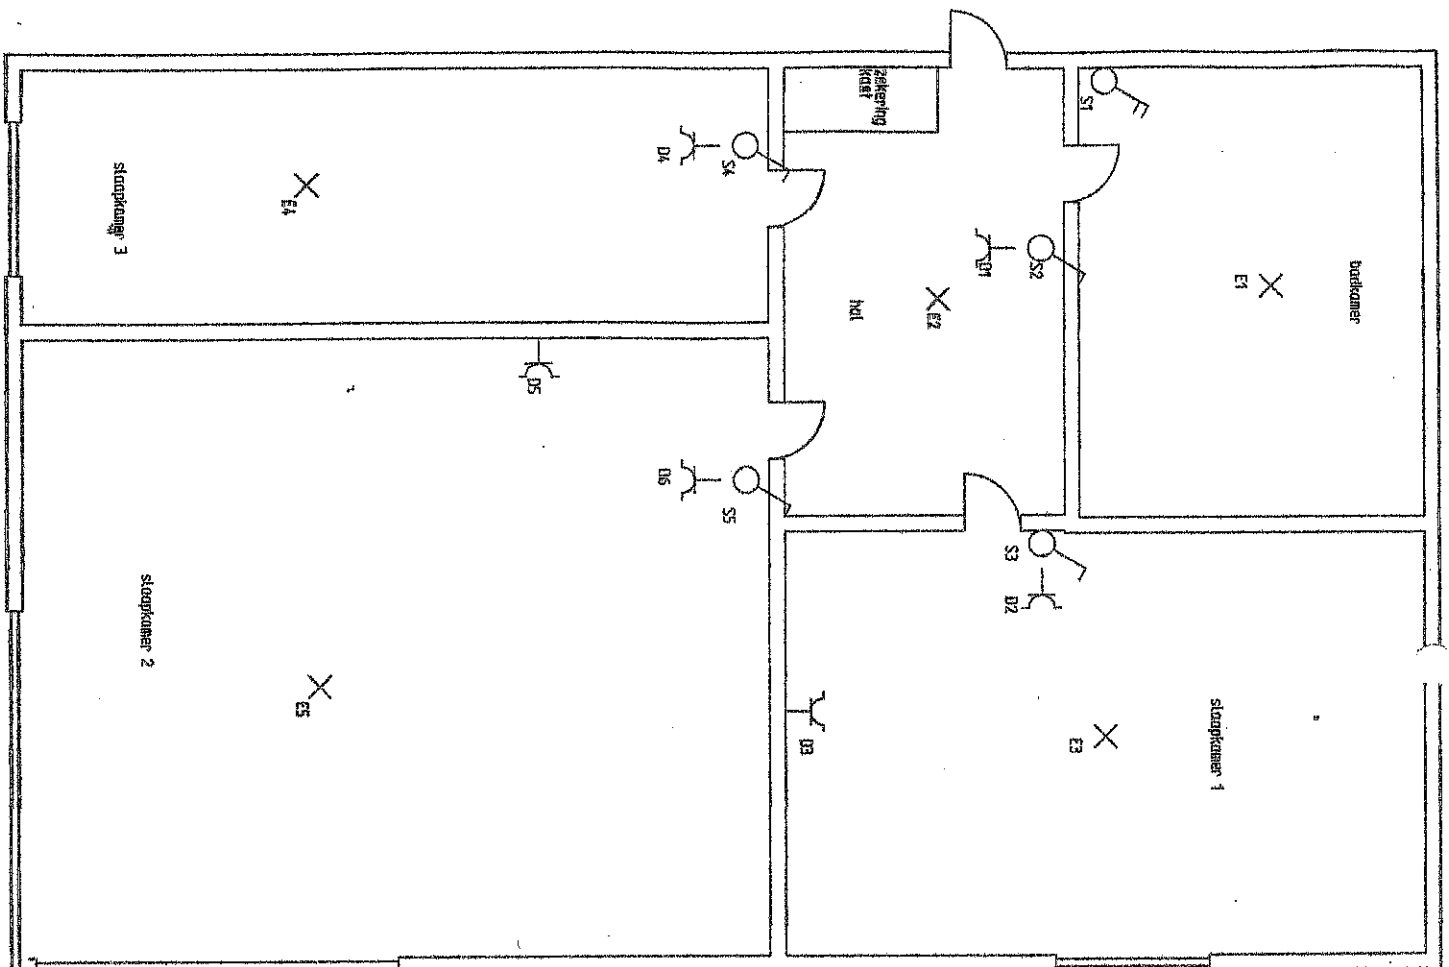

AKCAOGLU Ayila
 GSM: 0493/2461132
 ayila.akcaoglu@cwv.be

Toepassingsgebied				Funct. afwijking		Opmerkingen		Scheut		Scheut	
								Project: Mit Wilrijk			
								Titel			
								Situatieschema appartement 1			
								Tekeningnummer			
								1			
										Vrij	
										1	
										al	
