




TOUS TRAVAUX DE BÂTIMENTS

Rénovation - Transformation - Plafonnage - Carrelage...

SOTRABA sa
A l'att de Mme SMET
Chaussée de Nivelles, 13

7181 ARQUENNES

28 AVR. 2005

Liège, le 27 avril 2005


Chantier : rue de l'Eglise, 11 à Linkebeek

Concerne : réception de l'installation électrique

Madame Smet,

Suite à la visite d'un agent de contrôle de l'installation électrique du bâtiment repris sous rubrique, veuillez trouver en annexe à la présente la réception agréée, le schéma unifilaire ainsi que l'implantation de l'installation.

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de recevoir, Madame Smet, nos sincères salutations.



Pour la sa LIGHT CONFORT,
Salvatore DI PRIMA,
Administrateur délégué

Annexes : 5

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Château de l'Esplanade
PROPRIÉTAIRE: SNE (J. H. B. A.)
Adresse:
DEMANDEUR: Life HT contact
Adresse: 227 rue de l'Esplanade 4000 Liège
INSTALLATEUR:
Adresse:
TVA ou CI:

DISTRIBUTEUR: Electrol Compteur n°: Index: 2

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: 60161 - Mesureur d'isolement n° SGS: 60119 - Mesureur de continuité n° SGS: 60119
Schéma liaison à la terre: TT-SIN-TT
Date du contrôle: 27/11/15
Installation: Domestique (RGIE art. 86) TEC EE 102 - 112 - 122 - 902
Industrielle (RGIE art. 87/86 - 88) TEC EE 201 - 202 - 902
Y a-t-il nécessité de zoner? Non (TEC EE 511-512)

Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
~~visite de contrôle périodique (RGIE art. 271) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)~~
Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier
Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation
résidentielle

Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui - Non
Raccordement: Tension: 230V V AC-DC; Protection raccordement: Existante: A - Prévue: A
Le alimentation tableau principal: x mm², type: enb; Inter. général différentiel A, type: A
Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
Nombre de tableaux:; Nombre de circuits term.: 20; $R_a = 7,0 \Omega$; $R_i \text{ tot} = 0,5 M\Omega$

DESCRIPTION: ☒ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	ΔI_n (mA)
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

- Les DPCDR installés sont adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Oui - Non.
- Les protections installées contre les surintensités sont adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Oui - Non.
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.

INFRACTIONS CONSTATEES - REMARQUES - NOTES:

.....

.....

.....

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.
L'installation est conforme sous réserve de ☒ (voir verso). Le DPCDR général est est plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux-trois personnes intéressées.
L'installation n'est pas conforme. Le DPCDR était plombé.
L'installation doit être vérifiée avant le 27/11/15 (Art. 271 RGIE) ainsi qu'après toute modification ou extension importante.
L'installation peut être mise en service.
L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées.
L'installation ne peut pas être mise - maintenue en service.

L'AGENT VISITEUR
N° + nom + signature


NOM - FONCTION/QUALITE:
Vu agent à la date ci-dessus

VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE:

Feuillet n° **110205**

BLEE10.07F-12/11/03

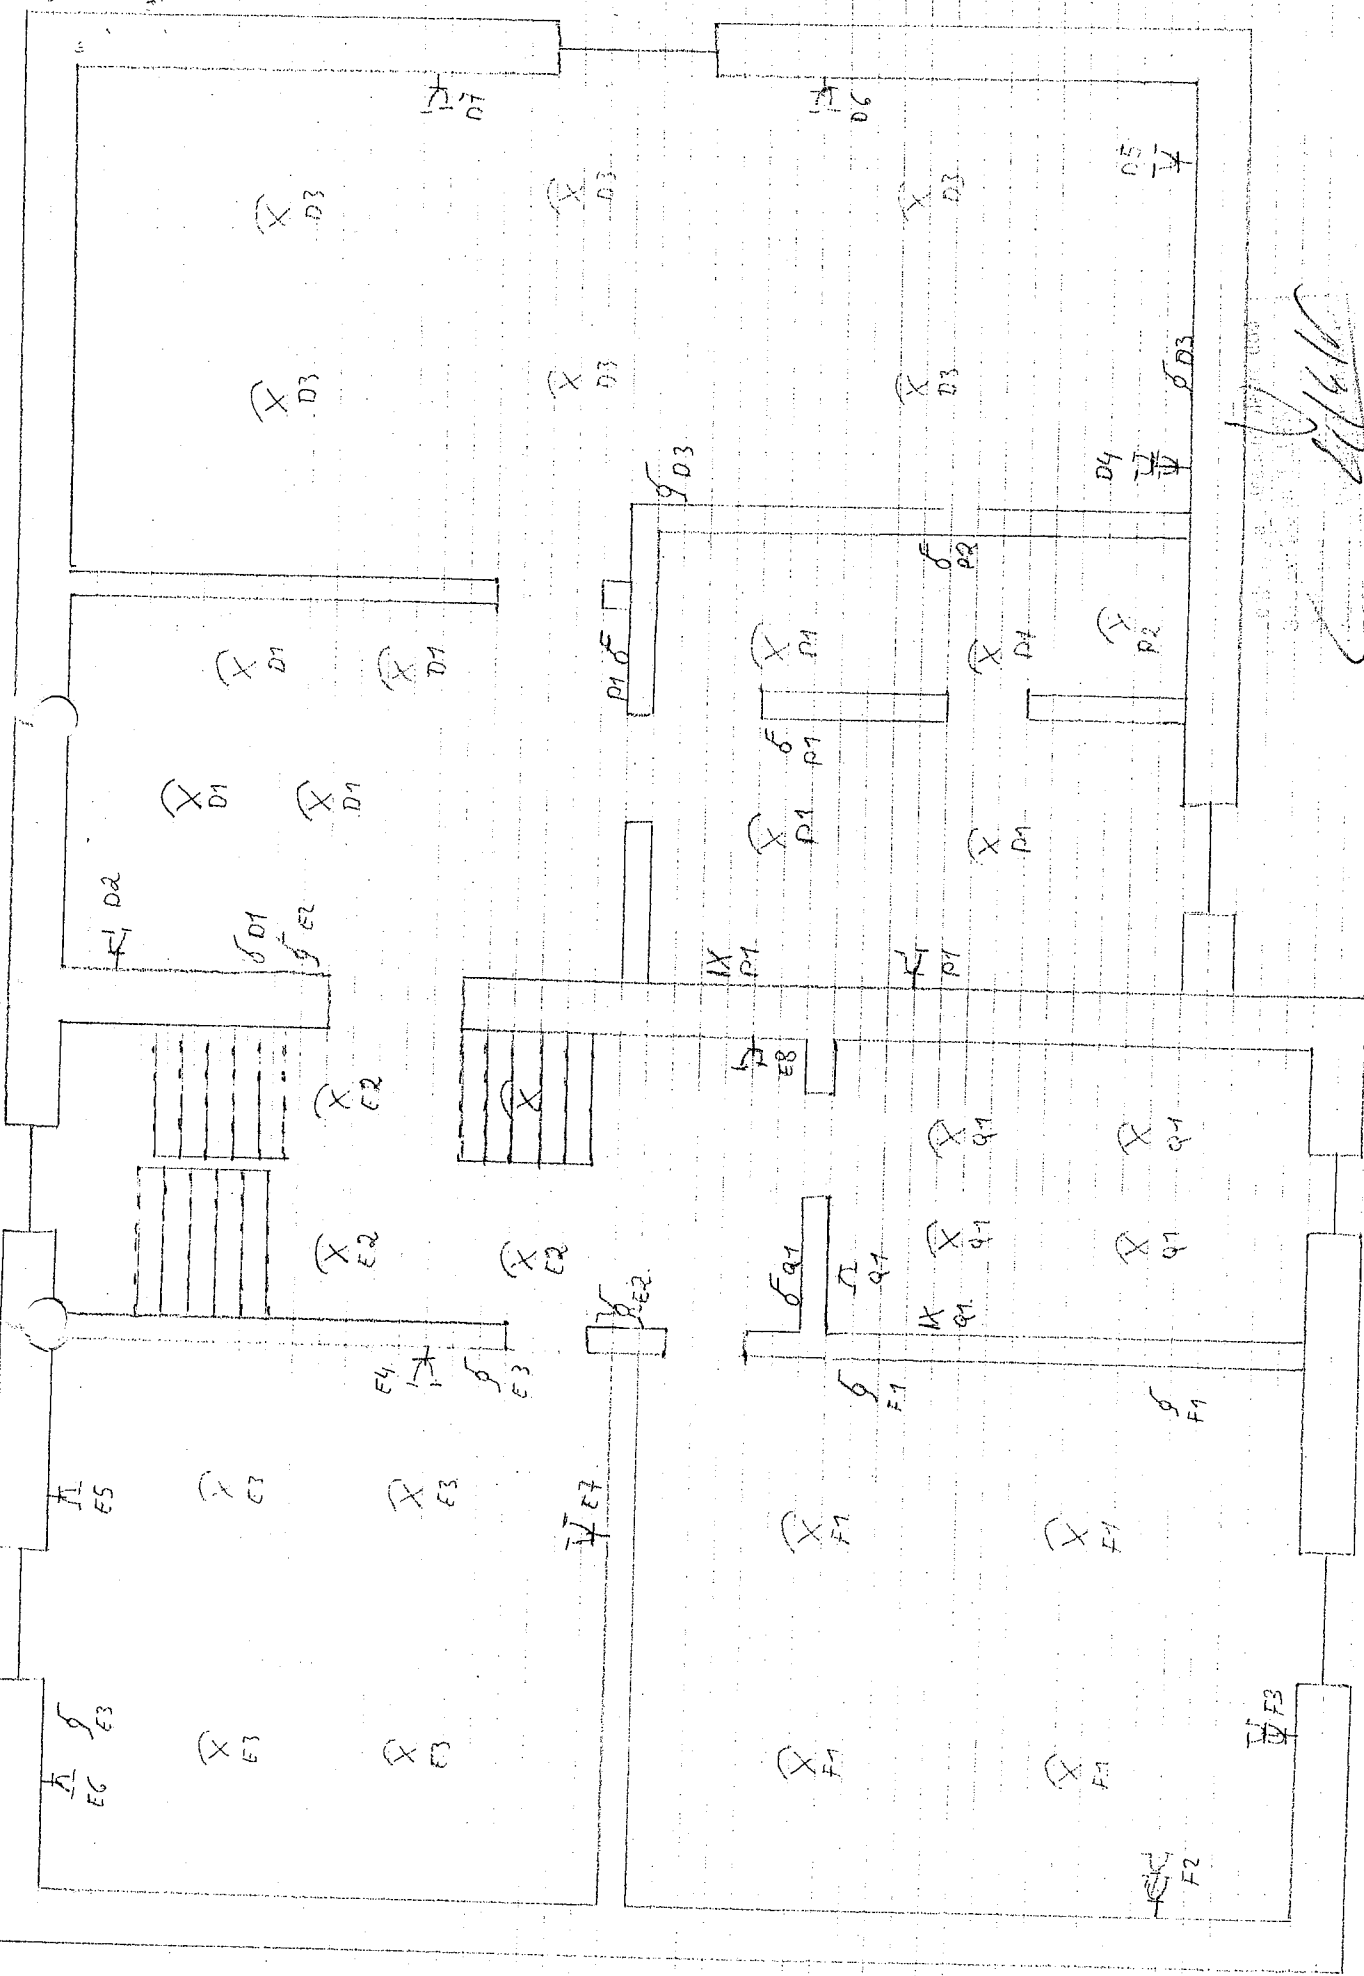


SOTRADA S.A (Chantier LINKERECK)

S.A LIGHT CONFORT 227 rue de l'Esperance


4000 Liege

2ème ETAGE


XVB 3G 2,5 mm²




XVB 3G 2,5 mm²




XVB 3G 2,5 mm²




XVB 3G 2,5 mm²




XVB 3G 2,5 mm²




XVB 3G 2,5 mm²



XVB 3G 2,5 mm²



XVB 3G 2,5 mm²



XVB 3G 2,5 mm²

XVB 3G 2,5 mm²

XVB 3G 2,5 mm²

3x230V

Δ 300 mA

40 A

Δ 30 mA

40 A
