



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/02/2023

Inspecteur: Bruno Castelli

Mentor:

Installateur: NV Home

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251302

Datum verslag: 24/02/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Reeweg
Huisnummer 63
Busnummer
Postcode 3600
Gemeente Genk
Land België

Eigenaar

Naam NV Home
Straatnaam Reeweg
Huisnummer 63
Busnummer
Postcode 3600
Gemeente Genk
Land België

Installateur

Naam A+ Energie BV
BTW nr. BE 0760 409 031
Telefoonnummer +32 473 51 66 84
E-mail koen@aplusenergie.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541449206007209054

Teller Nr.: : 8721300



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A



Aantal kringen: 25

Ri algemeen: 2,72 MΩ

RE: 2,52 Ω

OK

OK

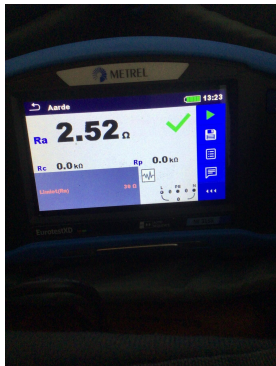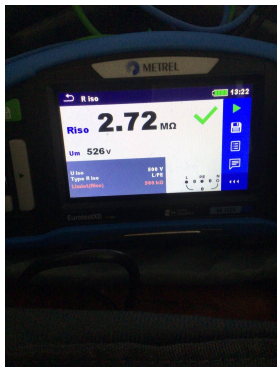

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Id (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	-	25	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	-	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	U	25		4	4
1	C	25		4	4
1	C	16		4	1,5
1	C	20		2	2,5
13	U	20		2	2,5
3	U	16		2	2,5
6	U	16		2	1,5
1	U	10		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 24/2/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bruno Castelli


Bruno Castelli - ACEG #93

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/2/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

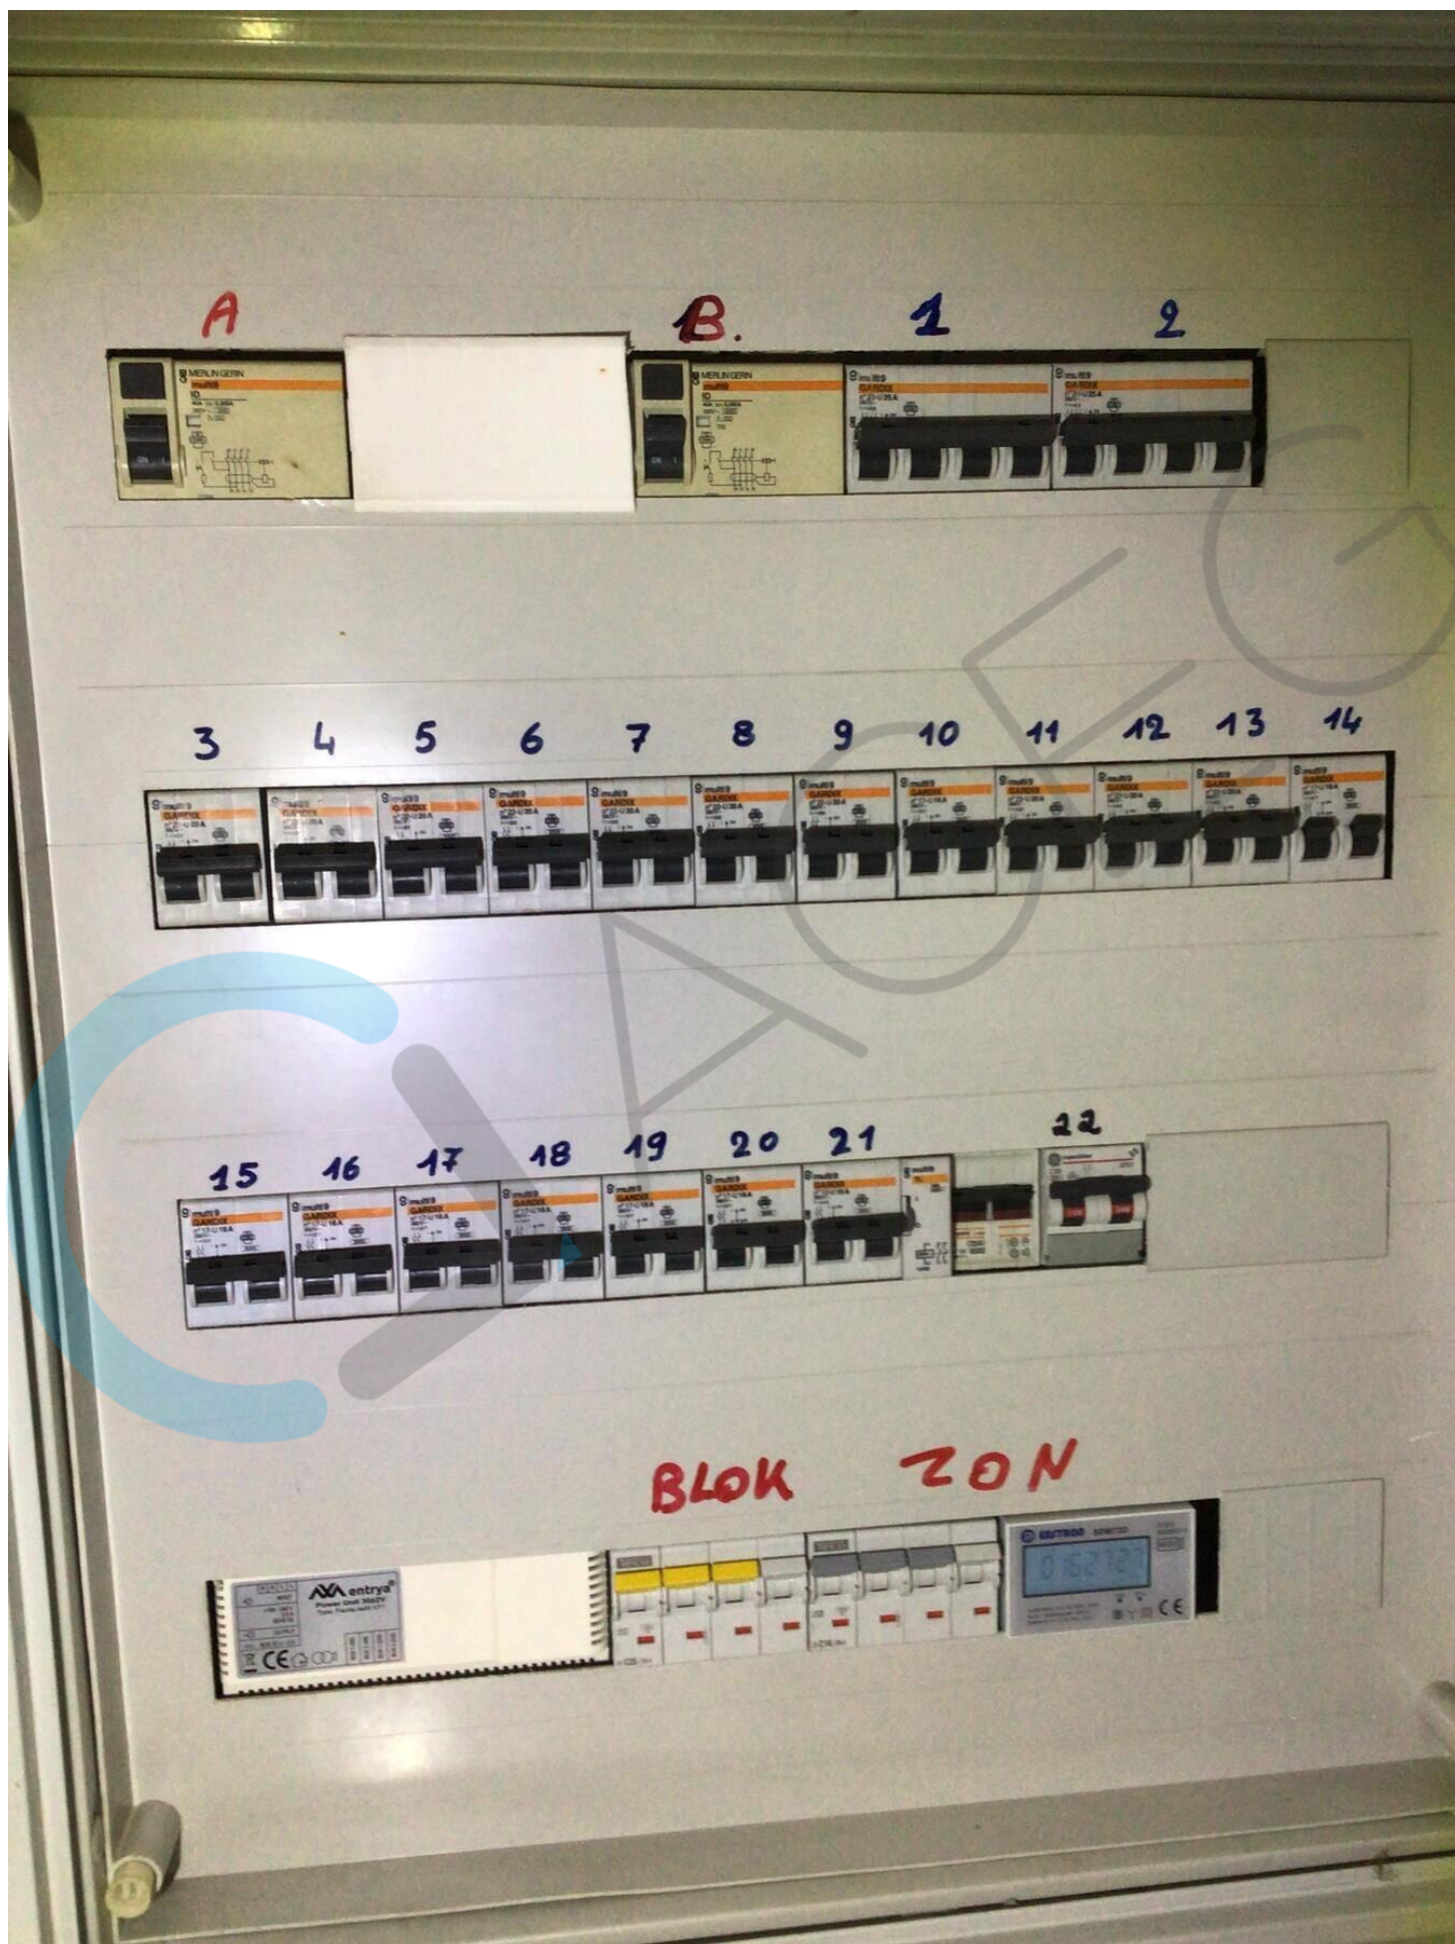

Herbewing
Zonnepanelen
2045

LEGENDE HOOFDBORD ELEKTRA

- A.

Algemene hoofdaardbeveiliging

1

Bord elektra keuken

2

Bord elektra garage

4

Stopcontacten living

5

Stopcontacten hal & bureel

6

Stopcontacten living

11

Stopcontacten slaapkamer & hal

13

Stopcontacten slaapkamer

14

Verlichting wasplaats, keuken & buiten

15

Verlichting living, hal

16

Verlichting wc, hal + *geschakelde stipe living.*

18

Reserve

21

Parlofoon

22

AUTOMATISCHE BUITENVERLICHTING
- B.

Aardbeveiliging groep B

3

Stopcontacten badkamer

7

Stopcontacten wasplaats, kelder

8

Stopcontact droogkast

9

Stopcontact wasmachine

10

Bad

12

Stopcontacten slaapkamer & badkamer

17

Verlichting slaapkamer, badkamer, wc & zolder

19


Verlichting slaapkamer, badkamer & dressing


20


C.V. installatie

22

Wasmachine, Droogkast.

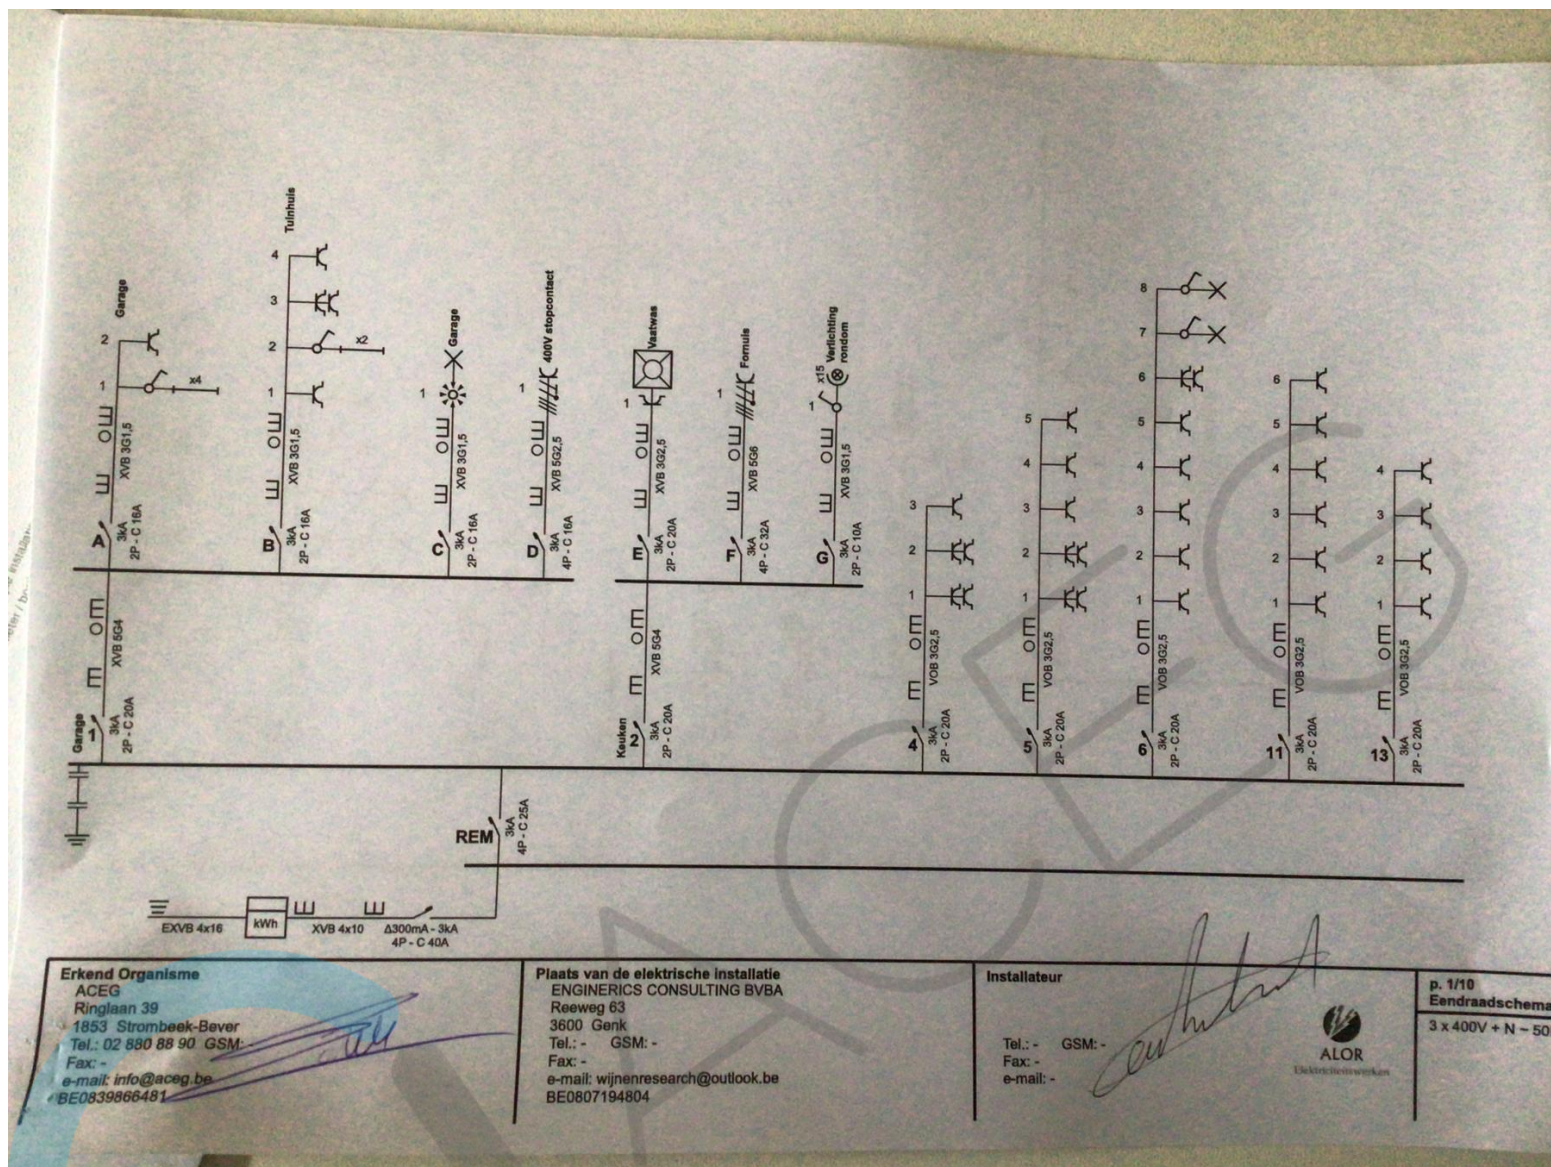



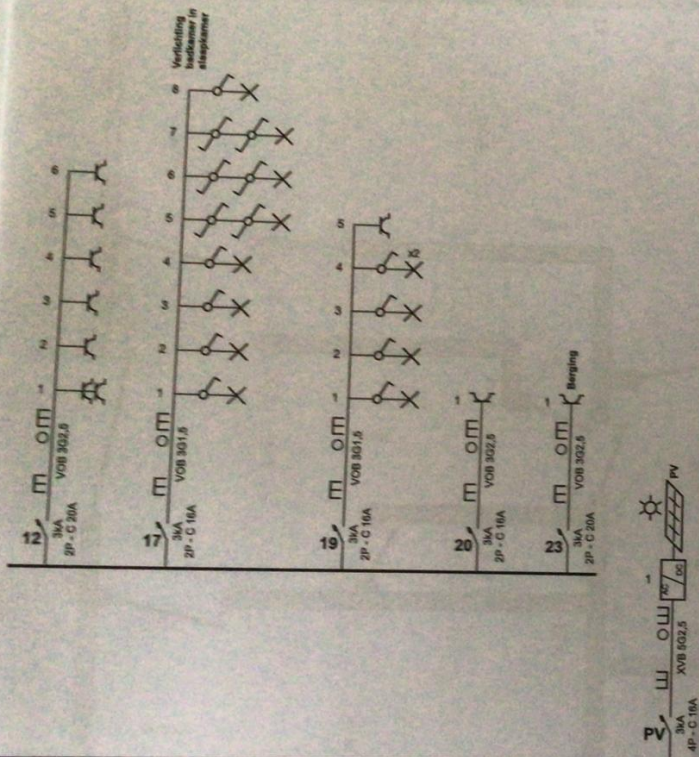

Erkend Organisme

ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@acsp.be
BE0839866481


Plaats van de elektrische installatie
ENGINEERICS CONSULTING BVBA
Reeweg 63
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: wijnenresearch@outlook.be
BE0807194804


Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 3/10
Eendraadschema
3 x 400V + N - 50Hz

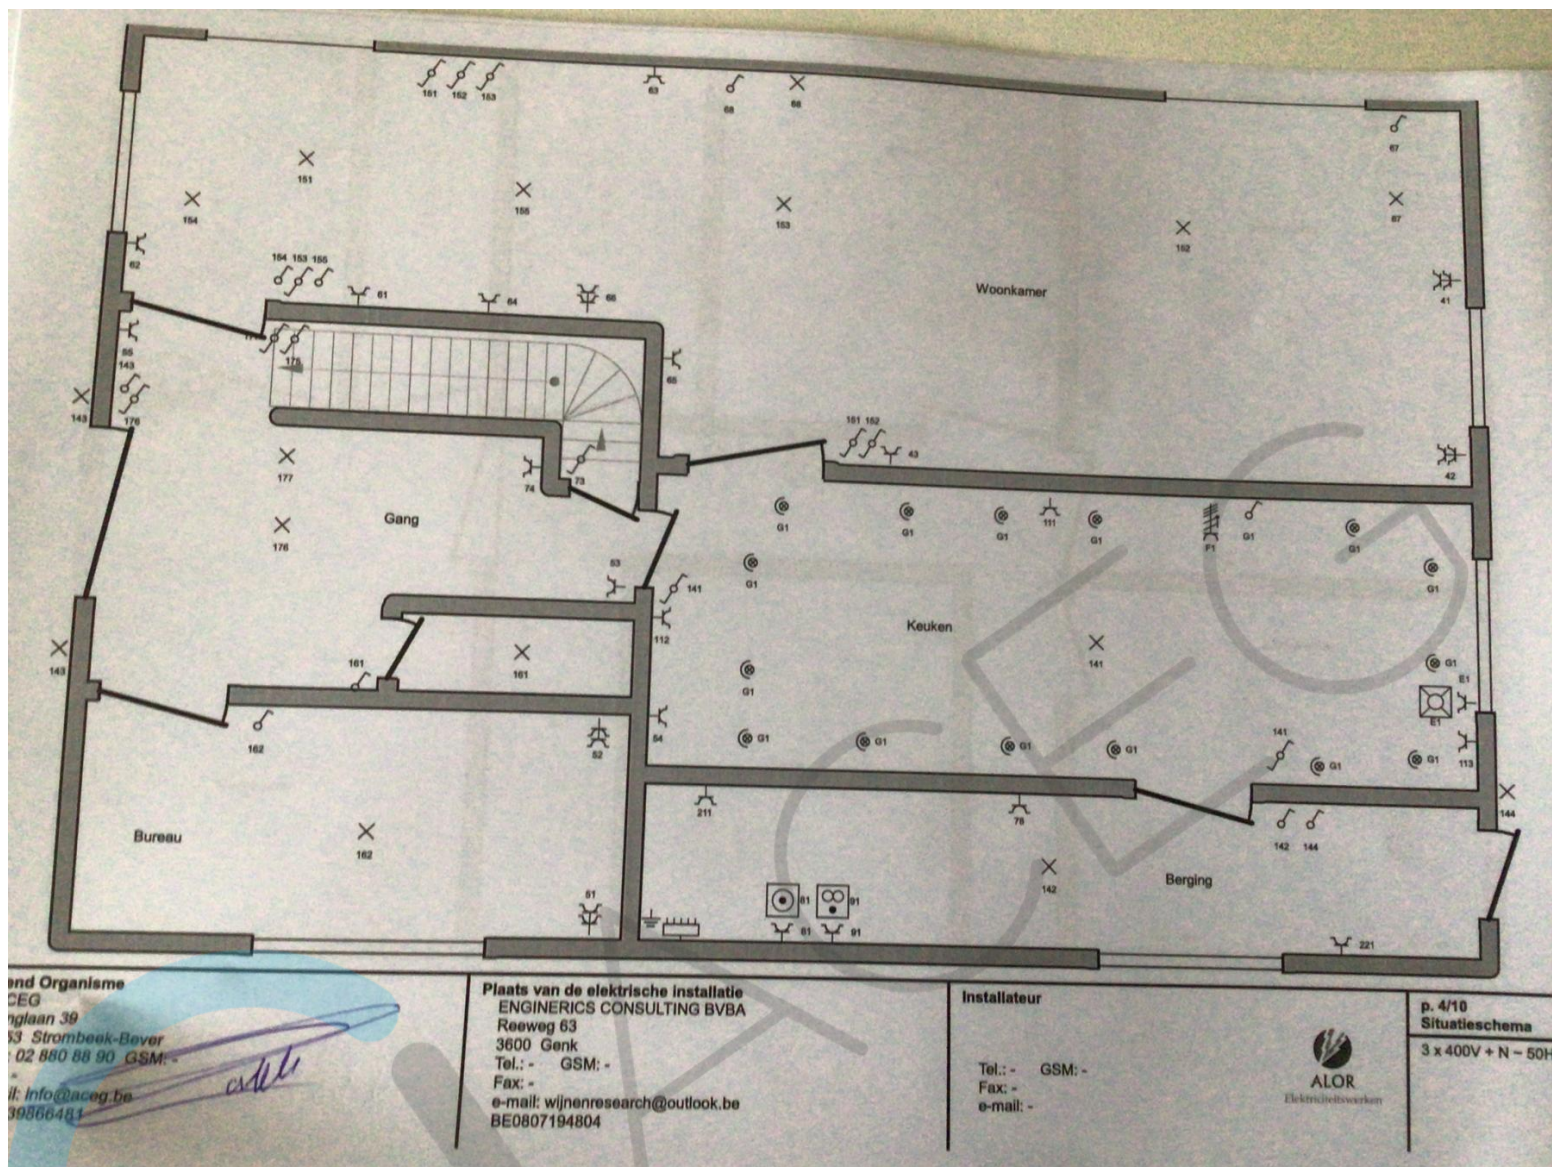

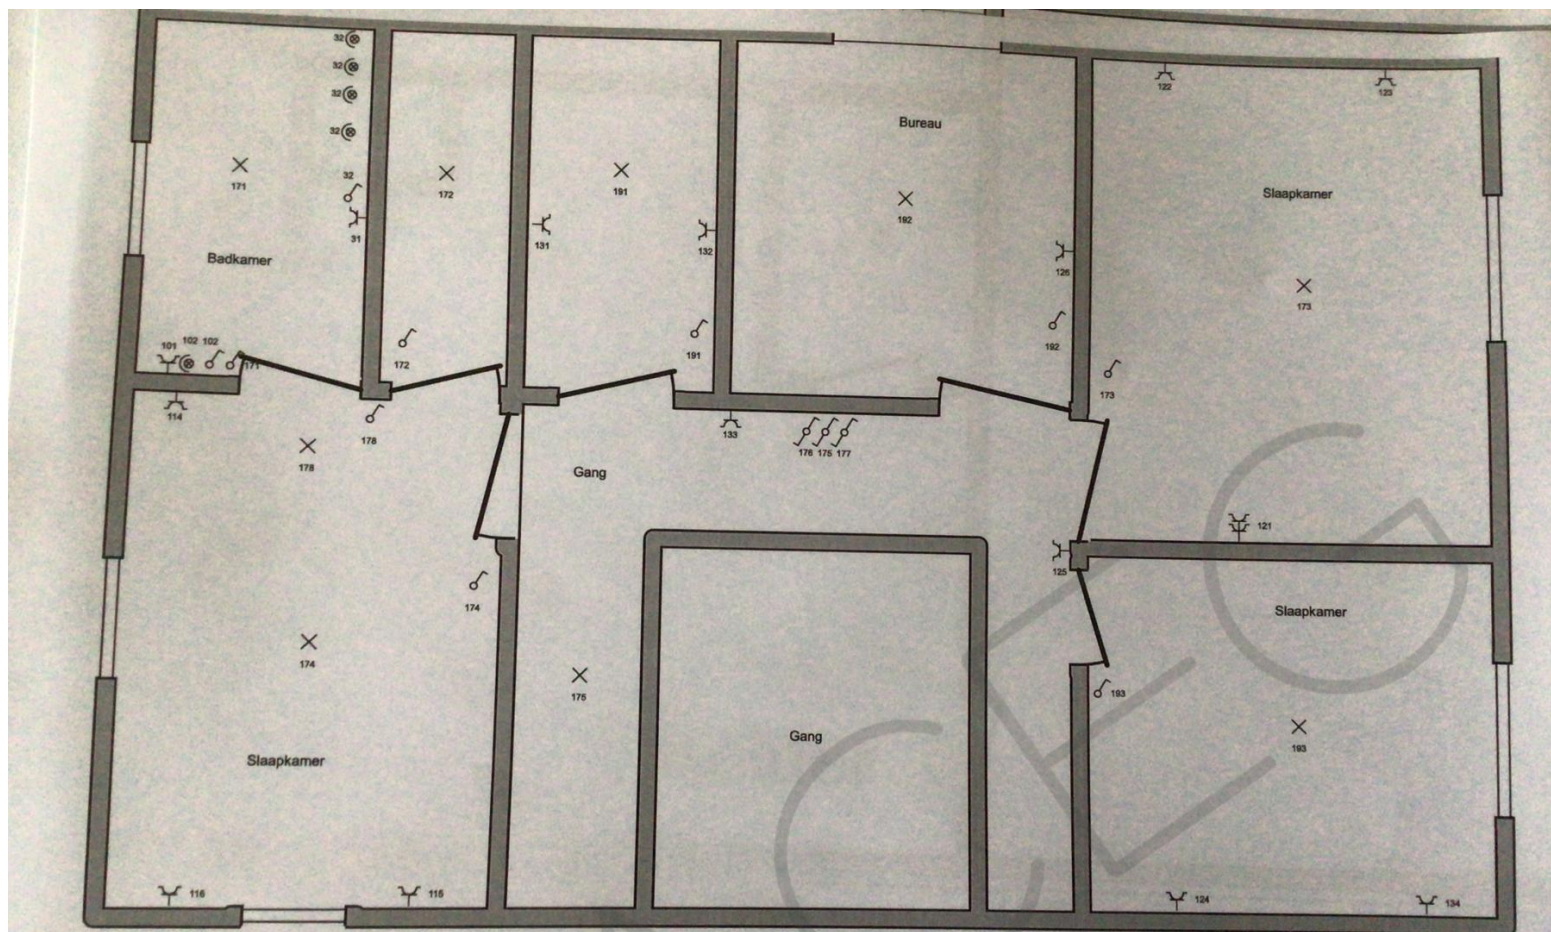

Erkend Organisme
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90 GSM: -
Fax: -
e-mail: info@aceg.be
BE0839866481

Plaats van de elektrische installatie
ENGINEERICS CONSULTING BVBA
Reeuweg 63
3600 Genk
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: wijnenresearch@outlook.be
BE0807194804

Installateur
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -



p. 5/10
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

