

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDL

Nr teller :

N° comp :

22 17813

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *16015012321*

EAN code *594488600763898*

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Quok Vert 184 Dendermonde

Eigenaar

Propriétaire :

Bo Cranzvelt steenweg op Blerasveld 56 Helle

Installateur :

BIBA Buels R

BTW / TVA *0432746791*

Datum van het onderzoek :

23.01.2015

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

23.01.2015

Inspecteur : *Vandenberghe*

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Appart

D4.030 bus 21

Spanning : *230V*

Meter / bord verbinding :

4x10mm²

Max. beveiliging :

40A

Tension :

230V

Liaison compteur-tableau :

4x10mm²

Aardelektrode :

4m

Isolatie :

6,6 Mohm

Aantal verdeelborden :

1

Electrode de terre :

0,7 Ohm

Isolement :

6,6 Mohm

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40 1/2</i>	<i>300 A</i>	<i>Algemeen B → R</i>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40 1/2</i>	<i>30 A</i>	<i>Boor O → R</i>			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐ direkte aanraking : OK ☒ NOK ☐

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements : OK ☒ NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles : OK ☒ NOK ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :



ELECTRO-TEST
Marc VANDER AAR
Nieuwstraat 18
Gen +32 475 68 34 94

Green

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~— in dienst blijven —~~.
L'installation est ~~non~~ conforme au RGIE et peut ~~ne pas~~ temporairement être mise en service ~~— rester en service —~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *23.01.2016*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /
276 AK		276 HK		 /
☐		☐		 /

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieelschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingsstus aanwezig.
5. De aardgeleider heeft een onvoldoende sectie (min. 16 mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm

D. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...
6. Teste Aln : N.O.K.
7. Teste 2,5 Aln : N.O.K.

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtsreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering.
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel.
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen
2. Directe aanraking mogelijk
3. Indirecte aanraking mogelijk

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eëndraadschema niet aanwezig
2. Situatieschema niet aanwezig

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre)
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm²Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²)
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...
6. Teste Aln : P.O.K.
7. Teste 2,5 Aln : P.O.K.

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur, ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conducteur de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible

H. APPAREILS


1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
5. Contact direct possible

I. CONTRÔLE VISUEL

1. Remarques générales
2. Contact direct possible
3. Contact indirect possible

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.

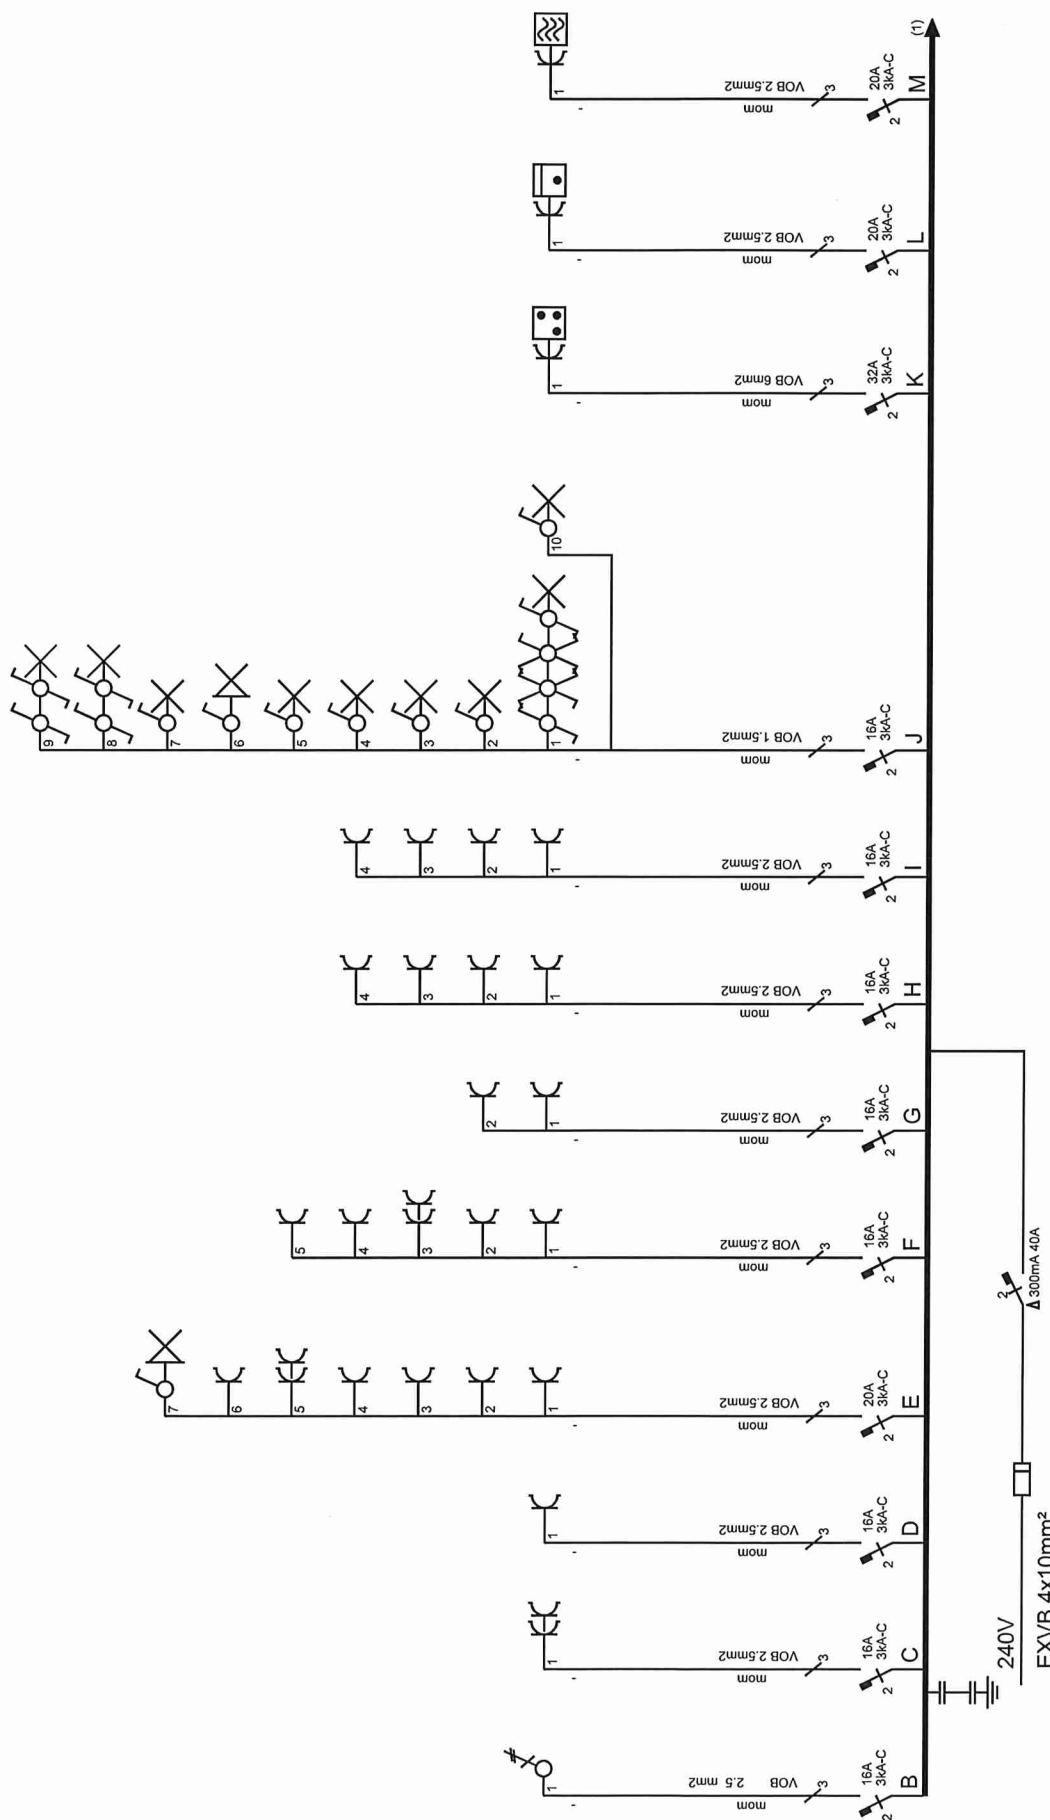

Afgev. erkend organisme



Appartement D4.03
Oude Vest 184 bus 21
Dendermonde


datum: 20/01/2015

Verantw. uitvoering
B.V.B.A. BUDTS RAFELEK

Elektricitit - Sani
Wildersedreef 29
1910 KAMPENHOUT
016/65.73.33

Wildersedreef 29
1910 Kampenhout
tel: 016/65 73 33 fax: 016/65 12 86
Ondernemersnr:
BE0432.746.791

Electriciteit & Sanitair
BUDTS RAFELEK

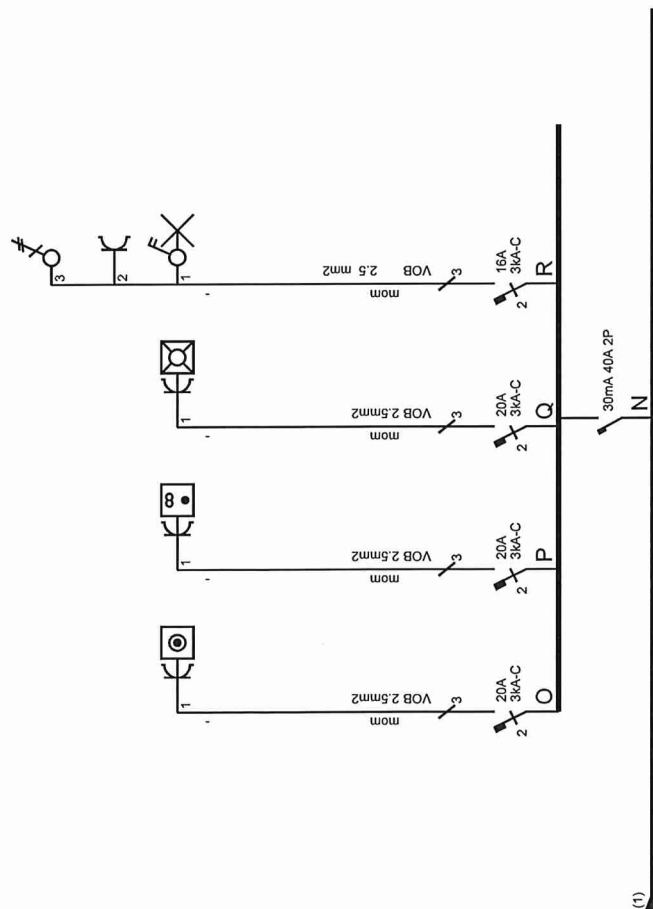

Afgev. erkend organisme



ELECTRO-TIT
Attestat
Gsm 432 472 1234

Appartement D4.03
Oude Vest 184 bus 21
Dendermonde

datum: 20/01/2015

Verantw. uitvoering
B.V.B.A. BUDTS RAFELEK

Electriciteit - Sani
Wildersedreef 29
1910 KAMPENHOUT
016/65.73.33


**Electriciteit
&
Sanitair**

BUDTS RAFELEK

Wildersedreef 29
1910 Kampenhout

tel: 016/65 73 33 fax: 016/65 12 86

Ondernemersnr:
BE0432.746.791

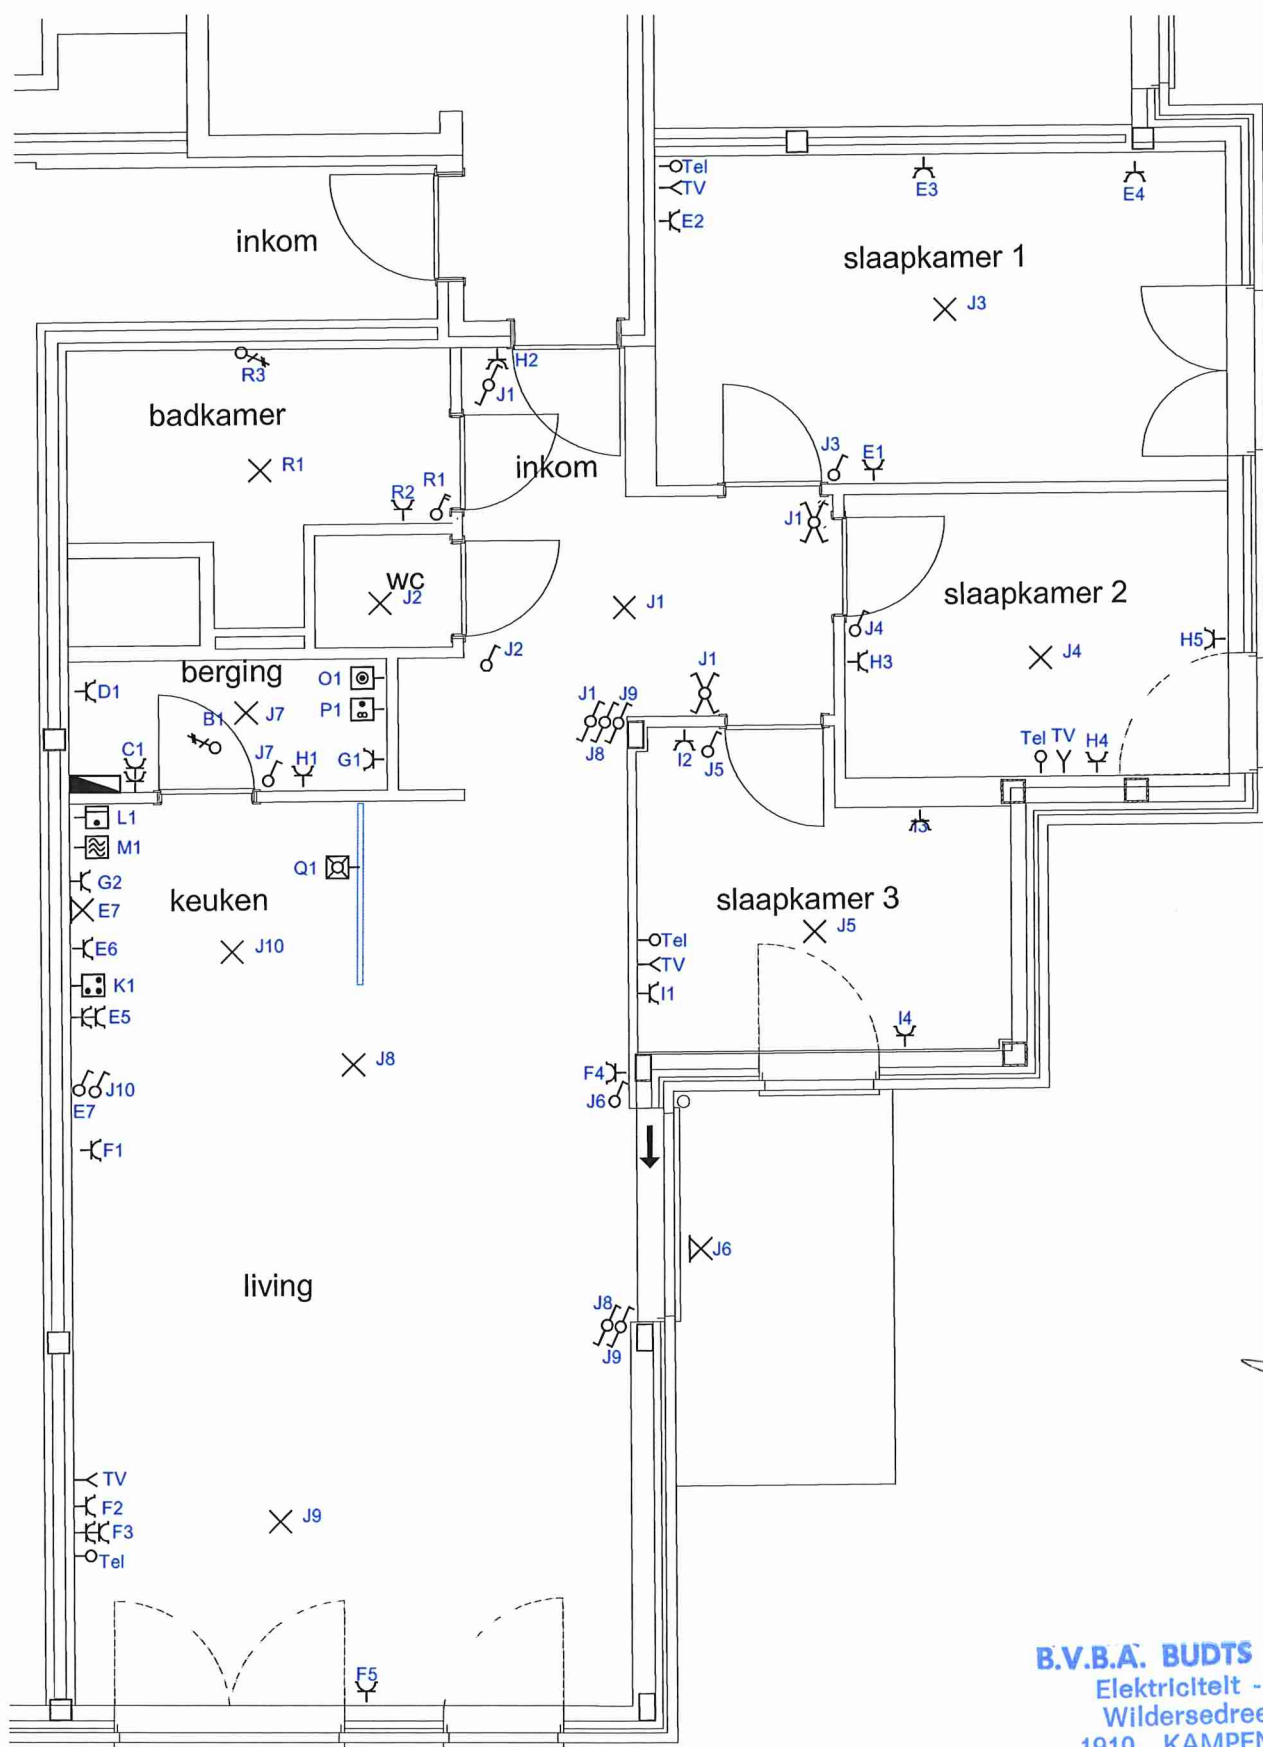

D4.03



B.V.B.A. BUDTS RAFELEK
 Electriciteit - Sanitair
 Wildersedreef 29
 1910 KAMPENHOUT
 ☎ 016/65.73.33

Appartement D4.03 Oude Vest 184 bus 21 Dendermonde datum:20/01/2015	 Electriciteit & Sanitair BUDTS RAFELEK	Wildersedreef 29 1910 Kampenhout tel: 016/65 73 33 fax: 016/65 12 86 Ondernemersnr: BE0432.746.791
--	---	--
