

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

37.866

Date du contrôle:

07/02/2024

Lieu du contrôle:

Kamstraat 52 1602 Sint Pieters Leeuw Belgique Visite périodique (Livre 1 6.5)

Agent-visiteur:

Younes Al Kabir

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

V1 07/02/2024 11:15:18

Prochaine visite avant le:

07/02/2049

Testeur d'installation:

Donneur d'ordre

Nom

Bell'Immo Invest

Adresse

Avenue Louise 143/4, 1050 Ixelles, Belgique

Email

biagio_bellante@hotmail.com

Base(s) règlementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Kamstraat 52 1602 Sint Pieters Leeuw Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Bell'Immo Invest

Adresse du propriétaire

Kamstraat 52 1602 Sint Pieters Leeuw Belgique

Installateur

Bell'Immo Invest

BE0539996723

Données du raccordement

GRD

Fluvius

Numéro de compteur

1SAG3105132905

Code EAN

EAN541448820053938211

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

3 x 400 V + N

Protection générale

40 A 4P

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Zie schema		
Nombre de tableaux		1	
Différentiel de tête		300mA - 40A - type A	
Test BP du DDR		OK	
ΔI_n		OK	
Contrôle de l'état		OK	
Matériel fixe		OK	
Protection contre les contacts directs		OK	
Protection contre les contacts indirects		OK	
Protection contre les surintensités		OK	
Prise de terre		Piquet	
Résistance de terre (Ω)		4	
Isolement ($M\Omega$)		0,6	

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

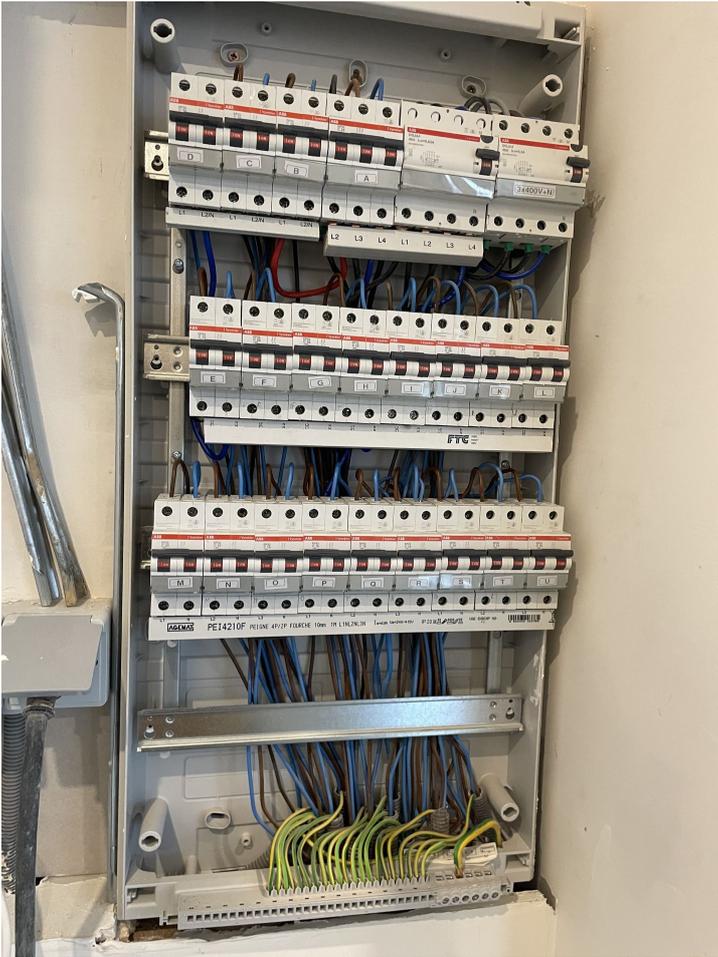


Tableau 1

Liste des remarques

Libellé	Référence
L'éclairage n'est pas encore installé définitivement.	RDE7
La salle de bains n'est pas encore terminée : baignoire et/ou douche ne sont pas encore installées. Les volumes dans la salle de bains ou la salle de douches doivent être pris en compte lors du placement final de la baignoire et/ou la douche.	RDE8

Libellé	Photo
---------	-------
