

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Rapport de visite: contrôle d'une installation de recharge VE

Numéro de rapport: 1.492	Date du contrôle: 09/01/2024	Date d'émission: 09/01/2024 20:54:24
Lieu du contrôle: TEM'CONNECT Priorijlaan 4 1600 Sint-Pieters- Leeuw Belgique	Agent-Visiteur: Michael Di Martino	Prochain contrôle avant le: 09/01/2049
Type de contrôle: Mise en service (Livre 1 6.4)		

Conclusion: Conforme

Donneur d'ordre

Nom	TEM'CONNECT
Adresse	Priorijlaan 4, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Belgique
Email	temconnectsrl@gmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation	TEM'CONNECT Priorijlaan 4 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgique
Type de locaux	
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	TEM'CONNECT
Adresse du propriétaire	TEM'CONNECT Priorijlaan 4 1600 Sint-Pieters-Leeuw Belgique
Installateur	
Donneur d'ordre	TEM'CONNECT
Email	temconnectsrl@gmail.com

Caractéristiques techniques générales

Source d'alimentation	GRD
GRD	Fluvius
Numéro de compteur	1SAG1100059904
EAN	541448860019524942
Schéma de mise à la terre	TT
Prise de terre	Boucle
Tension de service	2X230
Protection Max.	40A
Description de l'installation	

Installation de recharge VE

Date d'installation Après 1/11/2022

Constructeur	Modèle	Pn (kW)	Prot. Diff.	Prot. (A)	Prot. DC 6mA	Numéro de série
TESLA	TESLA WALL CONNECTOR C_33AC3 7.4KW	7.4KW	30mA Type A	32	Oui	PGT23103001273

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Mesures et essais

Résistance de terre (Ω)	7
Isolement	5,73
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK
Schémas	OK

Conclusion

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.


Annexes

Atlas Controle

02 726 64 04
office@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be



[Handwritten signature]

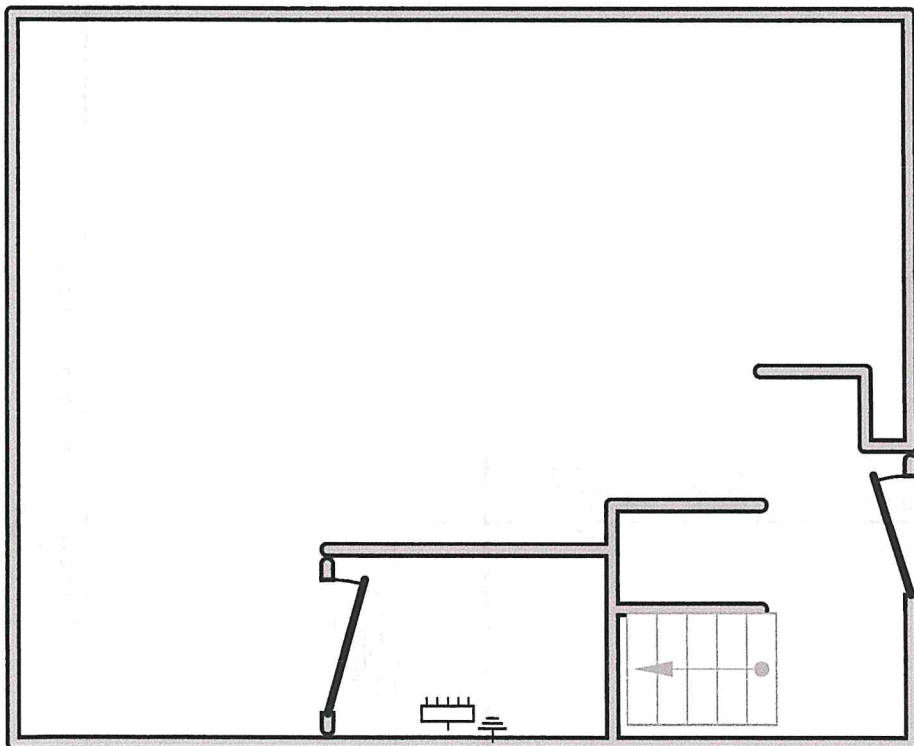

Marque: TESLA
Model: TESLAWALLCONNECTOR E3EA95
SN: PGT23103001273
MAX P: 7,4Kw

Organisme agréé
Atlas Contrôle asbl
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476


Adresse de l'installation électrique
TEM'CONNECT
Priorijlaan 4
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0786398202
EAN 541448860019524942

Installateur

p. 2/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

[Handwritten signature]

Marque: TESLA
 Model: TESLAWALLCONNECTOR E3EA95
 SN: PG723103001273
 MAX P: 7,4Kw

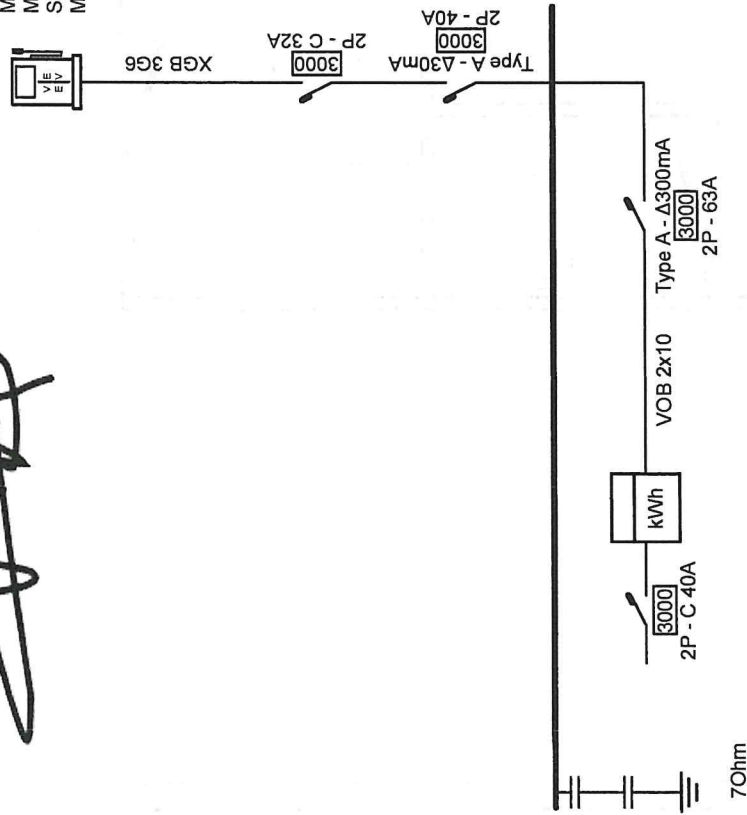


Organisme agréé
 Atlas Controle asbl
 Rue Eugène Smits 58
 1030 Scharbeek
 Tél.: 02 726 64 04
 e-mail: info@atlascontrole.be
 BE 0732.536.476

Adresse de l'installation électrique
 TEM'CONNECT
 Priorijlaan 4
 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 0786398202
 EAN 541448860019524942

Installateur



p. 1/3
 Schéma unifilaire
 2 x 230V ~ 50Hz

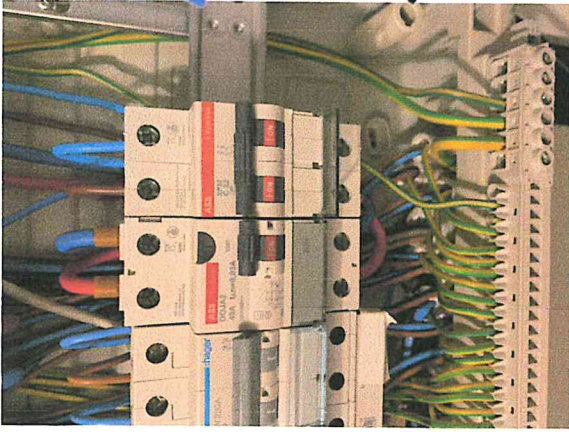

Atlas Controle
02/726 64 04
office@atlascontrole.be
www.atlascontrole.be



[Handwritten signature]

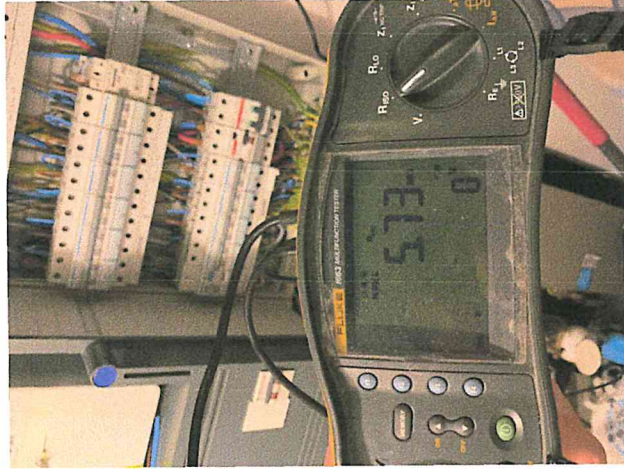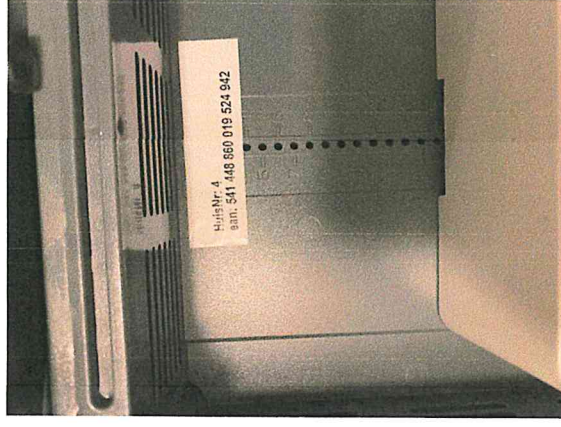

Organisme agréé
Atlas Contrôle asbl
Rue Eugène Smits 58
1030 Scharbeek
Tél.: 02 726 64 04
e-mail: info@atlascontrole.be
BE 0732.536.476

Adresse de l'installation électrique
TEM'CONNECT
Priorijlaan 4
1600 Sint-Pieters-Leeuw
0786398202
EAN 54144860019524942

Installateur

p. 3/3
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

511802447

Ref: 2019122802

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRIJFNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Priorijlaan 4 Lot 24 , 1600 SINT-PIETERS-LEEUV						
Eigendom van:	Tempesta						
Opdrachtgever:	Advenso Ludovic Vigneron,Gistelsteenweg 475, 8490 JABBEKE						
Type lokalen:	Woning	DNB:	Fluvius	Tarief:	Slimme meter		
EAN-code installatie:	541 448860019524942	Nr. teller:	1SAG1100059904	Index:	5//6//23//10	kWh	
Installateur:	Advenso, Aatrijksesteenweg 9, 8490 JABBEKE						
BTW-nr.:	BE 0887 165 661	Of ID-kaartnr:	/	Uitgereikt te:	/	op /	
Agent-bezoeker:	Gert Vos			Datum onderzoek: 15/01/2020			

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 270 Wijziging / Uitbreiding
Bijkomende info:	PV-installatie
Herkeuring op:	/
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1 x 230V	Max nominale stroom:	63 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2X10 mm ²	Type:	VOB		
Aardelektrode:	Aardlus			Sectie:	35 mm ²
				Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	63 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	63 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	1	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	2,63 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	1,10 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL	Situatieschema's: Nee	DE AGENT BEZOEKER: 	Visum van de verdeler:
LIJLAGEN	Eendraadsschema's: Schema PV		
	Plan uitwendige invloeden: NVT		
	Andere: /		

Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

Geïnstalleerde panelen:

- Type: JKM315M-60B-FULL BLACK
- Aantal: 8
- Vermogen (Wp): 315Wp
- Totaal vermogen (Wp): 2520Wp

Omvormer:

- Type: GROWATT 1500-S
- Aantal: 1
- Serienummer(s): QMB3923002
- Maximaal AC-vermogen (P AC MAX) (VA): 1650VA

AC-koppeling via: RAILAUTOMAAT 20A/2P

Remautomaat: GEEN

Productieteller:GEEN

- Merk: /
- Serienummer: /
- Index: /

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A : Geen inbreuken.
- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD1 : Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- AM : Bij uitvoering van de keuring werden inbreuken vastgesteld in het bestaande deel van de elektrische installatie (welke geen deel uitmaakt van huidige controle). Het is aangeraden om de volledige installatie te onderwerpen aan een technische controle.
- E : Deze controle omvat enkel de fotovoltaïsche installatie.
- E1 : Niet alle administratieve gegevens konden geverifieerd worden (vb. merk en type panelen en/of serienummers micro-omvormers en/of...). De huidige controle werd uitgevoerd op basis van de door de klant of installateur verstrekte gegevens.
- E2 : De fotovoltaïsche installatie werd in gebruik genomen; gelieve voor de verdere opvolging, eventuele storingen of alle technische vragen contact op te nemen met de installateur en/of de beheerder van de installatie.
- F : Gebruikshandleiding + CE-certificaat OK.
- G : Equipotentiale verbinding frame OK.
- H : ENS-beveiliging (eilandwerking) OK.
- I1 : Geen groenestroomteller aanwezig in de PV-installatie.
- J : Deze controle omvat enkel de uitbreiding van de installatie.
- U1 : De elektrische schema's waren aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.

Extra opmerkingen :

AM:33 VOLT OVER EEN GEOPENDE AARDINGSONDERBREKER,DIT HEEFT NIETS TE MAKEN MET DE PV INSTALLATIE,AANGERADEN HET PROBLEEM OP TE ZOEKEN EN WEG TE WERKEN

VASTSTELLINGEN: Inbreuken
