

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be

Opdracht: 34651
Klant / Bedrijf: S.O.S Construct
ID Extern:

Verslagnr: 20220011434-V.1

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00038574
Adres: av.Brigitte Piron 143/3, 1080
BRUXELLES
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:
BTW: 0725773202
Uitgiftedatum: 2022-10-26

ORIGINEEL EXEMPLAAR



VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging
Plaats van onderzoek: Elbeekstraat 68, 1500halle,
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 22-10-2022
Inspecteur: Aleksander MICHALOWSKI
Eigenaar: /
Cont.Pers.:
Aard van de uitbreiding/wijziging:

Type lokalen: Huis
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 22-10-2047 of binnen de: 299 maanden
Installateur: S.O.S Construct
B.T.W.: 0725773202
tel.:
Referentie documenten:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Teller: 4291480
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V I max. aansluiting: 40A

Type stroom: Wisselspanning
Merk: CONTIGEA Stand I: 164001.3 Stand II: 079698.6

Meter-bordverbinding: Kabeltype: VFVB

Bescherming van de hoofdaansluiting:
4P40A
Aantal geleiders: 4 Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geiseerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: in orde Foutlus controleren: in orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Aardelektrode: type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Materiële en externe invloedsfactoren: in orde
Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA Verzegeld door een vulling: in orde
Nog niet geplaatst: Installatie en huis nog in aanbouw.,
Aantal borden: 2

Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 0.606
Mohm
Doorsnede: 16 mm² Spreidingswaarde: 11.02 Ohm
Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA
Aantal eindkringen : 30

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: in orde
Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde

Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats:
N.V.T.

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreadingsweerstand: in orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

FASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 () - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>
Opdracht: 34651
Klant / Bedrijf: S.O.S Construct
ID Extern:

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00038574
Adres: av.Brigade Piron 143/3, 1080
BRUXELLES
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Contactpersoon:
BTW: 0725773202
Uitgiftedatum: 2022-10-26



Verslagnr: **20220011434-V.1**

ORIGINEEL EXEMPLAAR

N12() - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13() - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

2. O.S. Construct. spnl TVA 90725773202
W. Breigode Piron 1413/4 *Foglar*
080 BXL

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
010 280 577 - 015 860 460

Inspecteur : Aleksander MICHALOWSKI

Date / datum :

Rapport / verslag :

Signature / handtekening :

INSPECT
BELGIUM

$$\boxed{kWh}$$

Elbeckstraat 68
1500 Halle

S.O.S. Construct. spr
Pl. Brigade Piron 143/4
1080 BXL

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:
Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
010 280 577 - 015 860 460


Inspecteur : Aleksander MICHALOWSKI

Date / datum :

Signature / handtekening :


Rapport / verslag :

INSPECT
BELGIUM

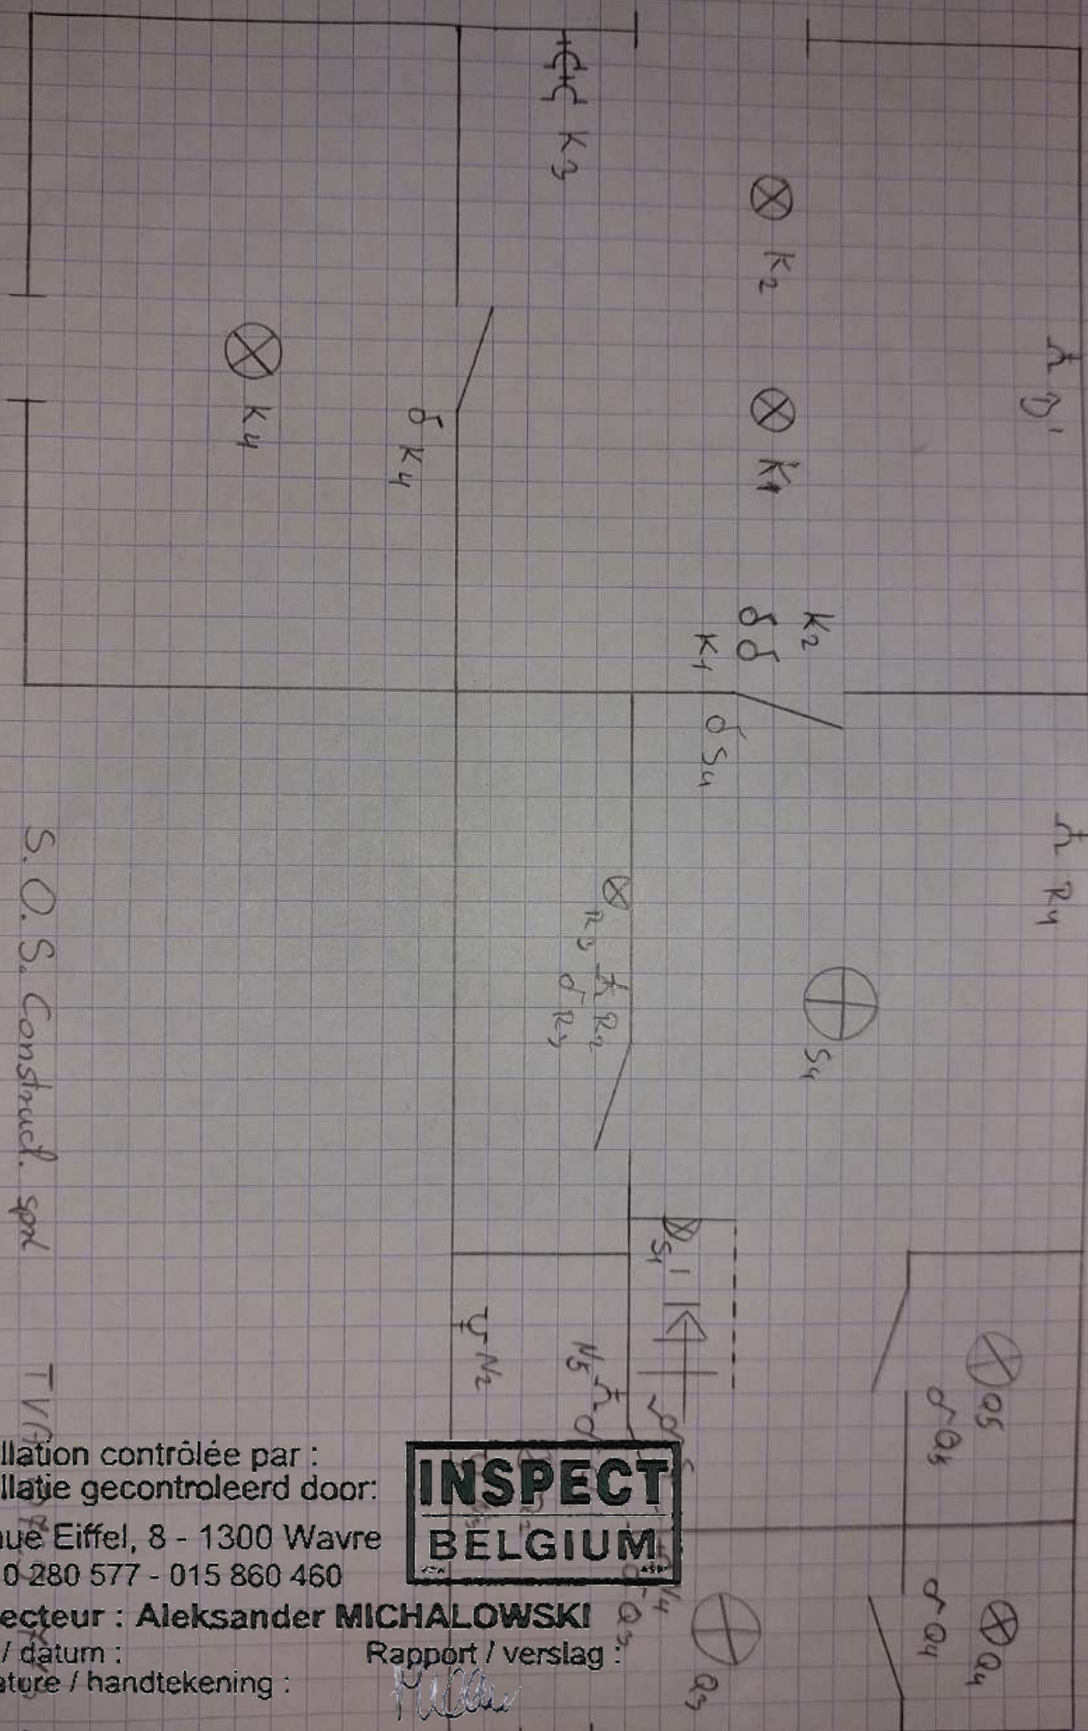

S.O.S. Construd. spol
 Al. Drigode Pison 143/4
 1080 BXL

Fog

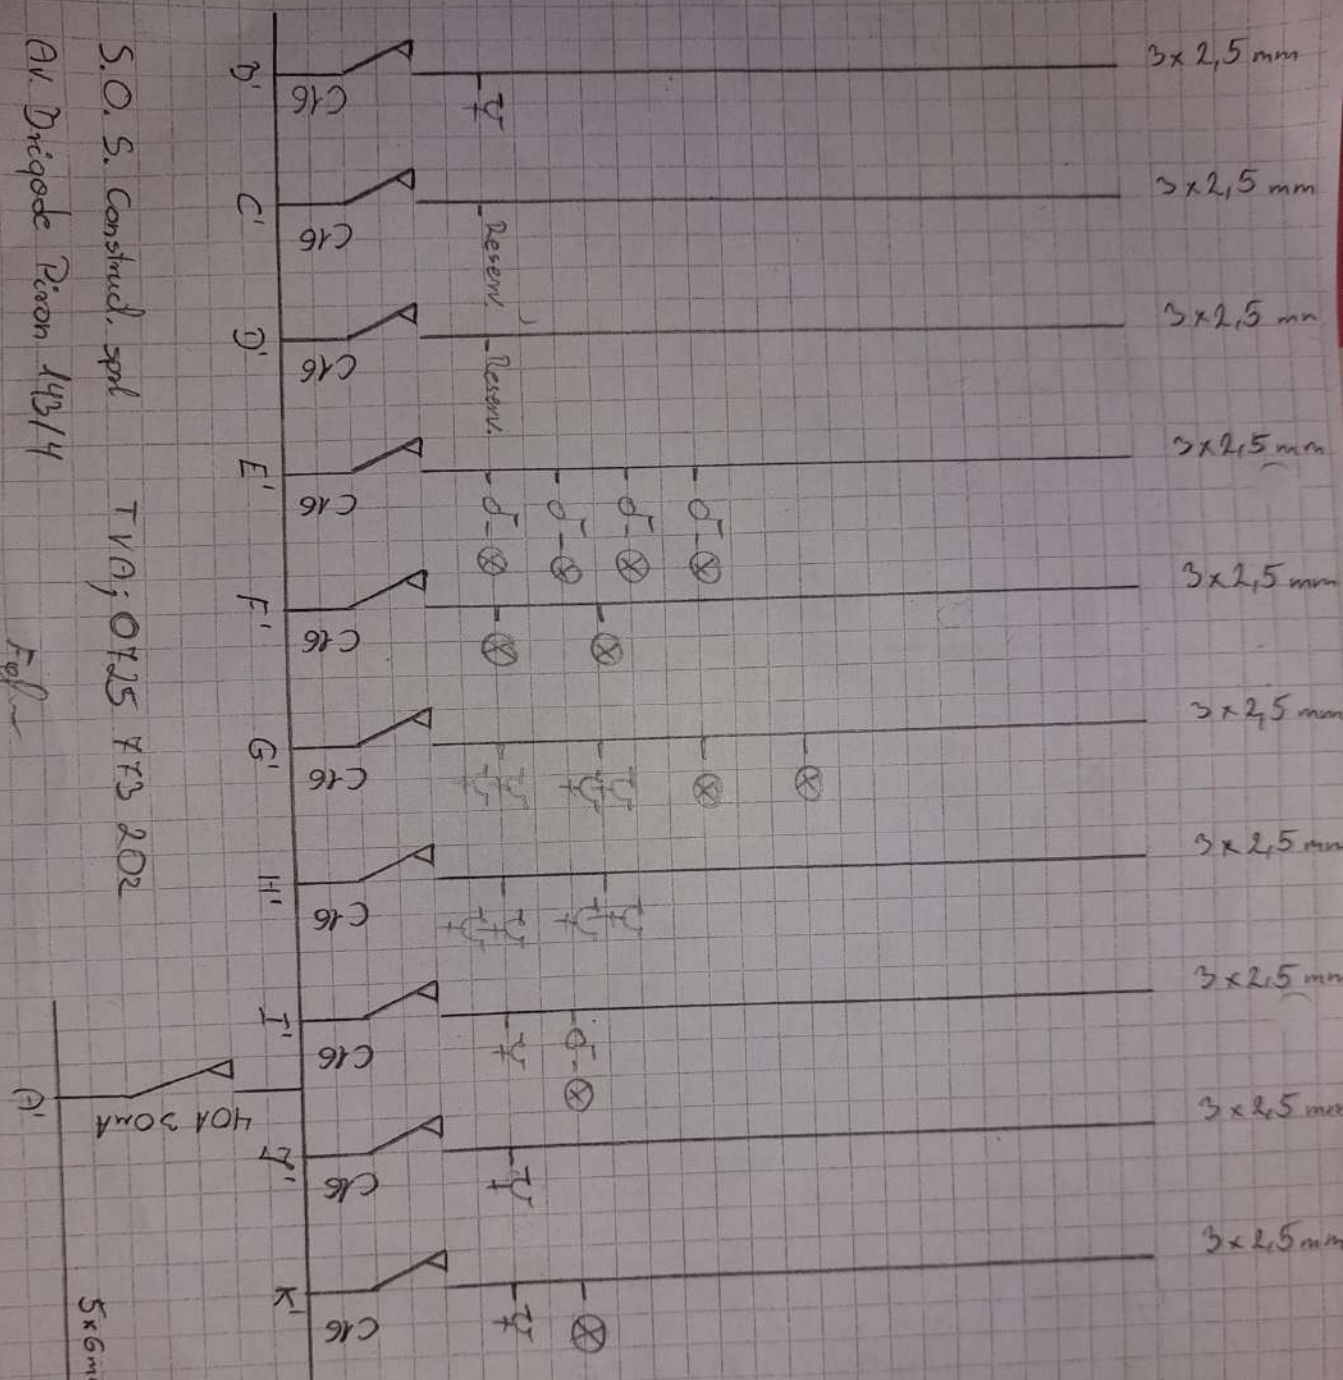

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:
 Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre
 010 280 577 - 015 860 460



Inspecteur : Aleksander MICHALOWSKI

Date / datum :

Rapport / verslag :

Signature / handtekening :

[Handwritten signature]

Elbeekstraat 68
 1500 Halle
