

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 03/02/2021

Inspecteur: Dirk Swalens

Mentor:

Installateur: -

ID-label: Installateur: Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI boek 1 hoofdstuk 9.1.3.2, en 8.2.1, en 4.2.3. EK1.26

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19481222

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Pastoriestraat
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 1755
Gemeente Gooik
Land België

Eigenaar

Naam Coppens joelle
Straatnaam Pastoriestraat
Huisnummer 15
Busnummer
Postcode 1755
Gemeente Gooik
Land België

Naam contactpersoon Joelle Coppens
Telefoon 0495740917
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam Aeck Lighting bvba
BTW nr. BE 715 399 150
Telefoonnummer 04 97 99 98 14
E-mail robin.aeck@hotmail.be

Type : woning

EAN : 5441

Teller Nr.: : 26085239

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5, en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 16 mm²

Max beveiliging: 20 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17

Isolatie: 3,24 MΩ

Aardelektrode: Horizontaal in de grond ingegraven metalen geleider(s) RE: 19,77 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
9	C	20		2	2,5
5	C	16		2	2,5
2	C	20		3	2,5
1	C	2		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK

schema in bijlage door Aceg vzw ☒

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Herkeuring van verslag 376801, dd 05/01/2021

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 3/2/2046
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) één draads- en opstellingschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 3

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De Inspecteur Dirk Swalens

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en/of wijlen, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.acag.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 3/2/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

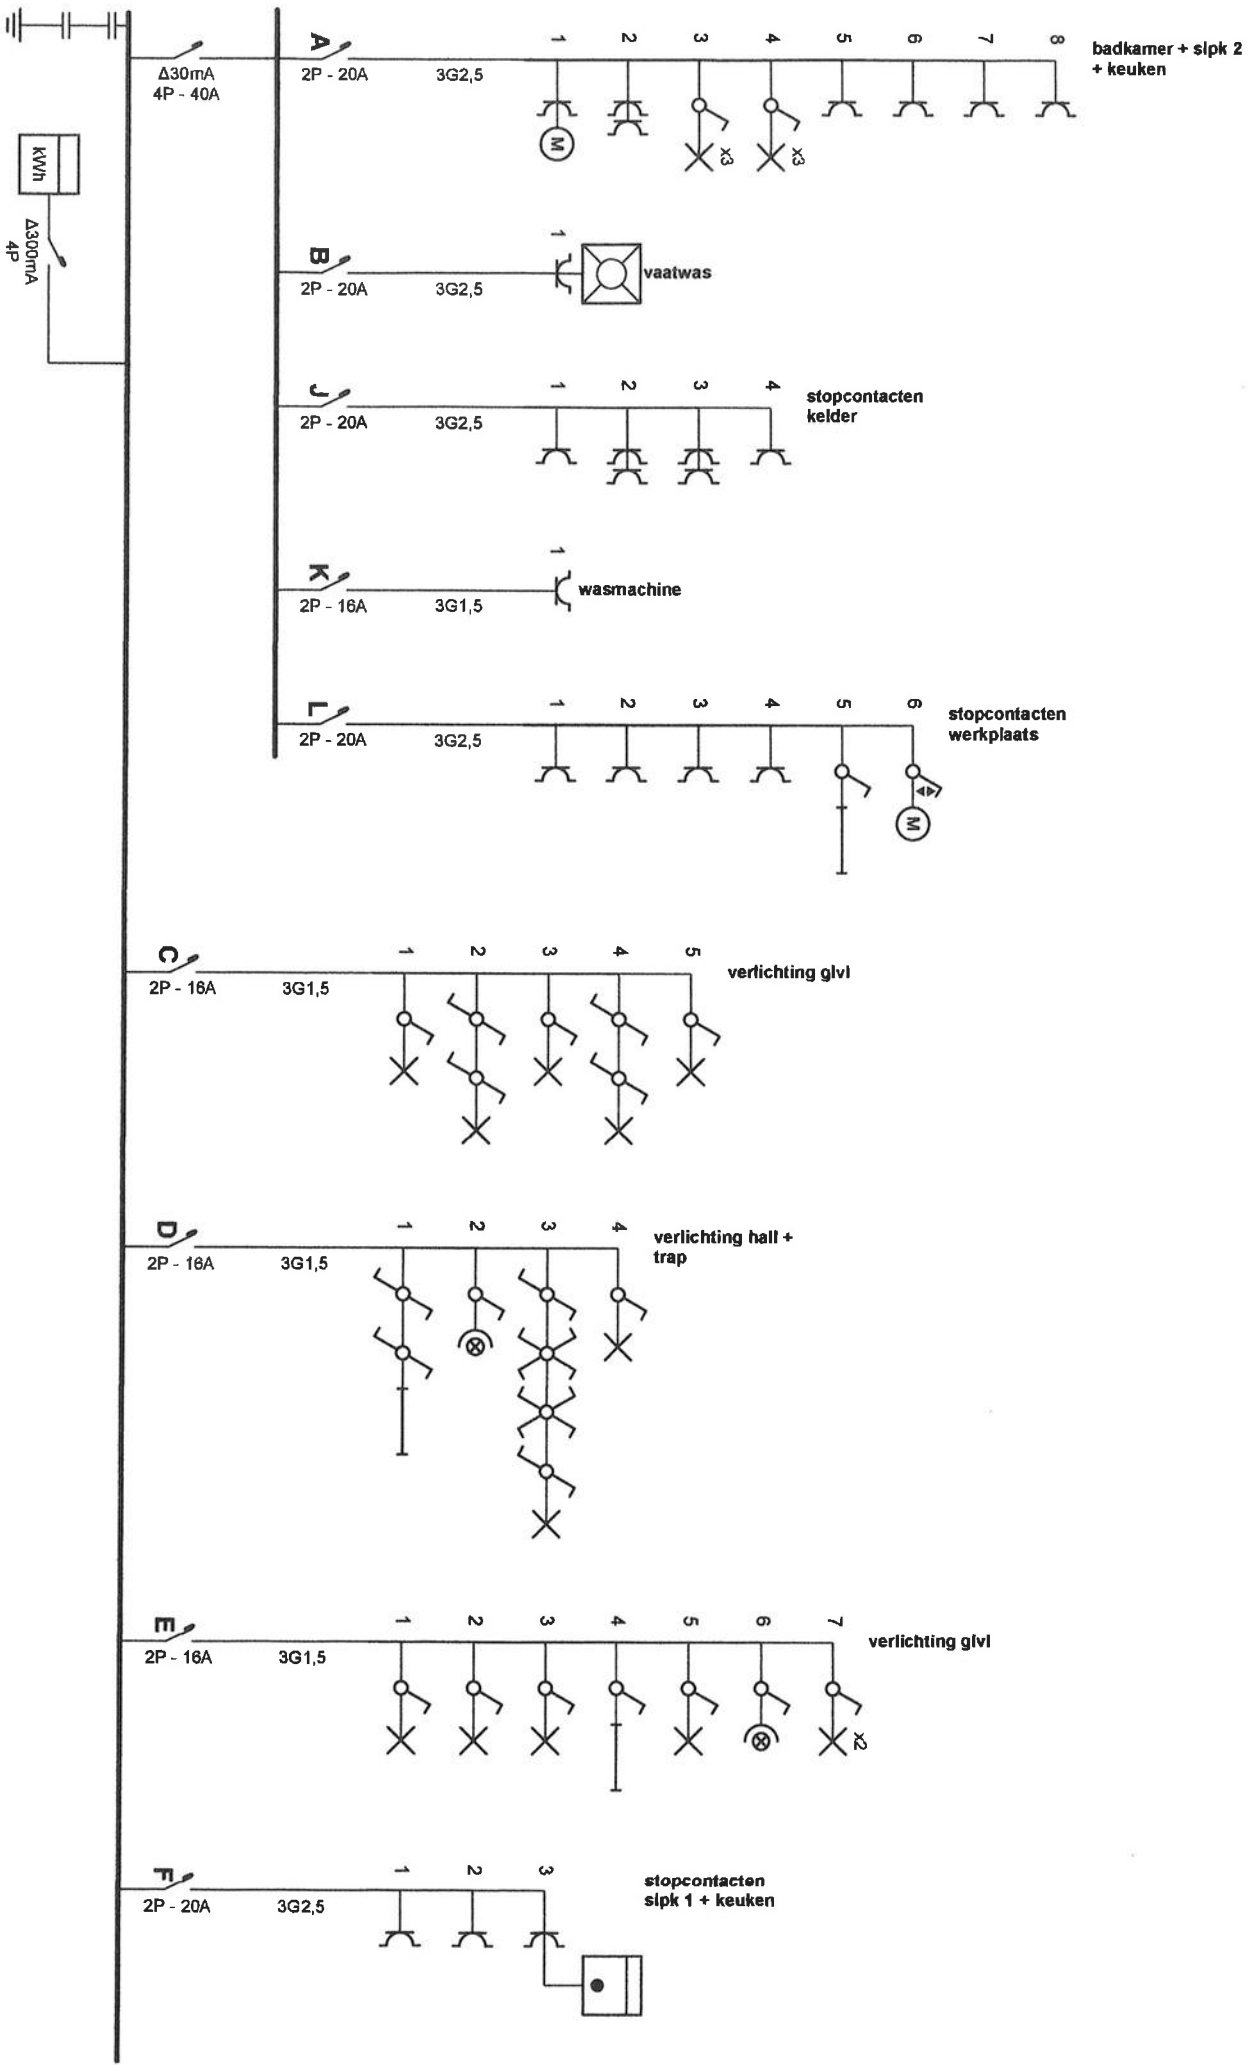



Plaats van de elektrische installatie
Coppens Jobéle
Pastoriestraat 15
1755 Oetingen

Installateur

p. 1/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's gedigitaliseerd door (geen opmeting) EFG² - BTW BE 0671.939.685

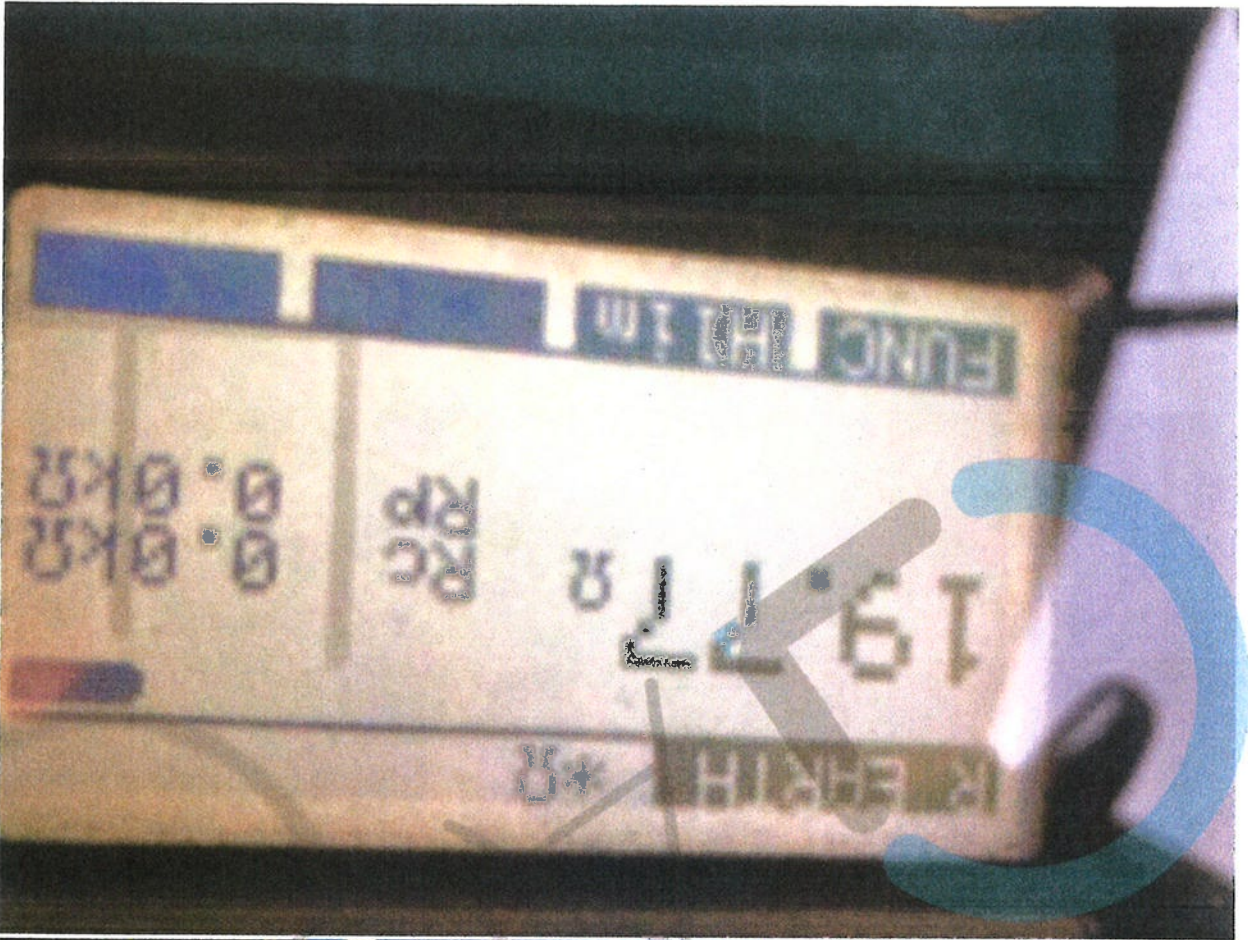

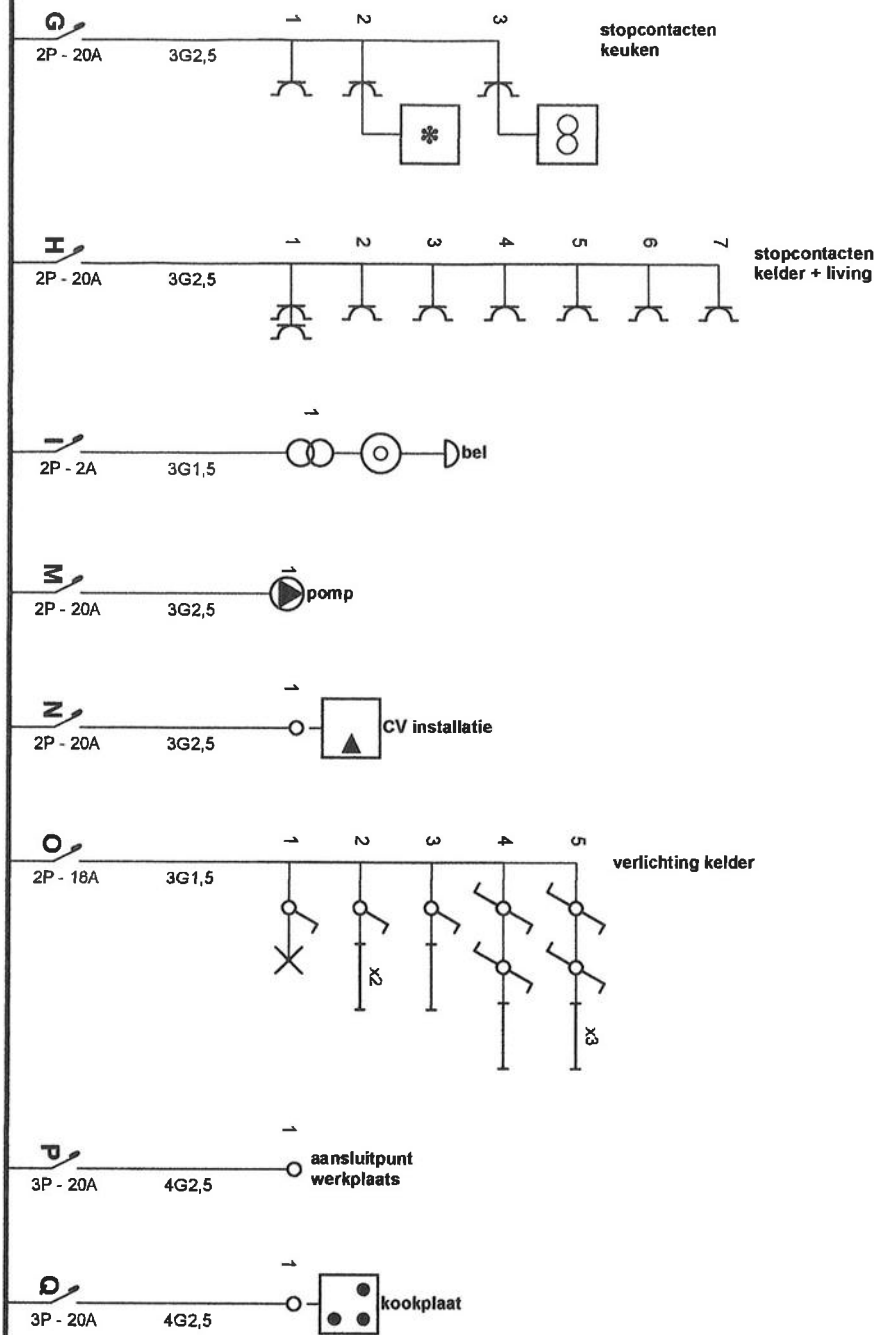

Plaats van de elektrische installatie


Coppens Joëlle
Pastoriestraat 15
1755 Oelingen

Installateur

p. 2/4
Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schema's gedigitaliseerd door (geen opmeting) EF-G² - BTW BE 0671.939.685

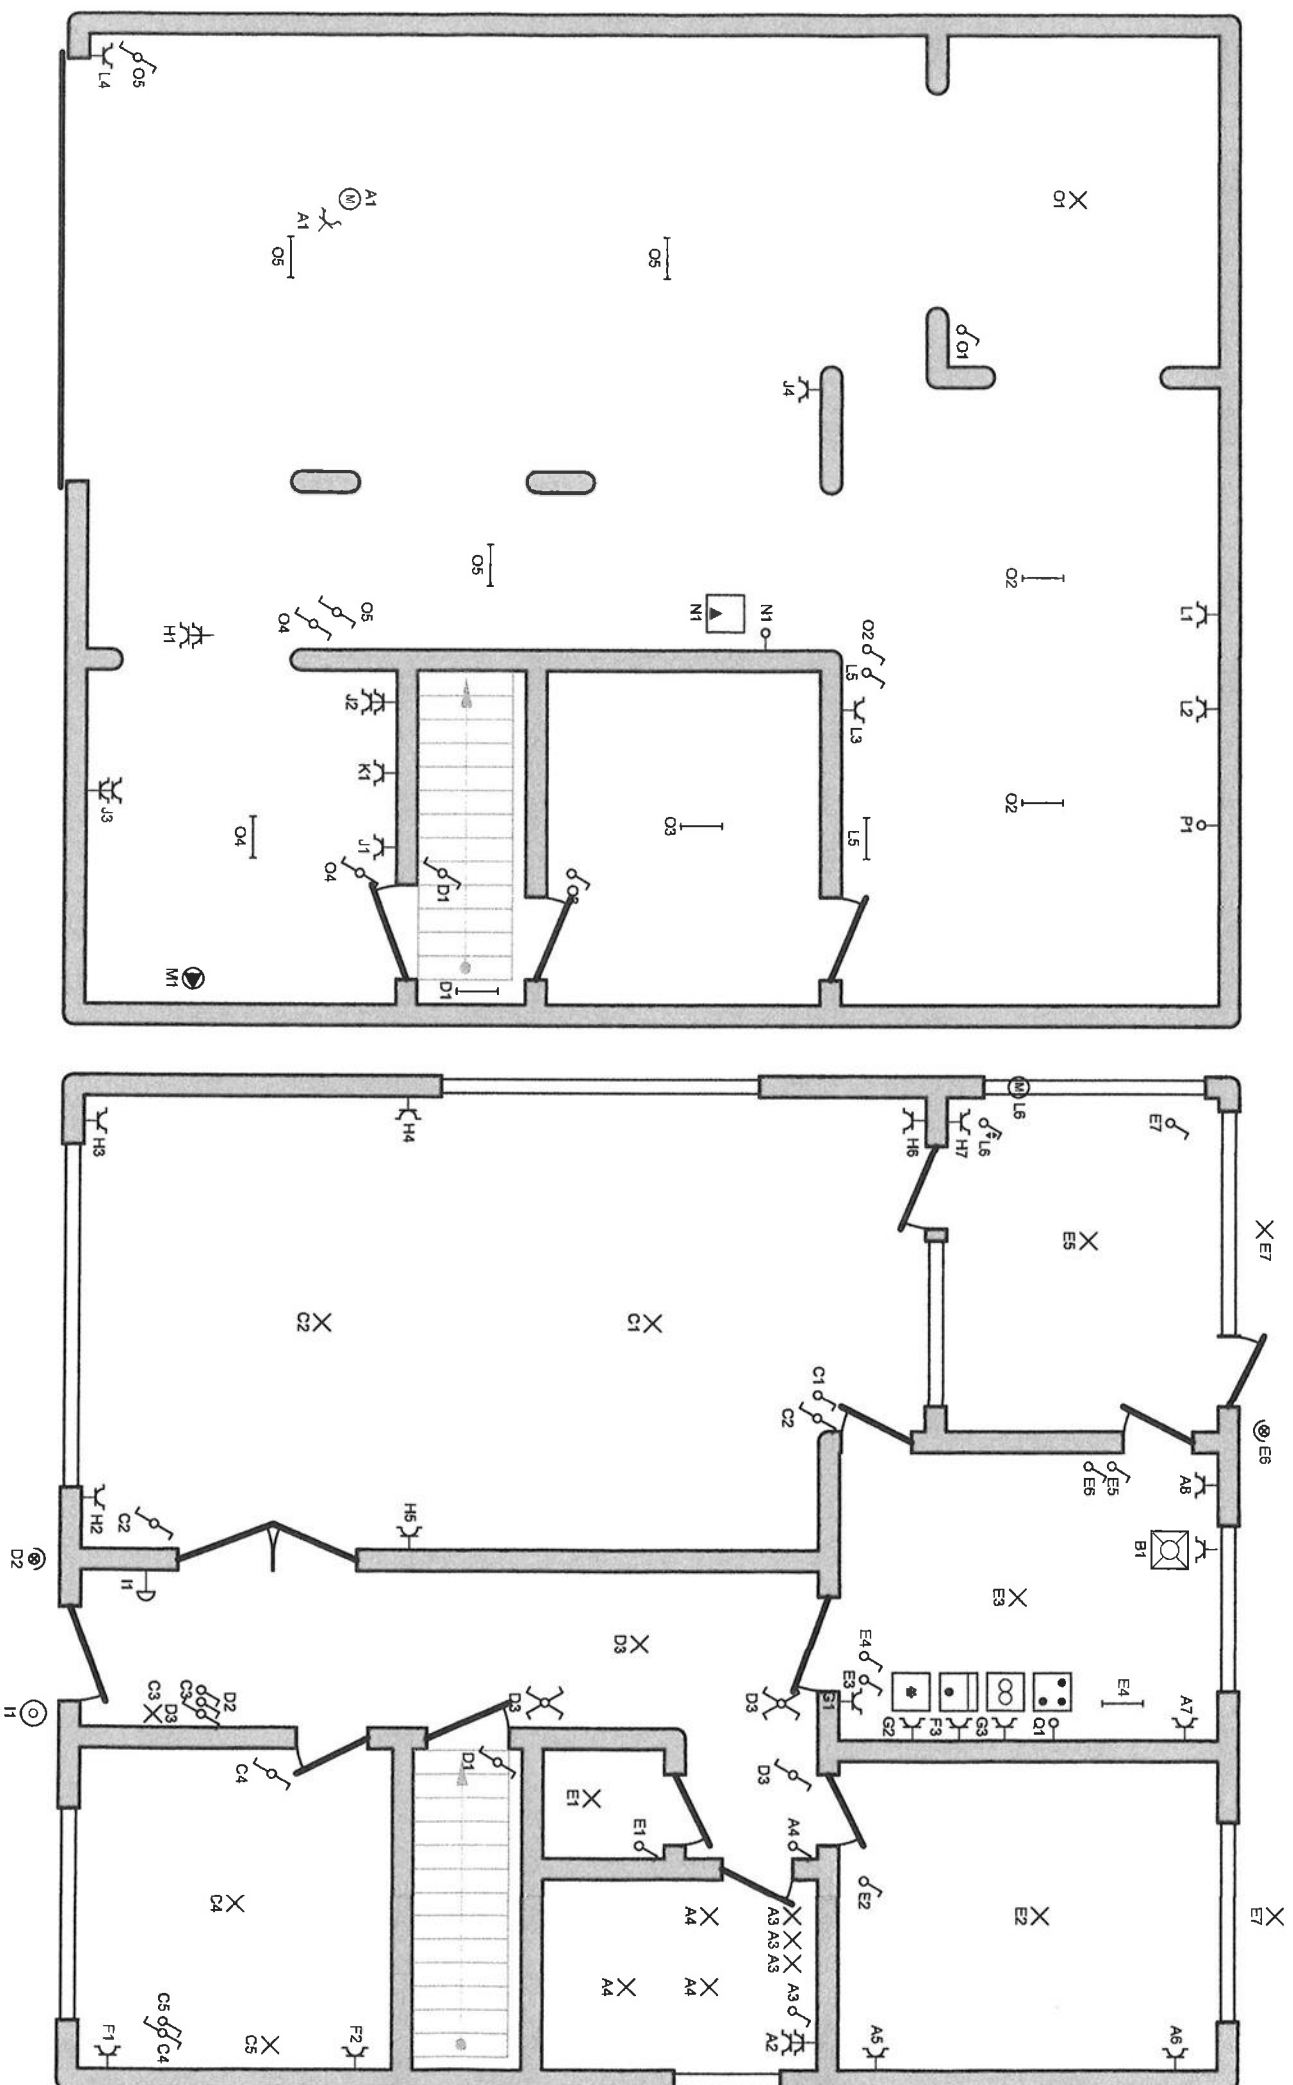

- A** badkamer + slpk 2 + keuken
- B** vaatwas
- J** stopcontacten kelder
- K** wasmachine
- L** stopcontacten werkplaats
- C** verlichting gvl
- D** verlichting hall + trap
- E** verlichting gvl
- F** stopcontacten slpk 1 + keuken
- G** stopcontacten keuken
- H** stopcontacten kelder + living
- I** bel
- M** pomp
- N** CV installatie
- O** verlichting kelder
- P** aansluitpunt werkplaats
- Q** kookplaat

Plaats van de elektrische installatie Coppens Joëlle Pastoriestraat 15 1755 Oetingen	Installateur	p. 4/4 Lijst Kringen 3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's gedigitaliseerd door (geen opmeting) EF-G² - BTW BE 0671.939.685		

