

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 25/06/2021
ID-label: 50/2

Inspecteur: Kevin Spitaels

Mentor:

Installateur: Ozkan Kadir

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Serie Nr.: 19370751

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Baarstraat
Huisnummer 50
Busnummer 2
Postcode 9700
Gemeente OUDENAARDE
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Baarstraat
Huisnummer 50
Busnummer 2
Postcode 9700
Gemeente OUDENAARDE
Land België

Naam contactpersoon Ozkan Kadir
Telefoon 0472923545
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam Ozkan Kadir
BTW nr. -
Telefoonnummer 0472923545
E-mail Okadir72@gmail.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820068996459

Teller Nr.: : 5243659



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1

Spanning: 3~230V
Aantal kringen: 9


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 51,4 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 3,18 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
8	C	16		2	2,5
1	C	10		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 25/6/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Kevin Spitaels

De werknemer,



Kevin Spitaels
ACEG VZW - #134

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.



www.aceg.be



02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 25/6/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

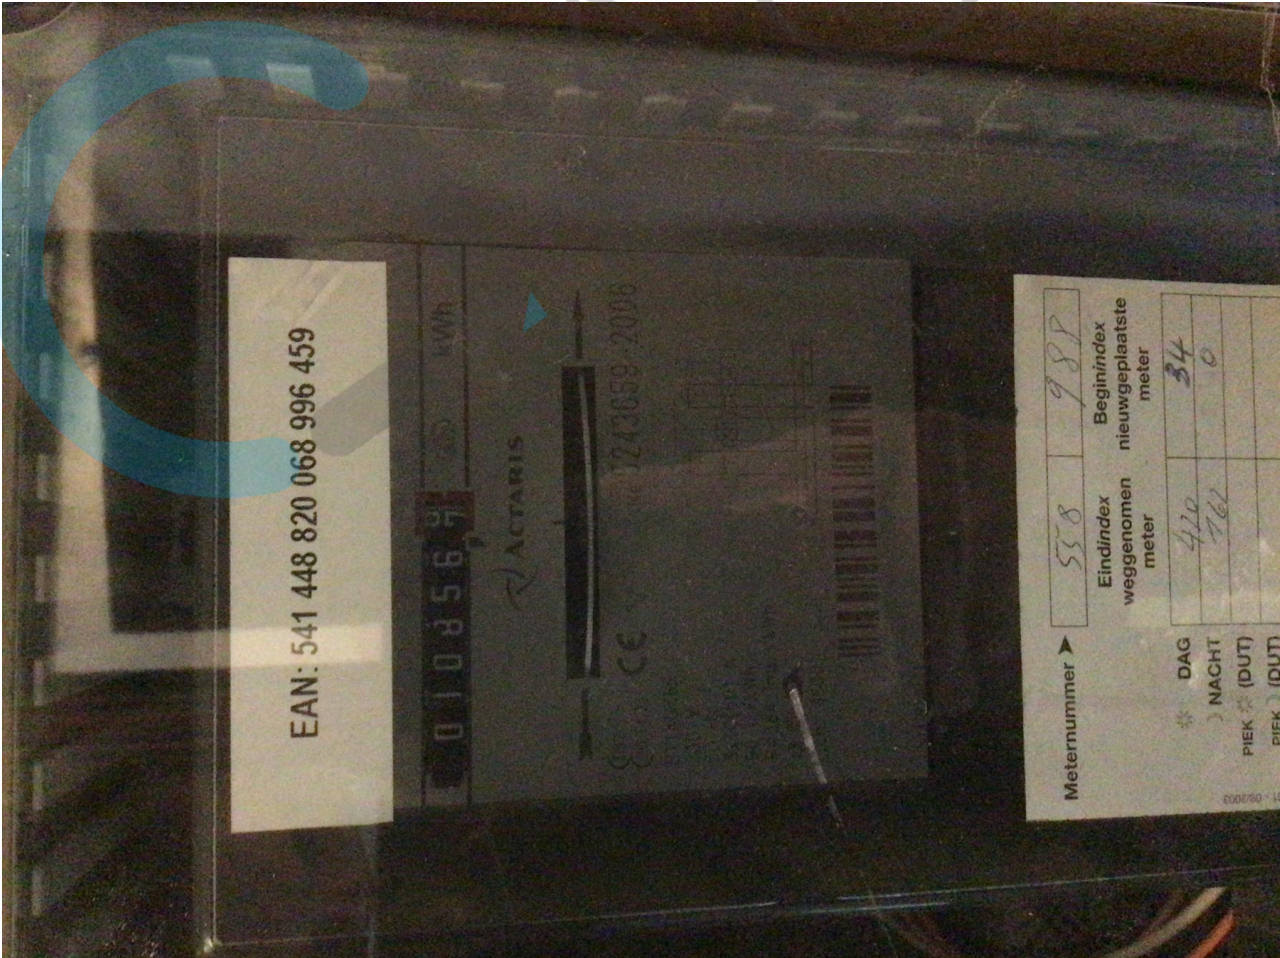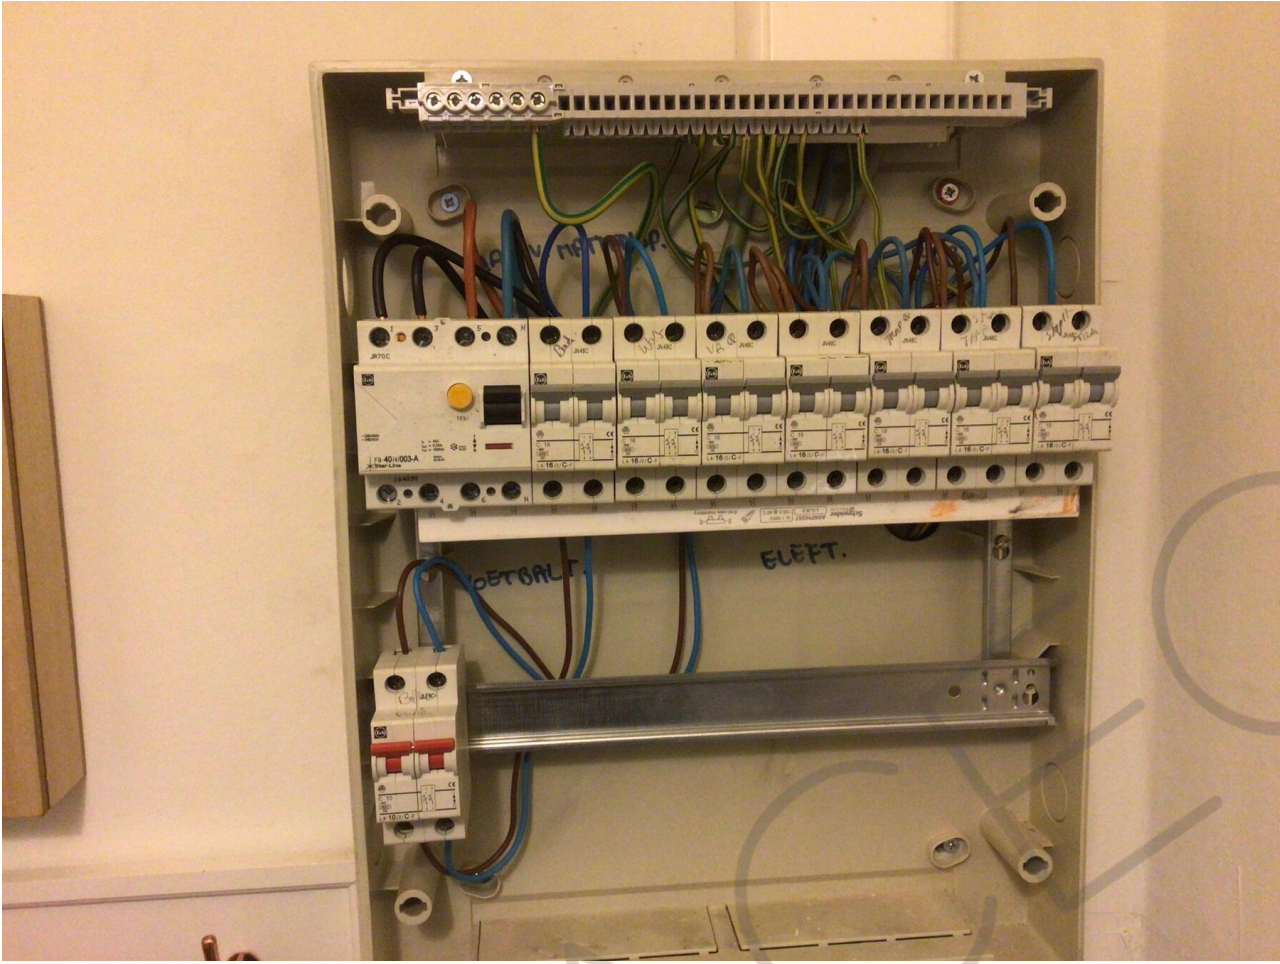

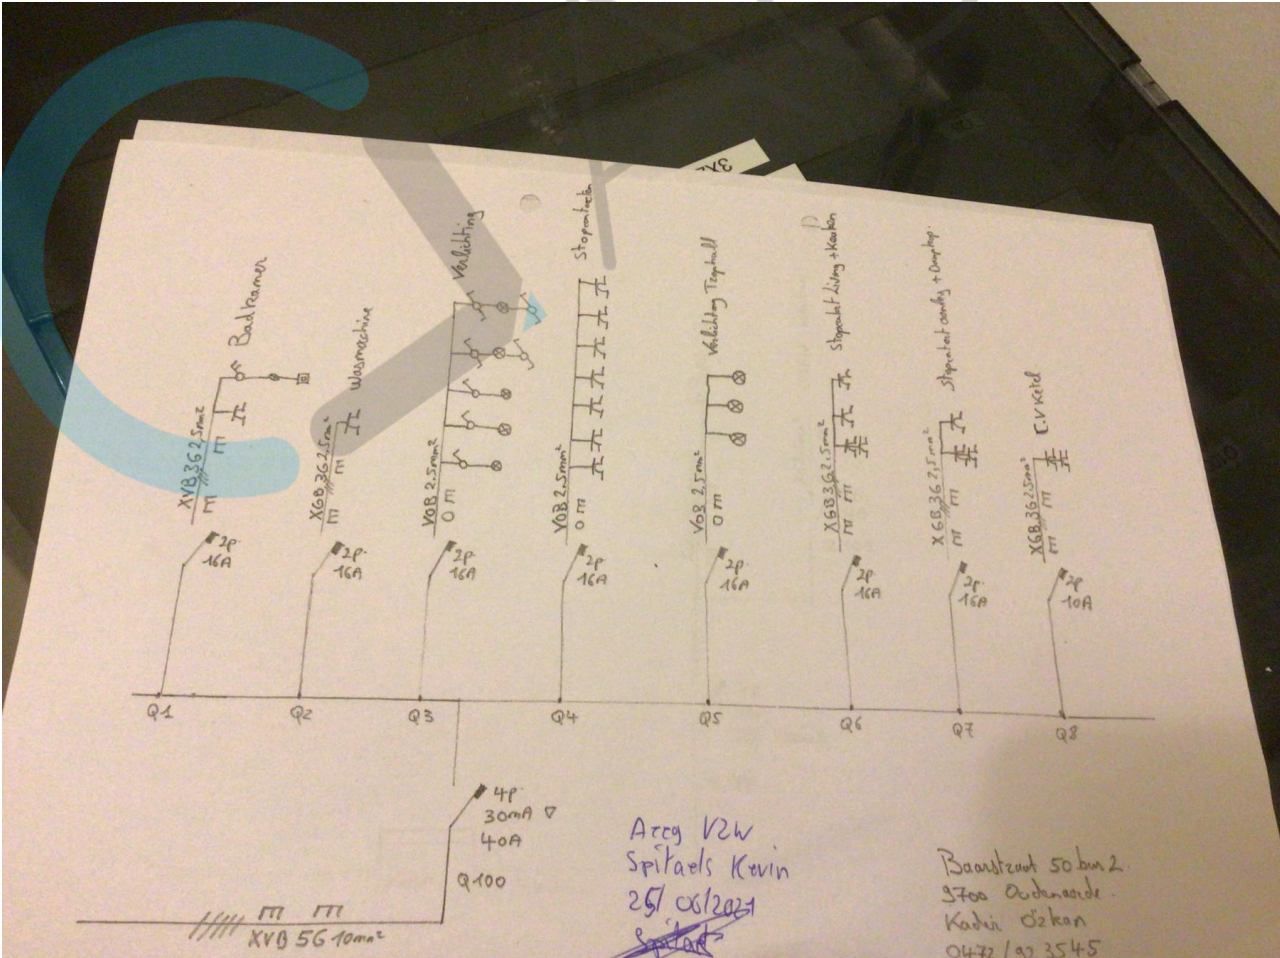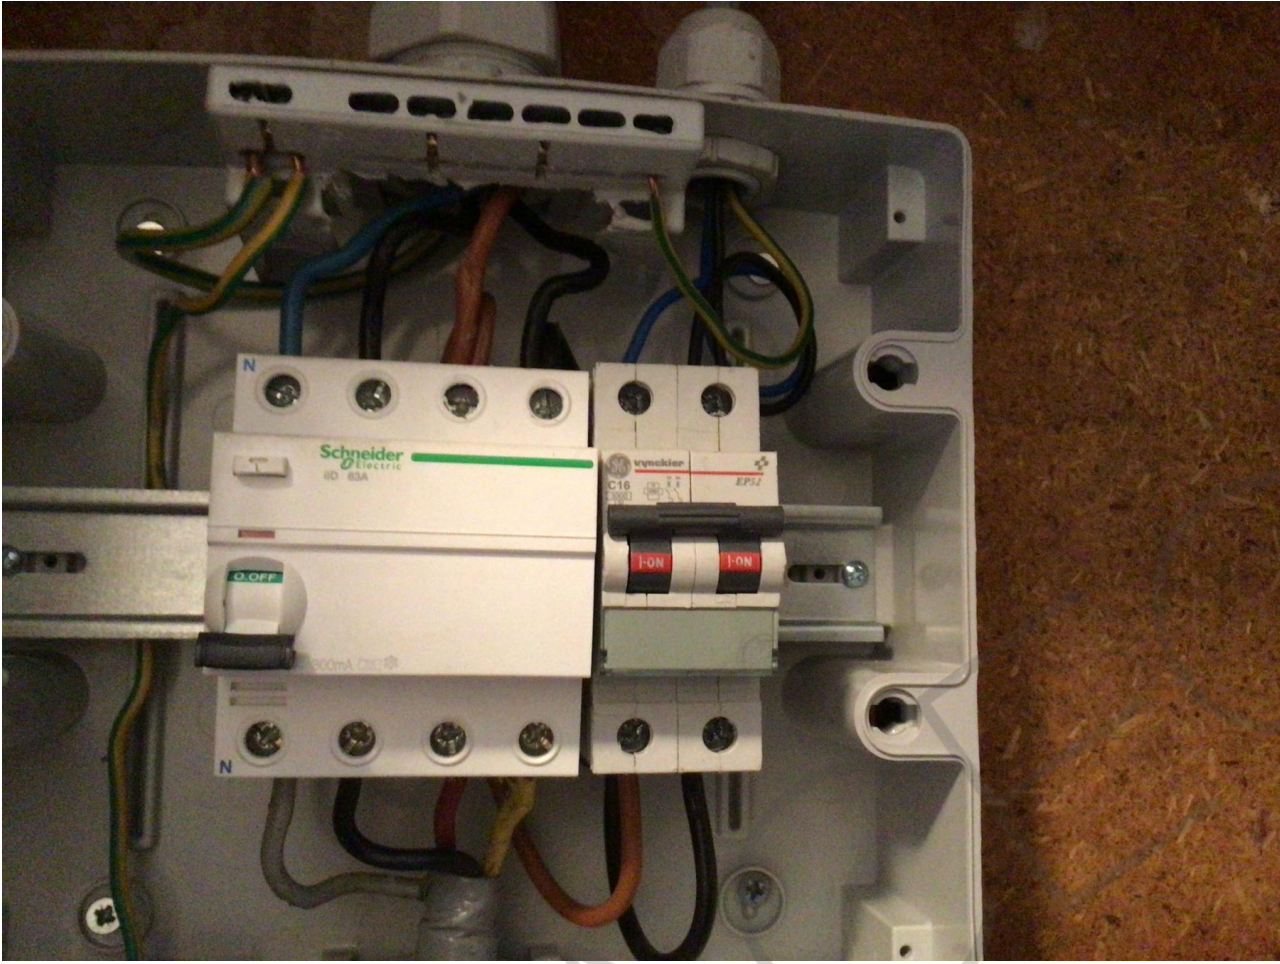

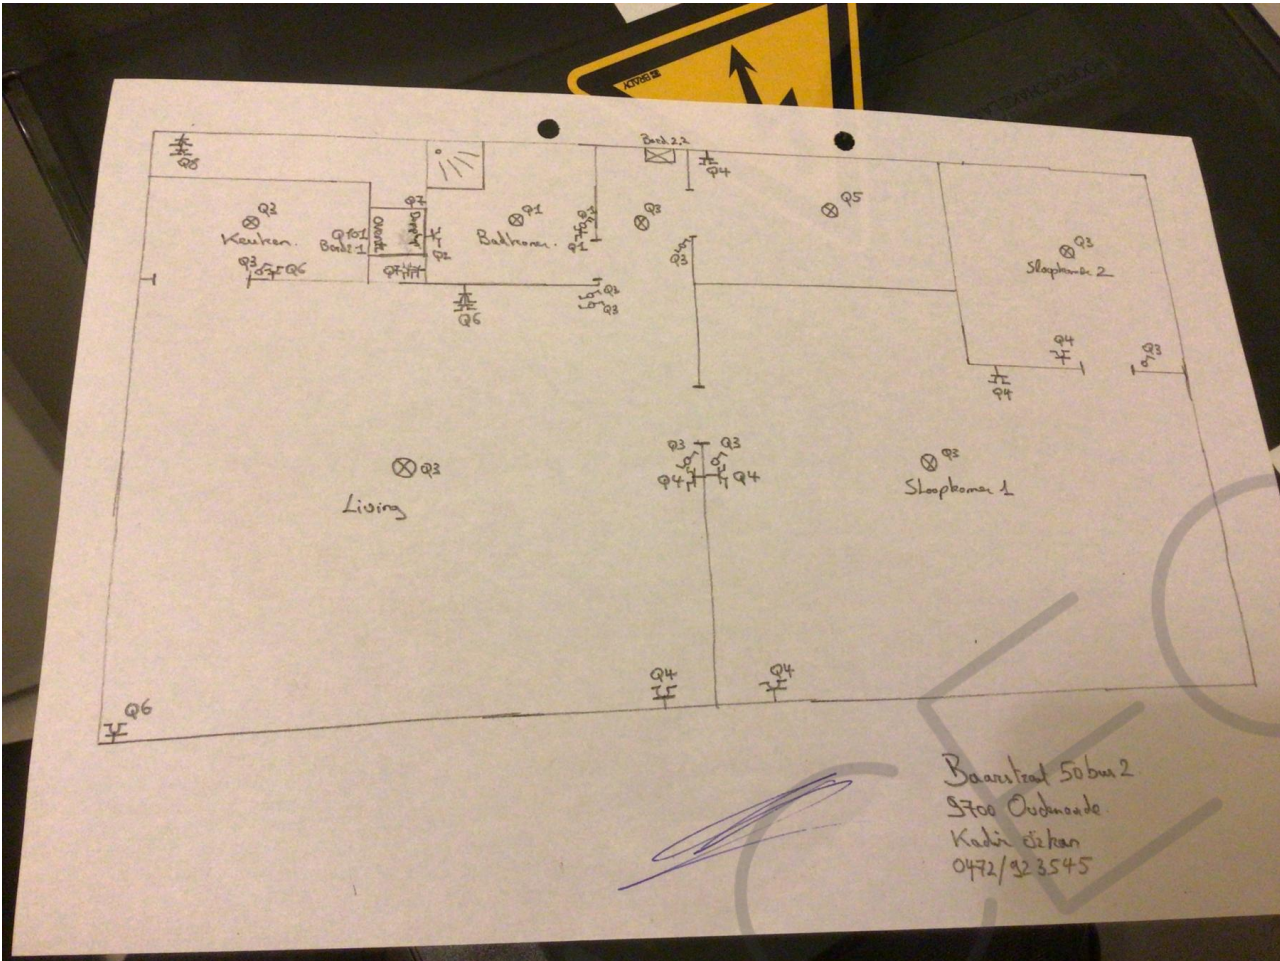

Baanstraat 50 bus 2
 5700 Oudhooide
 Kadiri Ozkan
 0472/923545

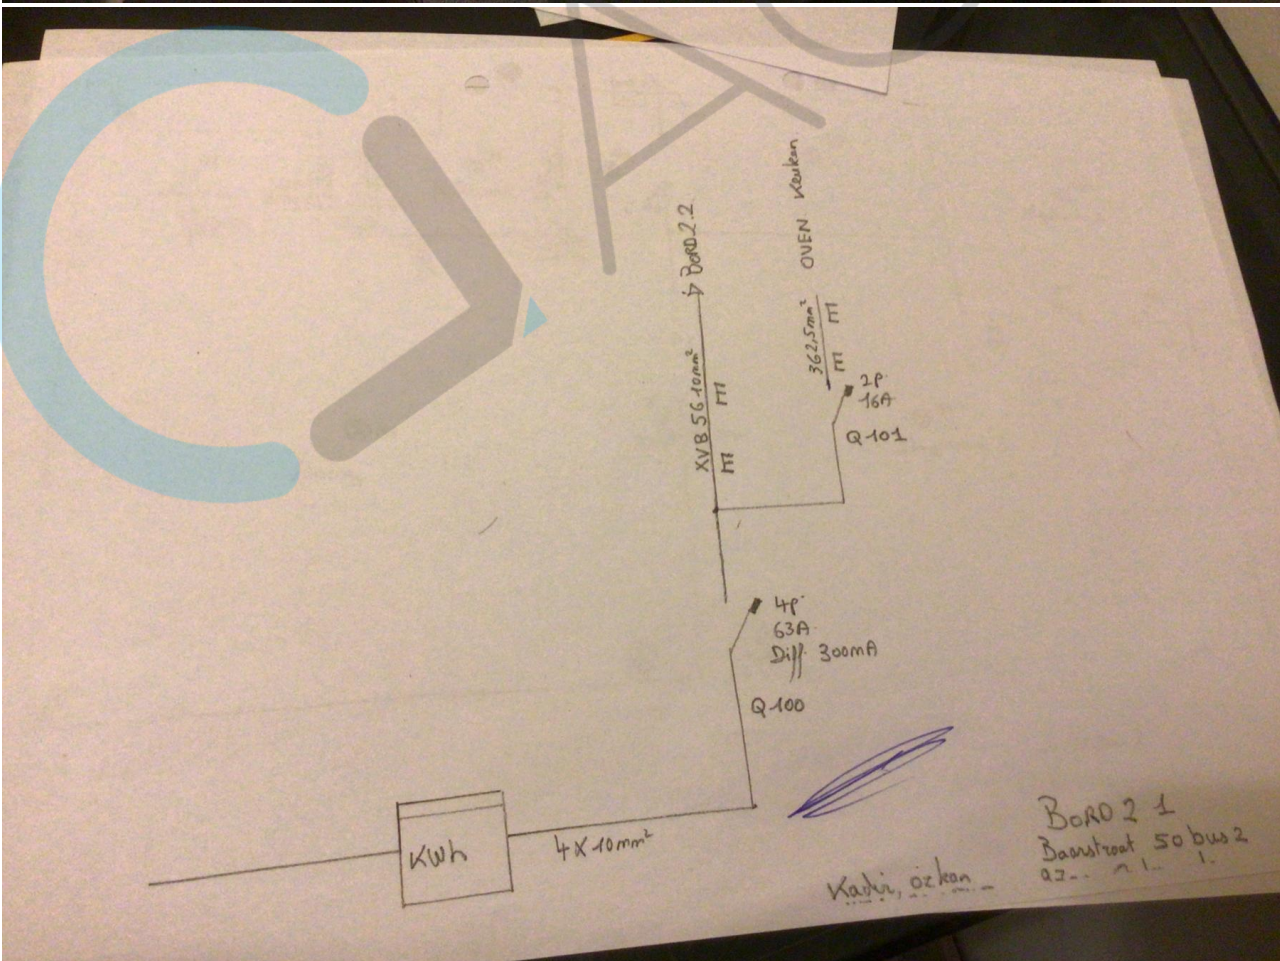

BORD 2 1
 Baanstraat 50 bus 2
 02-... 1-1

