

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

41.560

Datum van bezoek:

02-04-2024

Plaats van het onderzoek:

Wortegemstraat 54 9700 Oudenaarde België

Testeur d'installation:

Inspecteur:

Ramazan Yalcinoz

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-027/4915002

De datum van opstelling:

02-04-2024 13:13:51

Volgend controlebezoek:

02-04-2049

Opdrachtgever

Naam

PEB Certi

Adres

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

Telefoon

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Wortegemstraat 54 9700 Oudenaarde België

Gebouw

Huis

Eigenaar

Kadir Ozkan

Adres van de eigenaar

Wortegemstraat 54 9700 Oudenaarde België

Installateur

Vertronics N.V.

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

1SAG1100104042

EAN code

541448820069161979

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Onderzoek

Schema's	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vanaf 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Zie bijlage.		
Aantal verdeelborden	1		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK		
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelektrode	Baar		
Weerstand aardelektrode (Ω)	18		
Isolatiemeting ($M\Omega$)	13.01		

Besluit

BESLUIT : CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële stroombeveiligingsapparaat aan het begin van de elektrische installatie door verzegeling ontoegankelijk zijn gemaakt en dat het (de) éénregelige schema(s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.


Handtekening van de inspecteur



Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

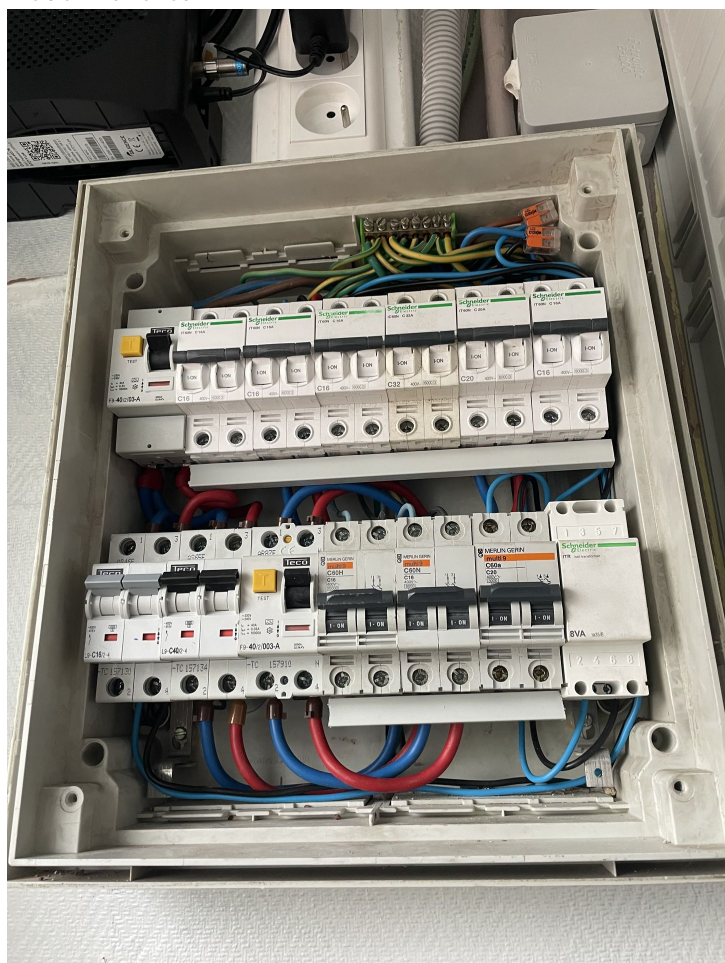

Verdeelbord 1

Bewoordingen

Foto
