



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Gasellwest

Nr teller :

N° comp :

12883622-98

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 25/0437/01

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Blekenrijstraat 28 9700 Oudenaarde

Eigenaar

Propriétaire :

Vazaru

Adres :

Adresse :

Idem

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Idem

06.05.10

BTW / TVA :

Ik. / C.I. : B007514163

Inspecteur : De Smedt Kurt

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 2x230V	Meter / bord verbinding : 2x6L	Max. beveiliging : 50A Max 4
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : Penner	Isolatie : 7,21 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 10,4 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 24		TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Hoofddrif → Alle kransen		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
40	30	A	Bijkom. drif → 2e-13		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK

Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentialvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden in dienst blijven.
L'installation est n'est pas conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénheidschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 06.05.2035

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 06.05.2035

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.


voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport	
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK		
☐	☒	☒	☐		
271 AK		271 HK			
☒		☒			
276 AK		271 HK			
☐		☐			



NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour procéder à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

SCHAKELKAST
Belekerijstraat 28
9700 Oudenaarde
Belgë

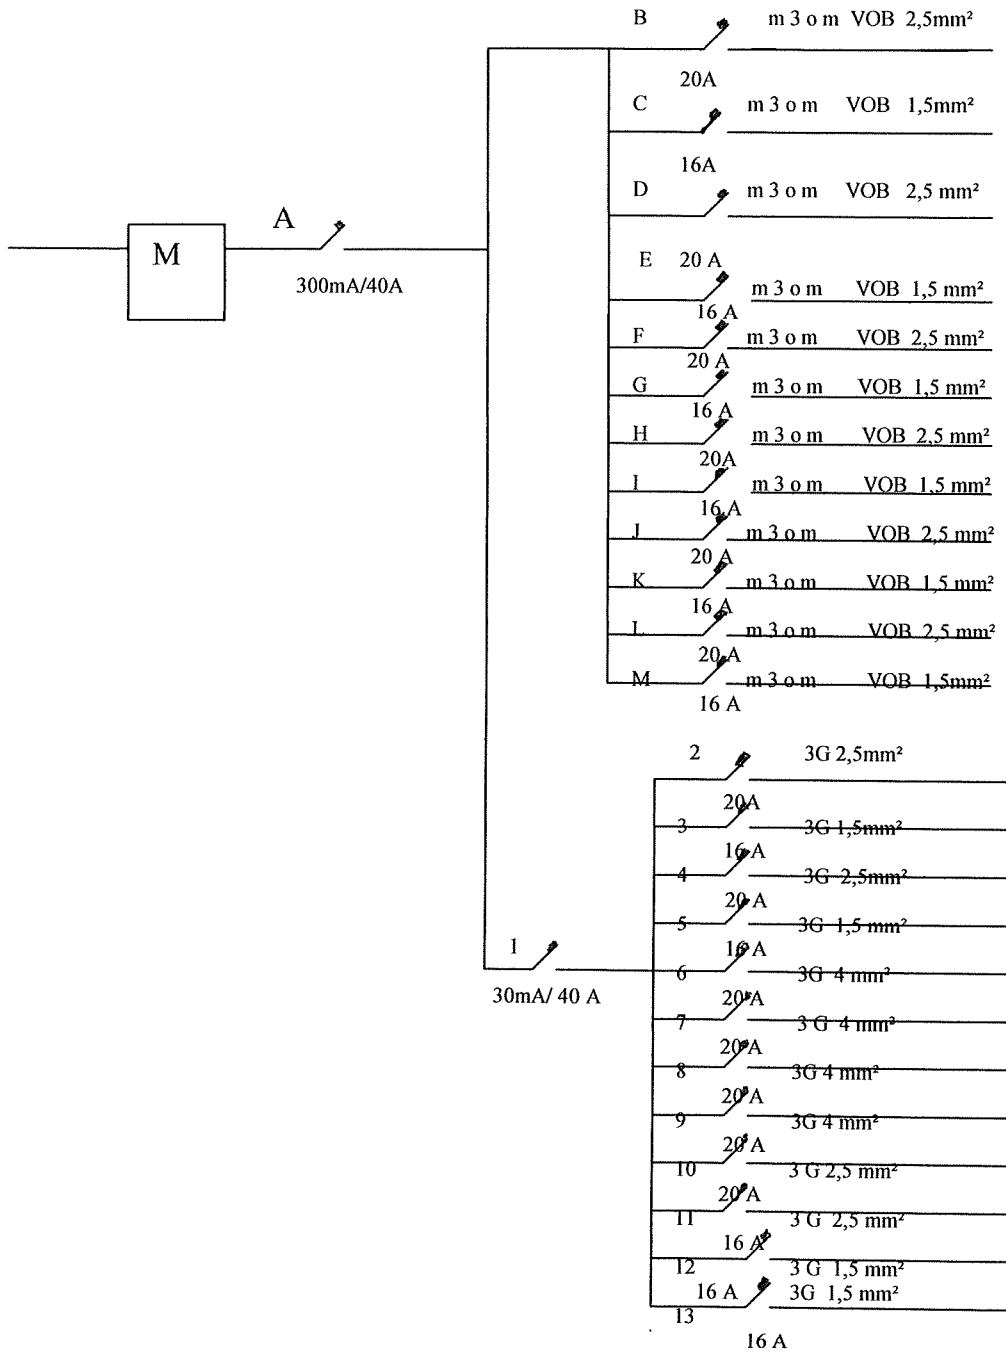

SCHAKELKAST

Belekerijstraat 28
9700 Oudenaarde
België

Diferential 300ma/40A	Vliering Stopkontakt 20A	Vliering Light 16A	Slatkamer Feesten Stopkontakt 20A	Slatkamer Feesten Light 16A	Kamer van de ouders Stopkontakt 20A	Kamer van de ouders Light 16A	Kids slaap Kamer Stopkontakt 20A	Kids slaap Kamer Light 16A
A	B	C	D	E	F	G	H	I

Slapkamer Beneden Stopkontakt 20A	Slapkamer Beneden Light 16A	Woonkamer Stopkontakt 20A	Woonkamer Stopkontakt Light 16A	Diferential 30ma/40A	Badkamer Stopkontakt 20A	Badkamer Light 16A	Keuken Stopkontakt 20A	Keuken Light 16A
J	K	L	M	1	2	3	4	5

Wasmachine Stopkontakt 20A	Droger Stopkontakt 20A	Elektrisch Fornuis 20A	Oven Stopkontakt 20A	Terras Stopkontakt + Light 20A	Hal + Kelder 16A	Wc + Garaj 16A	Goegangstrap 16A	Minuteria
6	7	8	9	10	11	12	13	14
