

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/03/2025

Inspecteur: Stephanie Sevens

Mentor:

Installateur: Valencyn William BVBA

ID-label: Dr. Verdumenstraat 34 301

B.T.W. nr.: BE 0684 700 927

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481261

Datum verslag: 11/03/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dr. Verdumenstraat
Huisnummer 34
Busnummer 301
Postcode 9100
Gemeente SINT-NIKLAAS
Land België

Eigenaar

Naam BV Merus
Straatnaam Dr. Verdumenstraat
Huisnummer 34
Busnummer 301
Postcode 9100
Gemeente SINT-NIKLAAS
Land België

Installateur

Naam Valencyn William BVBA
BTW nr. BE 0684 700 927
Telefoonnummer +32 473 46 02 86
E-mail valencynelectronics@gmail.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860023822416

Teller Nr. : 1SAG1200361328



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 17


Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 9,82 MΩ

RE: 3,50 Ω

OK

OK

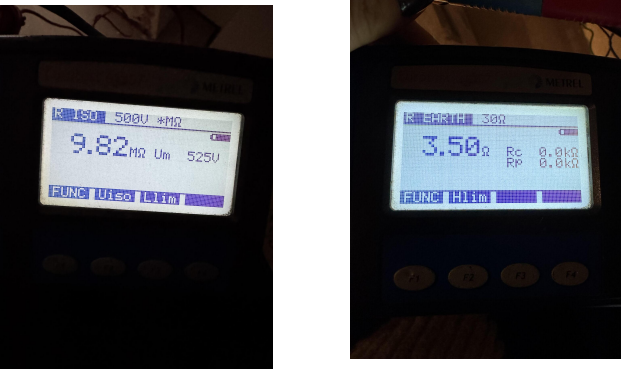

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	8	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- N13 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.
- N2 Geen inbreuken vastgesteld.
- N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/3/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:38 tot 09:39

De inspecteur Stephanie Sevens

De werknemer,

Stephanie Sevens

Stevens

ACEG VZW - #158

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/3/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



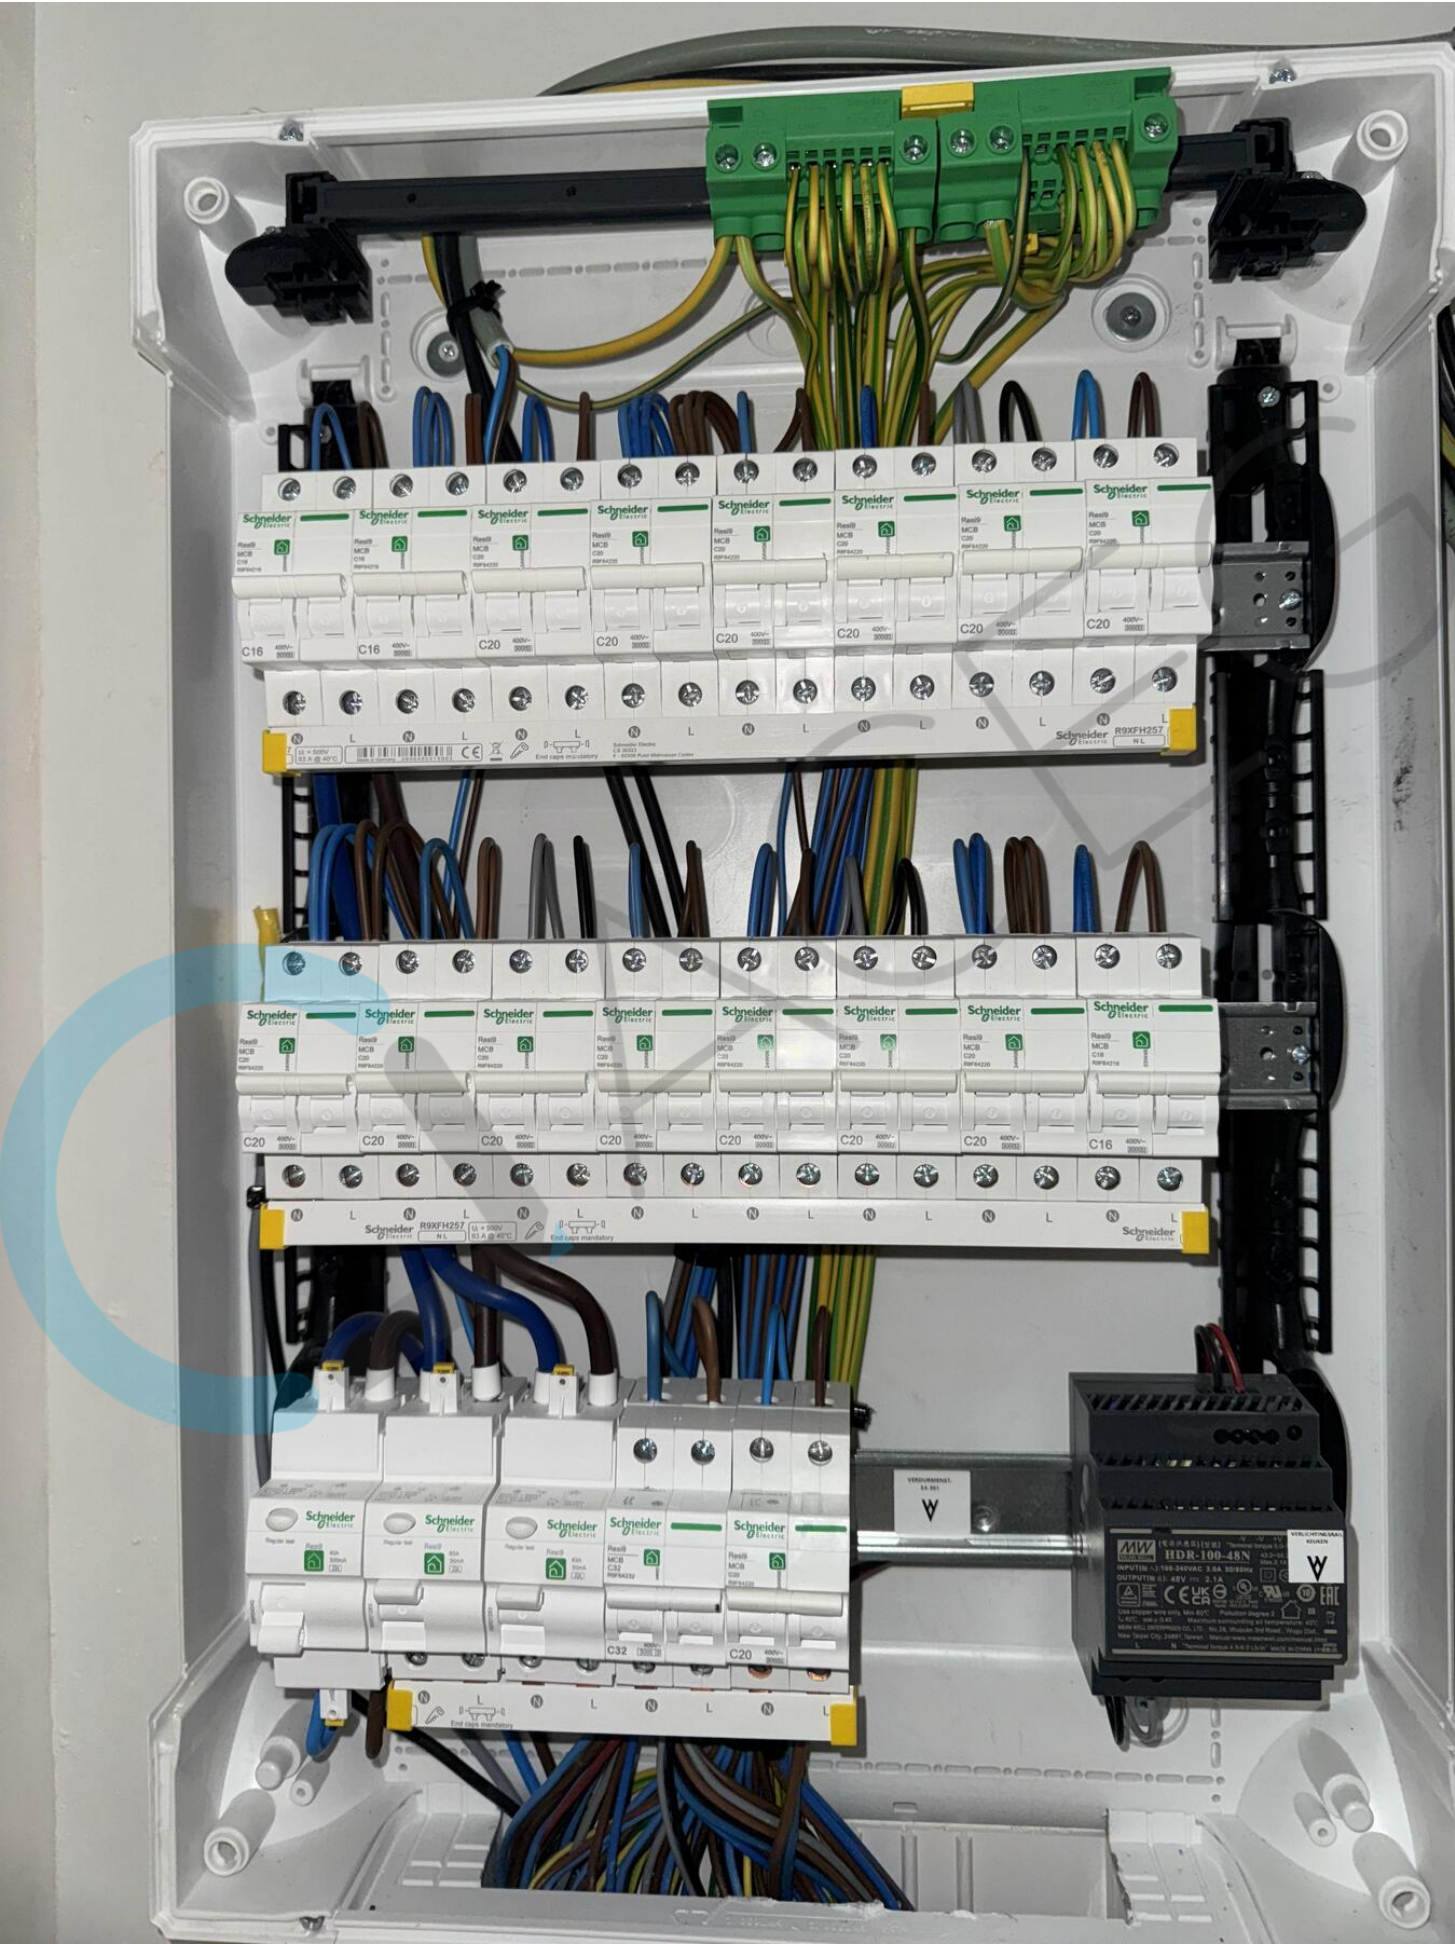




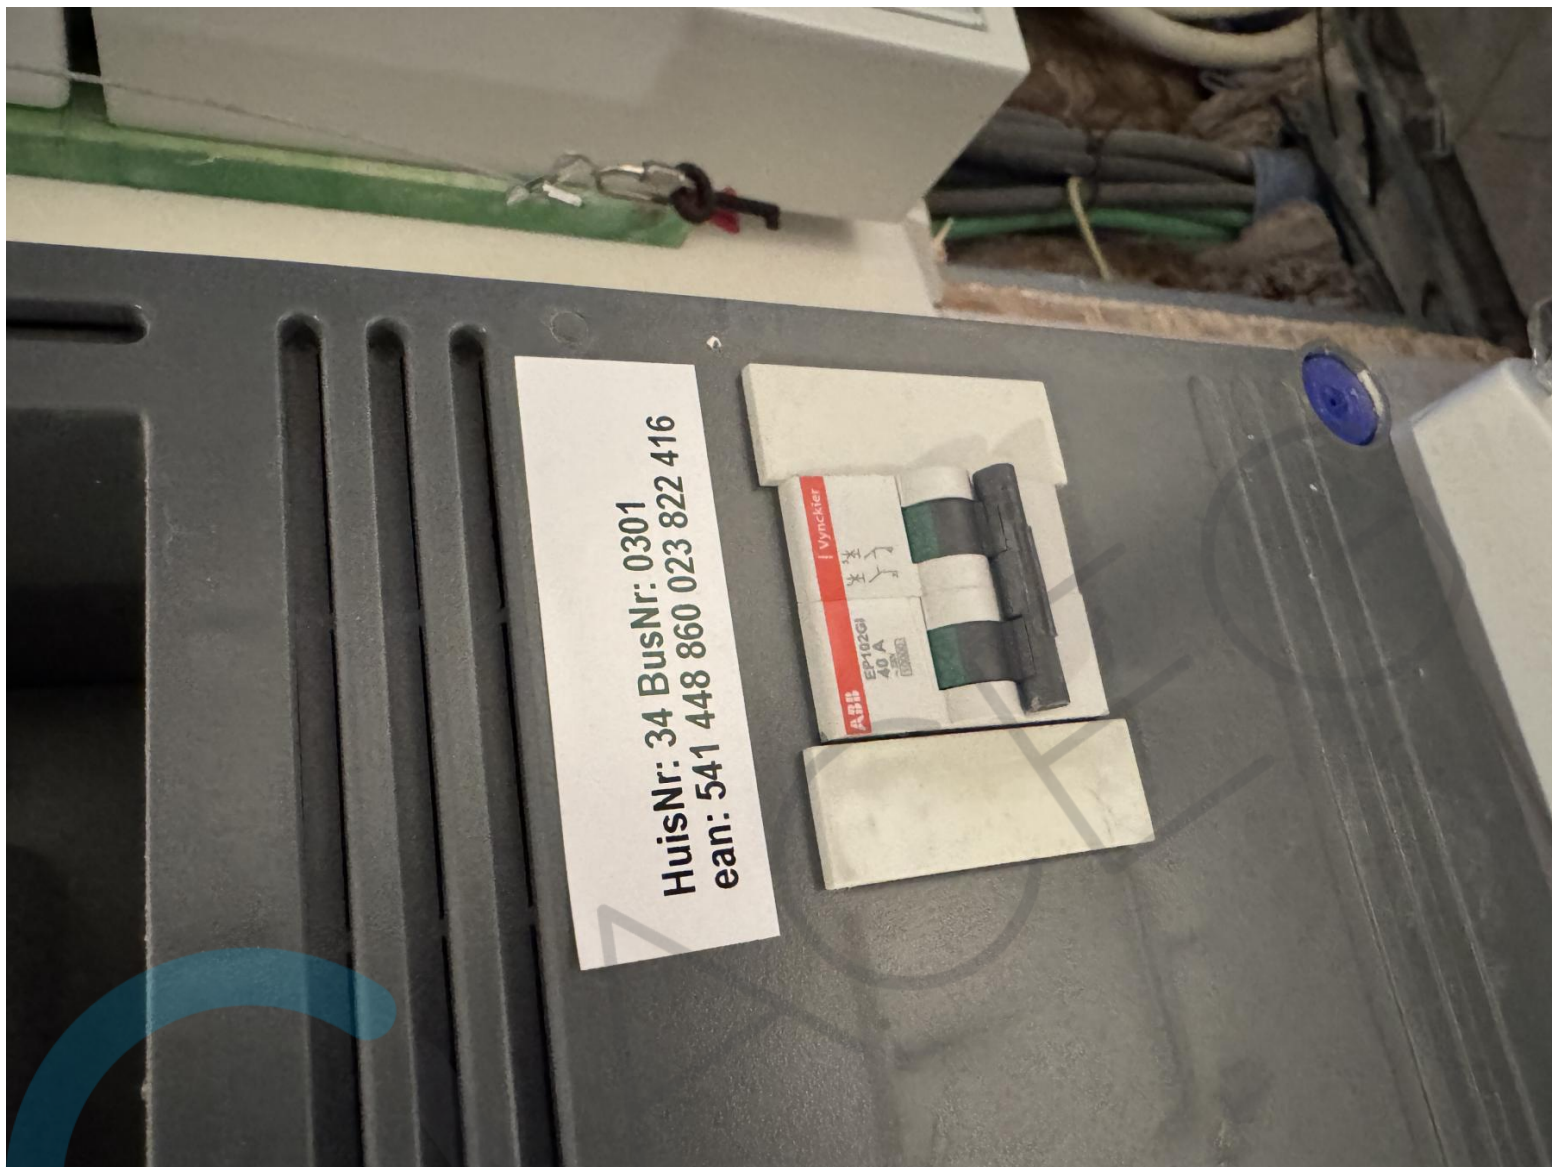

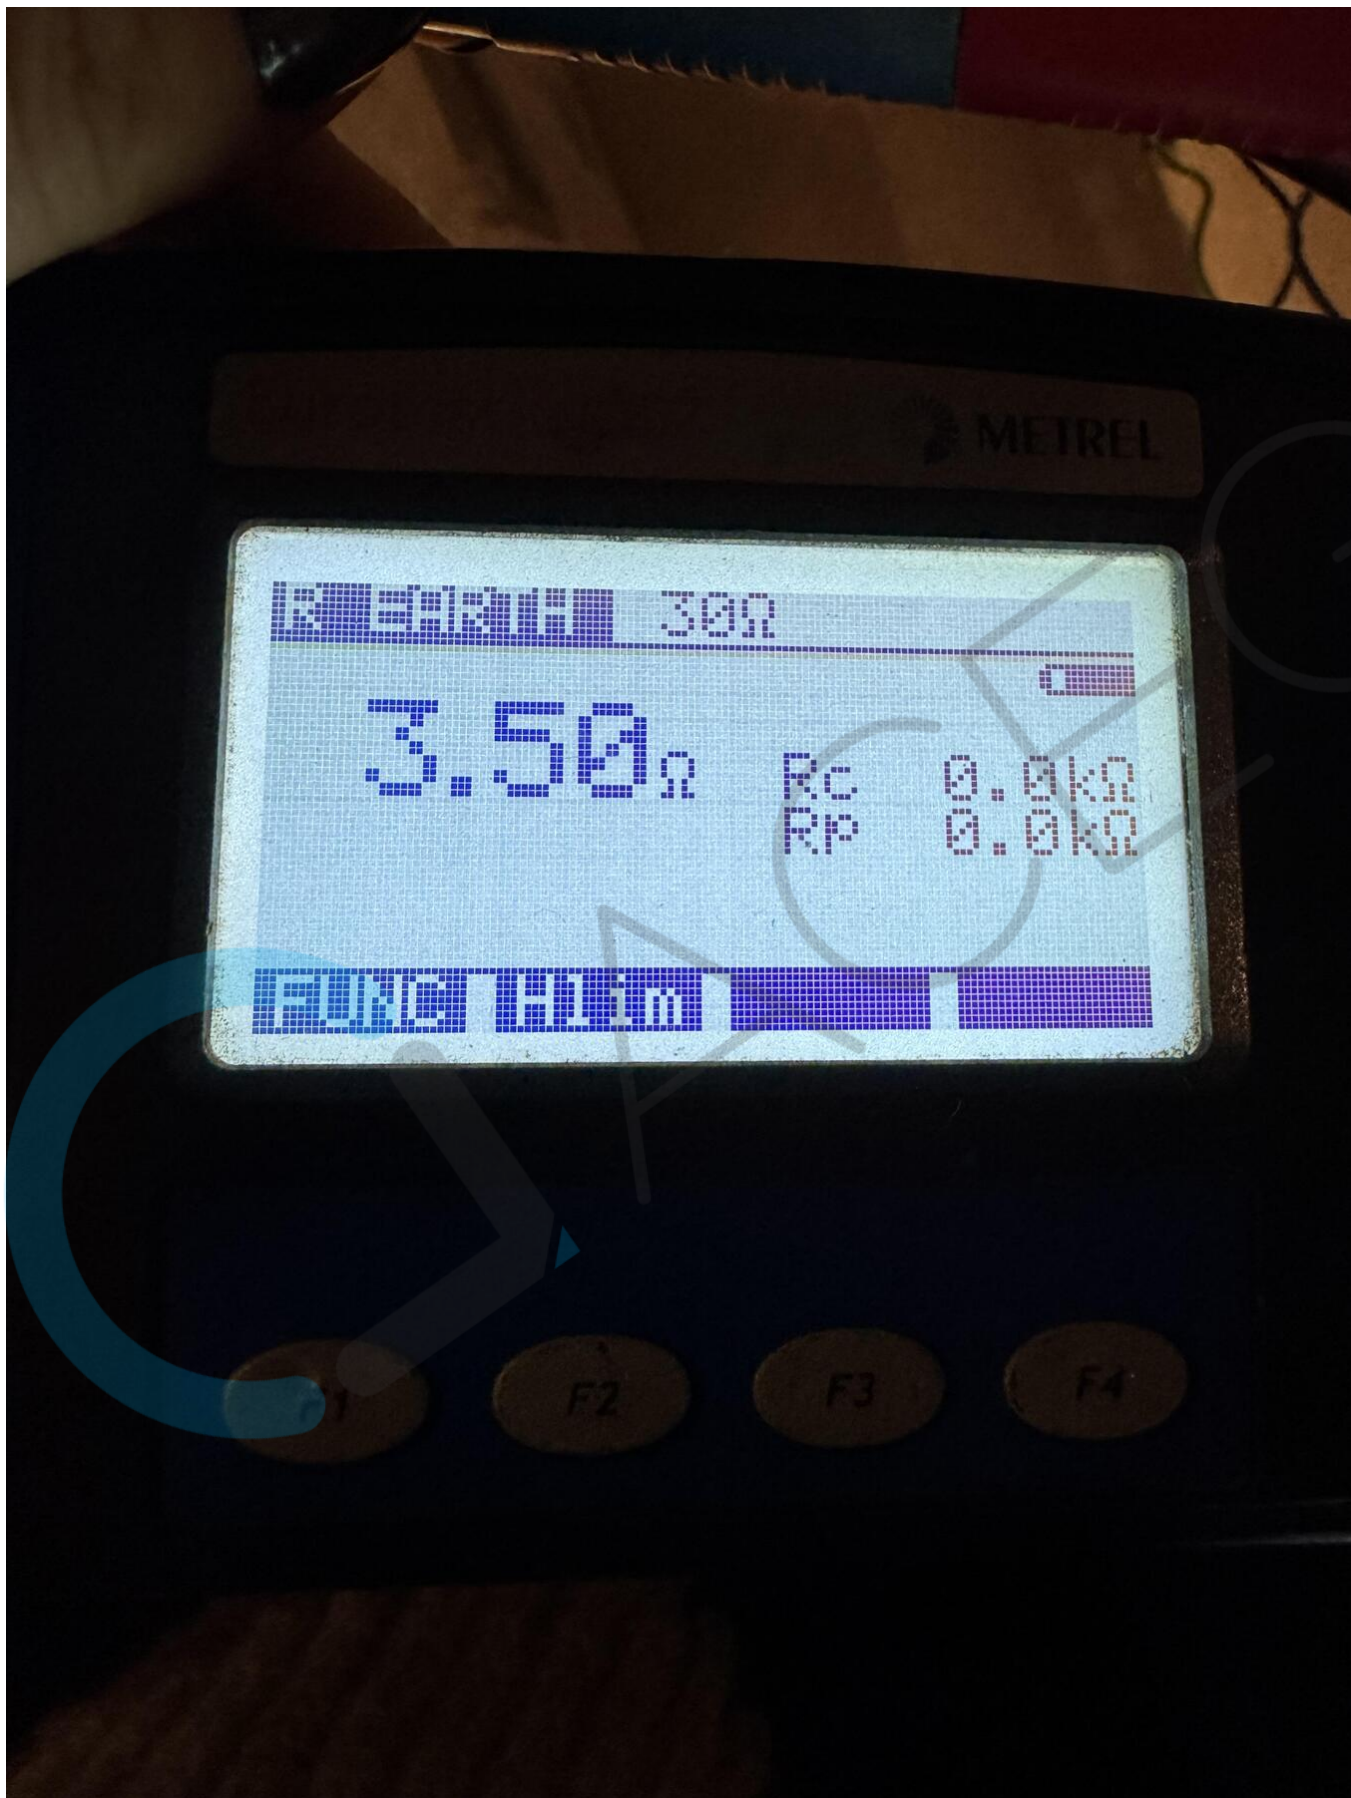



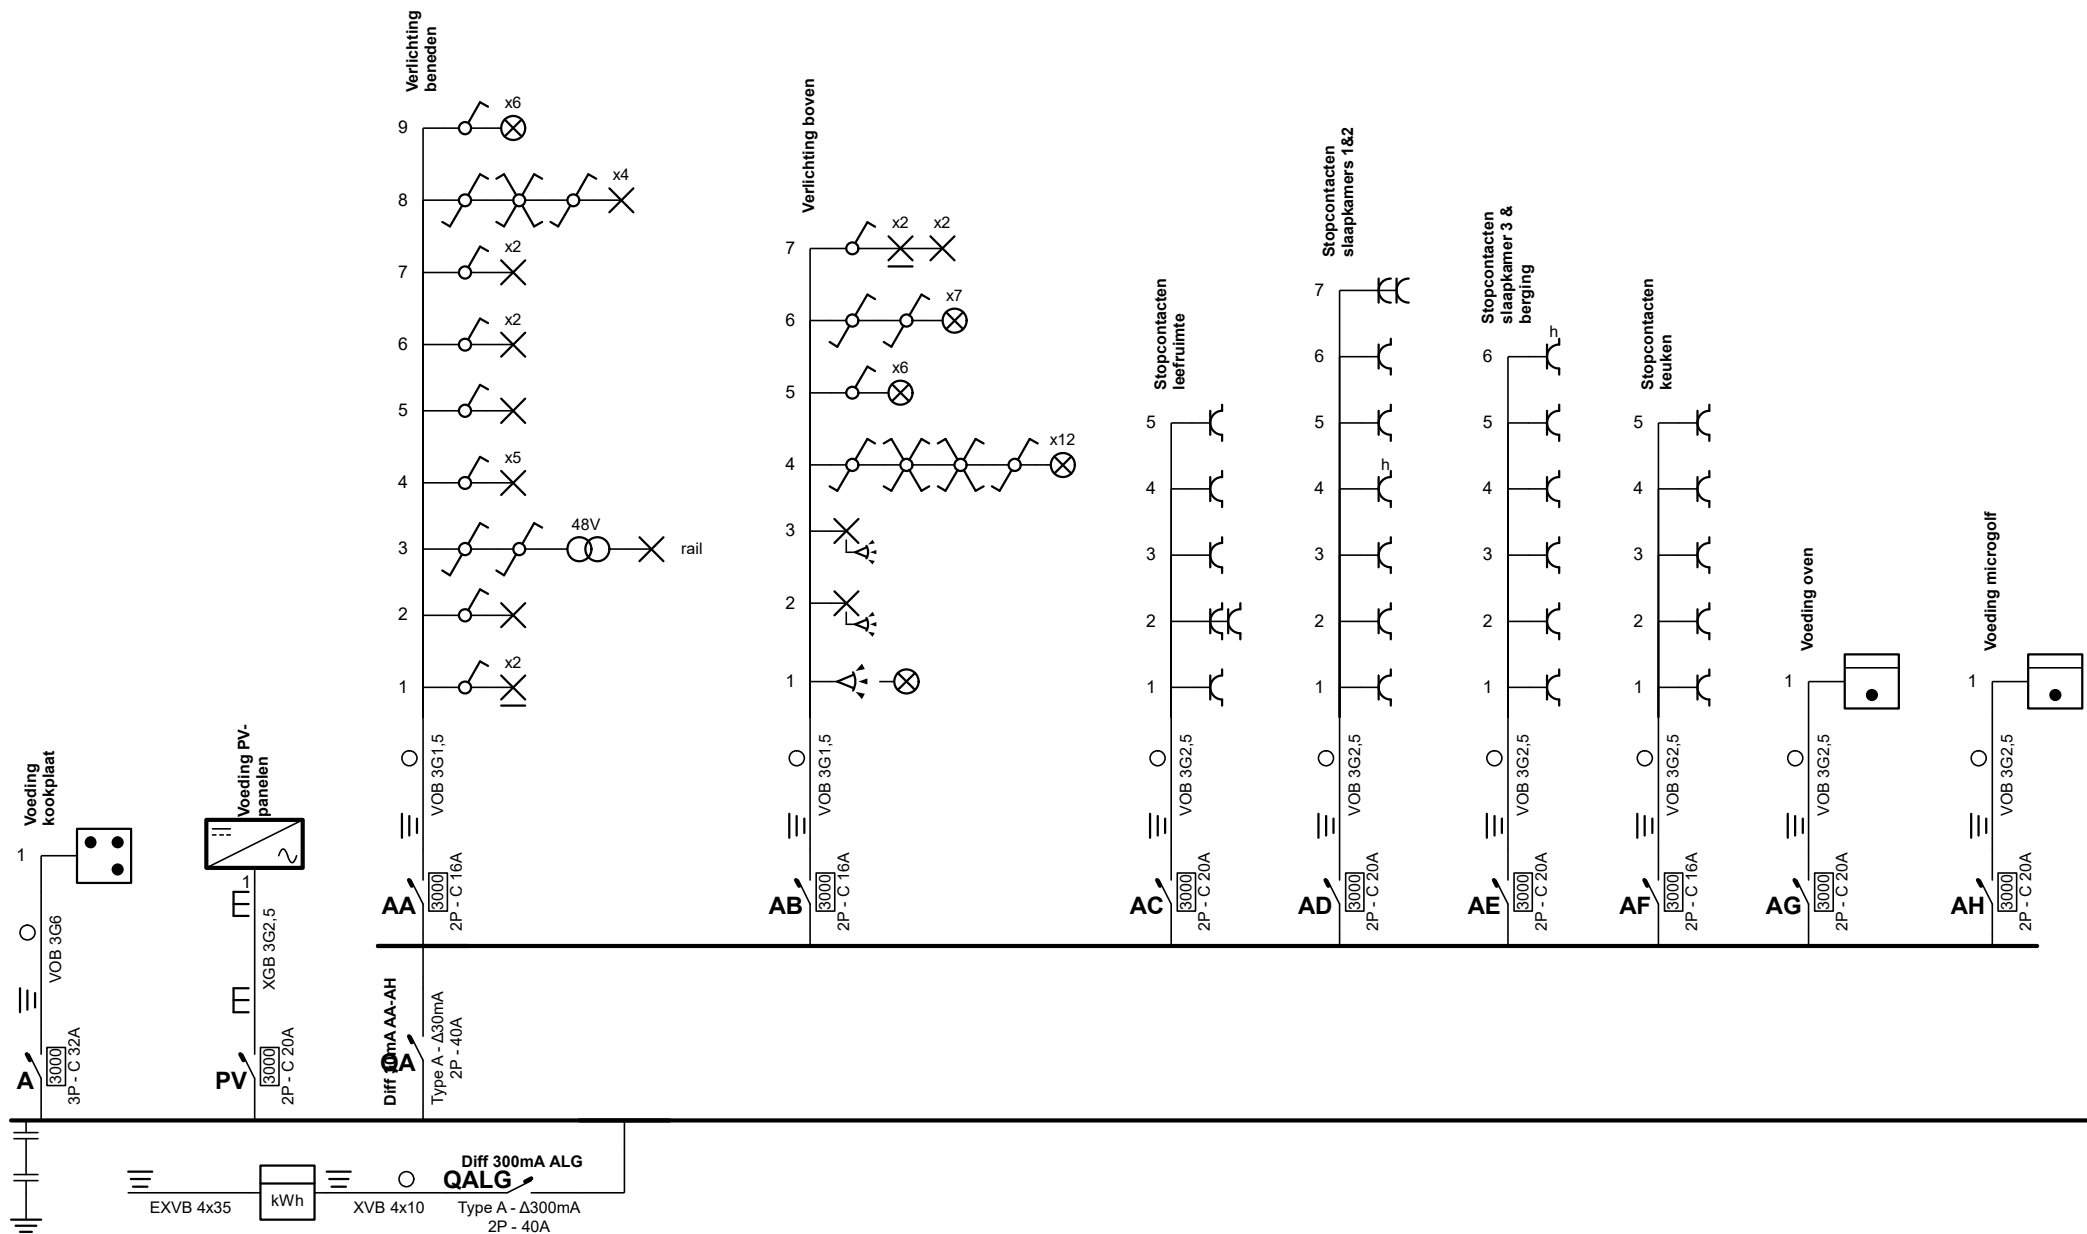

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

11/03/2025

Stephanie Sevens

Stephanie Sevens ACEG VZW #158

Plaats van de elektrische installatie
BV Merus
Dr. Verdumenstraat 34 Bus 301
9100 Sint-Niklaas


EAN 541448860023822416

WILLIAM VALENCYN

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING

p. 1/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Alg. elektriciteitswerken William Valencyn BVBA - BTW BE 0684.700.927

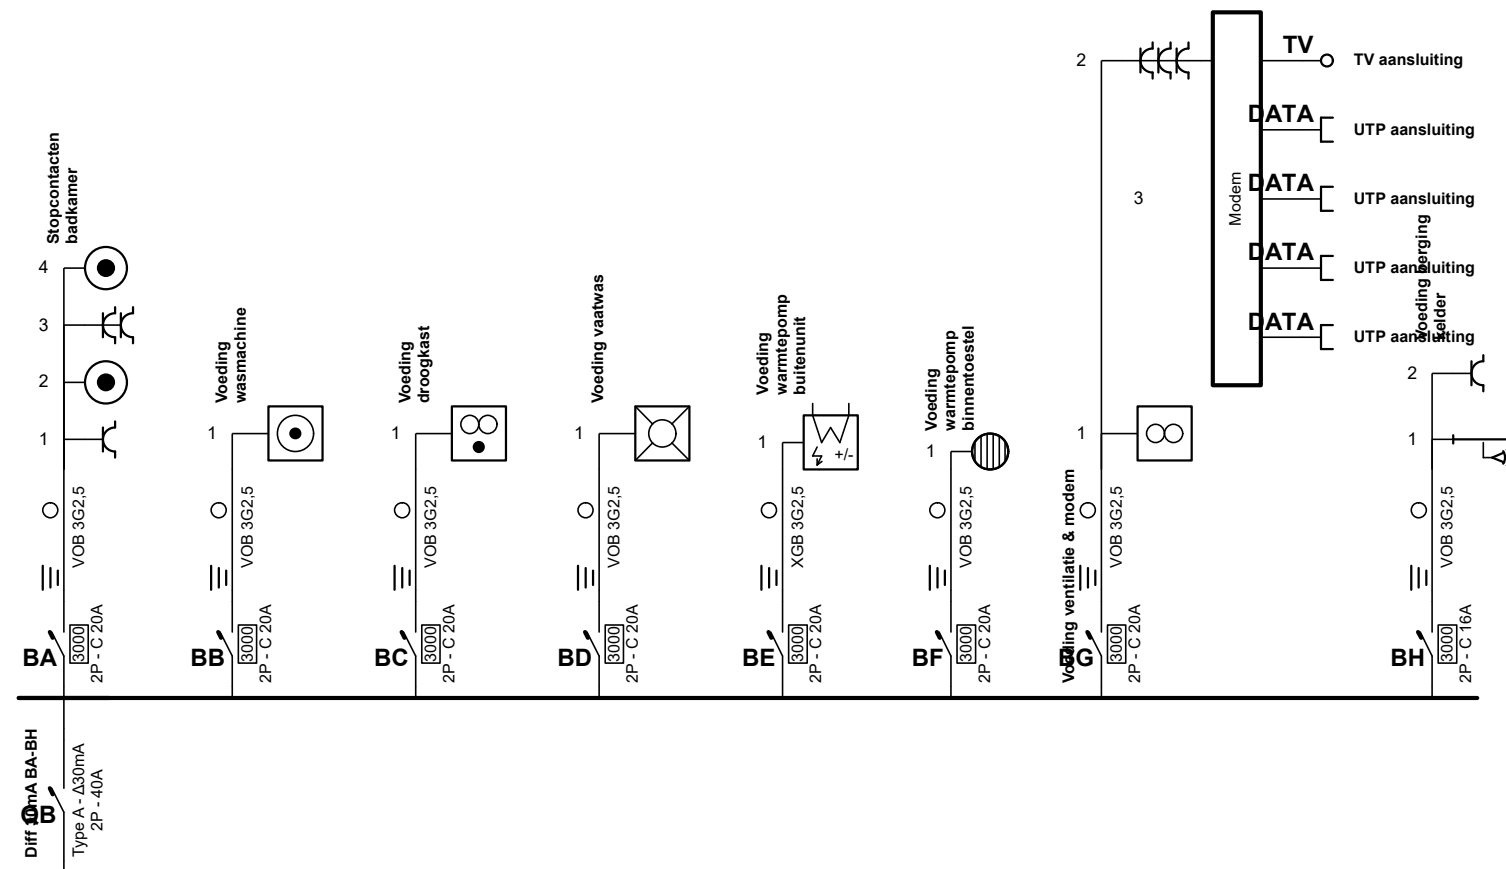

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
BV Merus
Dr. Verdumenstraat 34 Bus 301
9100 Sint-Niklaas


EAN 541448860023822416

WILLIAM VALENCYN

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING

p. 2/5
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: **Alg. elektriciteitswerken William Valencyn BVBA - BTW BE 0684.700.927**

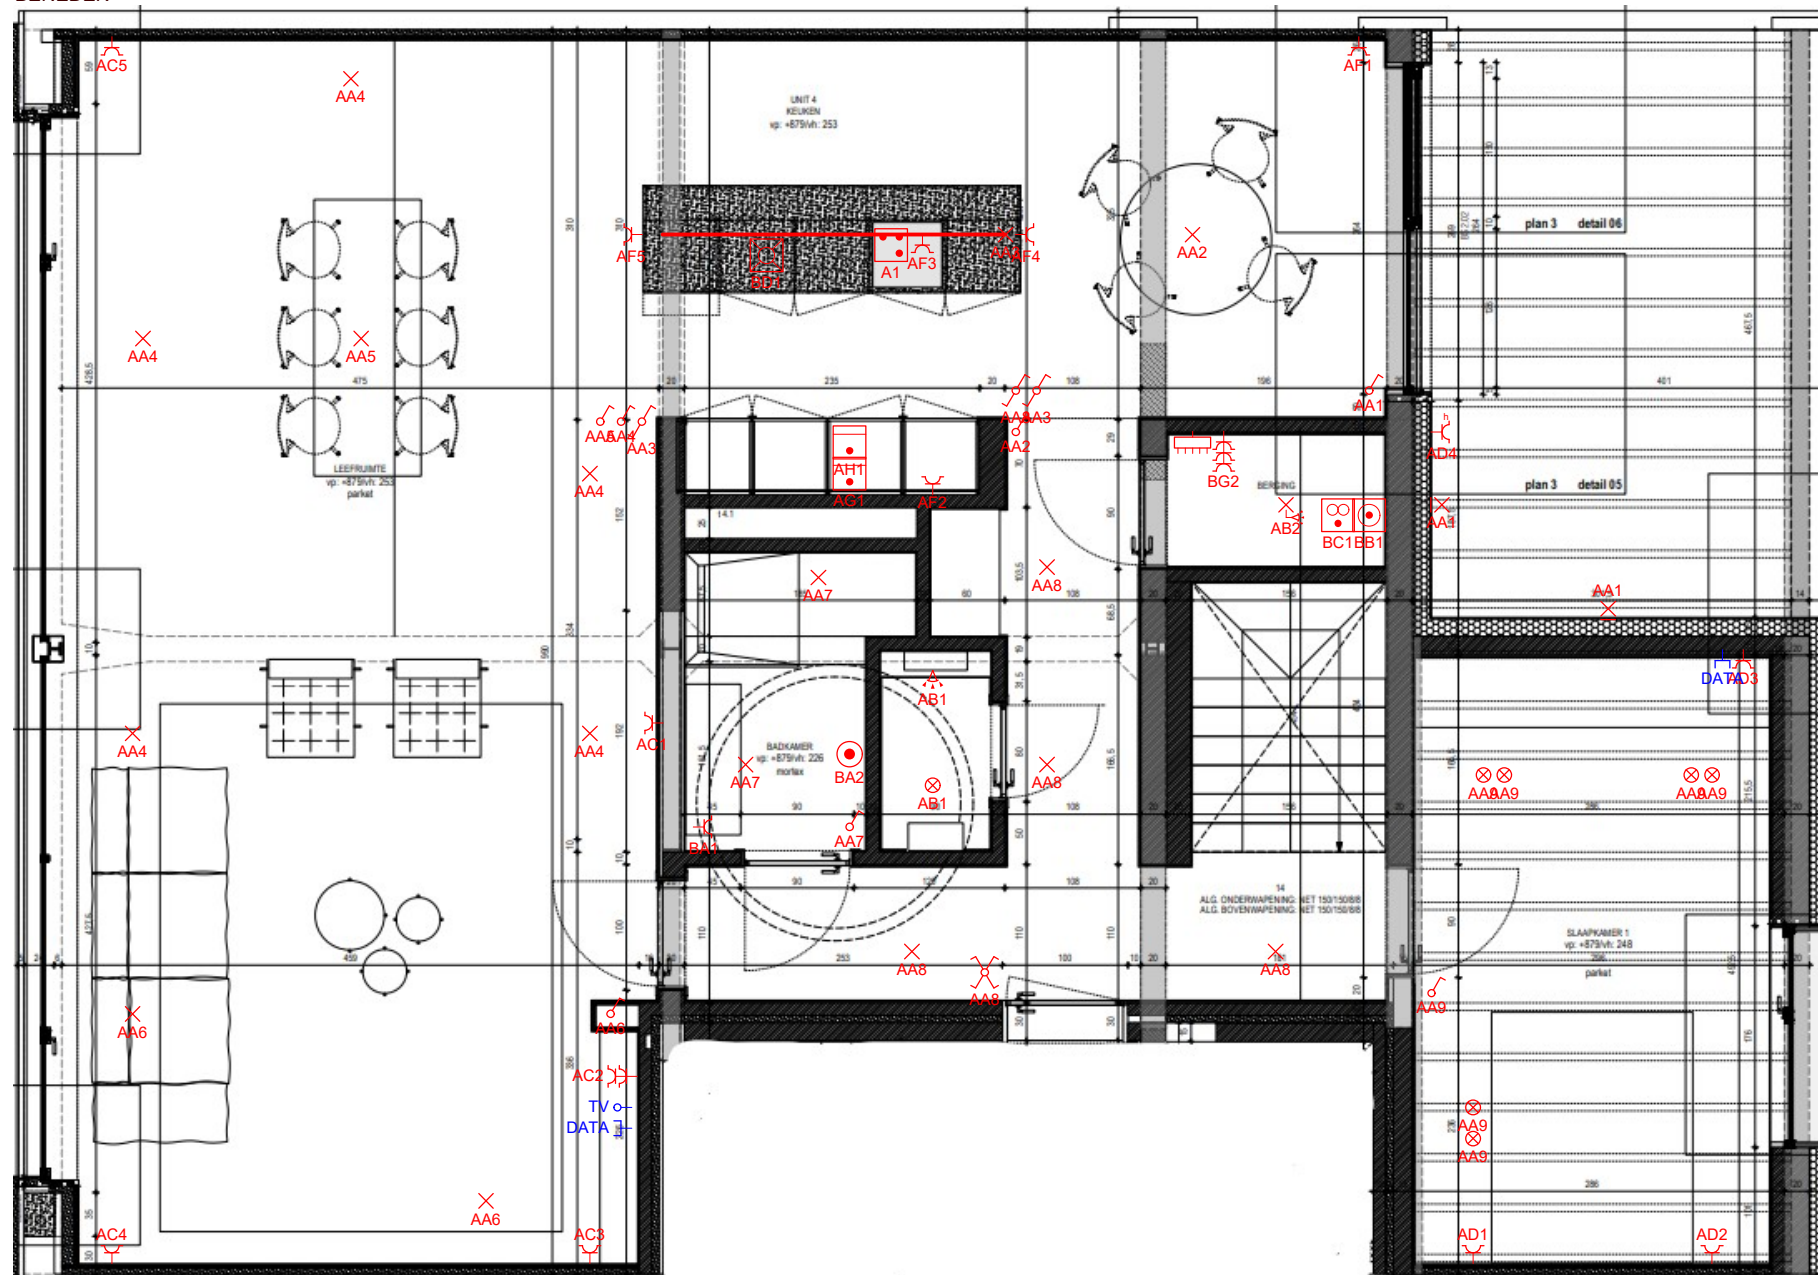

Erkend Organisme
 ACEG
 Romeinsesteenweg 524 / 28b
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
 BV Merus
 Dr. Verdumenstraat 34 Bus 301
 9100 Sint-Niklaas

 EAN 541448860023822416

**WILLIAM
 VALENCYN**

ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
 NIEUWBOUW - VERBOUWING - HERSTELLING

p. 3/5
Situatieplan
 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's getekend door: Alg. elektriciteitswerken William Valencyn BVBA - BTW BE 0684.700.927

QALG	Diff 300mA ALG
A	Voeding kookplaat
PV	Voeding PV-panelen
QA	Diff 30mA AA-AH
AA	Verlichting beneden
AB	Verlichting boven
AC	Stopcontacten leefruimte
AD	Stopcontacten slaapkamers 1&2
AE	Stopcontacten slaapkamer 3 & berging
AF	Stopcontacten keuken
AG	Voeding oven
AH	Voeding microgolf
QB	Diff 30mA BA-BH
BA	Stopcontacten badkamer
BB	Voeding wasmachine
BC	Voeding droogkast
BD	Voeding vaatwas
BE	Voeding warmtepomp buitenunit
BF	Voeding warmtepomp binnentoestel
BG	Voeding ventilatie & modem
TV	TV aansluiting
DATA	UTP aansluiting

BH	Voeding berging kelder
-----------	------------------------

Erkend Organisme
ACEG
Romeinsesteenweg 524 / 28b
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Plaats van de elektrische installatie
BV Merus
Dr. Verdurnenstraat 34 Bus 301
9100 Sint-Niklaas

EAN 541448860023822416



p. 5/5
Lijst Kringen
2 x 230V ~ 50Hz
