

Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Slège social

57 rue Haute Vole, 4537 Verlaine 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

Siège d'exploitation Siège d'exploitation

3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen

Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tél.

(+32) 02 88 02 171

E-mall

Site Internet

info@certinergie.be www.certinergie.be

Nambro de circuite



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

ADRESSE DU CONTRÔLE

DATE DU CONTRÔLE

31/12/2019

Rue de l'Hôpital 42 - 6200 Châtelet

AGENT VISITEUR

Benjamin Grossen


TYPE DE CONTRÔLE Visite périodique (Art. 271)

TVA BE0536501654

RÉF. 51/2019/84177/01:1





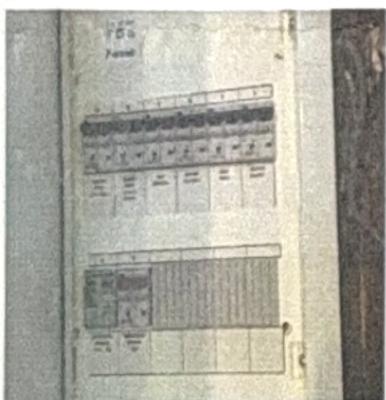

DONNÉES GÉNÉRALES

Rue de l'Hôpital 42 - 6200 Châtelet Adresse de l'installation Unité d'habitation (maison) Type de locaux Angelini Analisa Propriétaire non communiqué Responsable des travaux Art. 271bis Dérogations applicables/appliquées Revisite Certinergie Revisite Certinergie 51/2019/81315/01 Références du PV précédent

DONNÉES DU RACCORDEMENT

OV I

| Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) | ORES ASSETS |
|---|----------------------------|
| Code EAN | non communiqué |
| Numéro du compteur | 6035891 |
| Index jour/nuit | 67833,5/ |
| Type de raccordement | aérien |
| Câble compteur - tableau | XVB 4 x 10 mm ² |
| Tension nominale de service | 230V - AC |
| Courant nominal de la protection de branchement | 40A |

CONTRÔLE

| Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) | de position OK | Nombre de tableaux 2 | Nombre de circuits 10 |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|
| Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s) | | | |
| Les fondations datent | D'avant le 1/10/1981 | Dispositif différentiel de tête | ID - 40A - 300mA - type A - test OK |
| Prise de terre | Piquets | Dispositif différentiel "sdb" | ID - 40A - 30mA - type A - test OK |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) | 15,41 | Raccordement | OK |
| Conformité des liaisons équipotentielles et des PE | ок | Eclairage/machines | ок |
| Test de continuité | Concluant | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles | OK |
| Contrôle boucle de défaut | Concluant | Protection contre les contacts directs | ок |
| Protection contre les contacts indirects | OK | Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ) | 5,38 |
| | | | |

CONCLUSION : CONFORME



Nombre de tableaux

A la date du 31/12/2019, l'installation électrique de Rue de l'Hôpital 42 - 6200 Châtelet est conforme au Règlement Général des Installations Electriques. Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes. Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le 31/12/2044.

Signature de l'agent

