

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: abazaj12345@gmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6272148
Voorl. verslagnr.:
Datum: 31/05/2024



Klant / Opdrachtgever:

Berisa Mehmed
Windmolenstraat 157
2660 HOBOKEN - ANTWERPEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 430 AKCAOGLU ATILLA
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Berisa Mehmed Adres: Windmolenstraat 157 2660 HOBOKEN
Installateur/verantw. werk: Naam: Berisa Mehmed Adres: Windmolenstraat 157 2660 HOBOKEN B.T.W.:
Adres installatie: BERISA MEHMED WINDMOLENSTRAAT 157 HOBOKEN - Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Niet vermeld Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: 2526616 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☐ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: niet toegepast

Datum: 31/05/2024 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2049

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 3 doorsnede: 6 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéendraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 13

Zie schema's in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 34 MOhm Spreidingsweerstand: 27,11 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

5

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

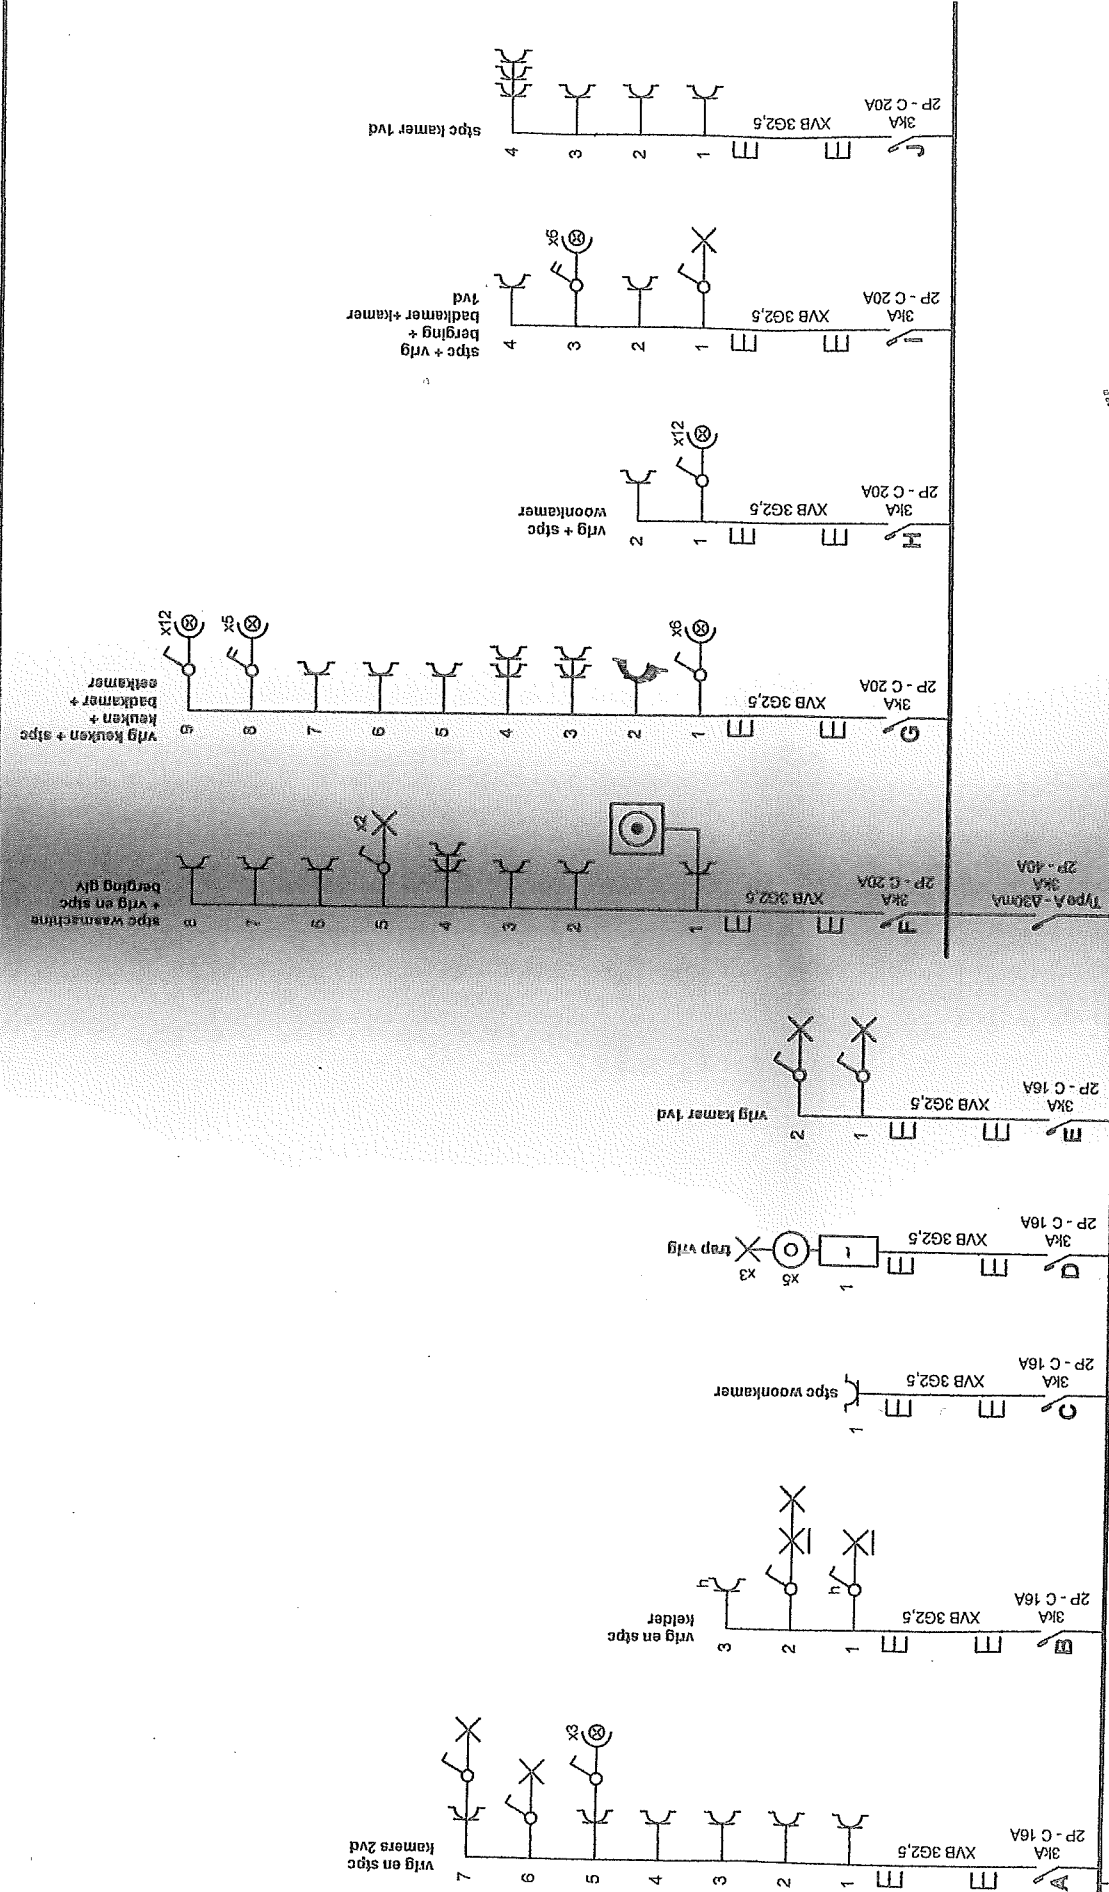

Installatie is gecontroleerd door:
 OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich
 Ontvanger: AKCAOGLU Atilla
 Datum: 31-05-2018
 PV nr.: 6072158
 Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie
 Berisa Mehmed
 Windmolenstraat 157
 2660 hoboken
 GSM: 0487138174
 e-mail: Abazaj12345@gmail.com

p. 1/7
 Eindraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

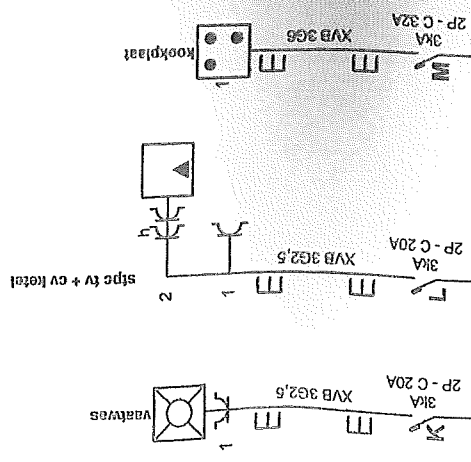

Installatie is gecontroleerd door:
 Installatie is gecontroleerd door:
 Installatie is gecontroleerd door:

OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich

Datum: 31-05-2014

PV nr.: 627214

Handtekening:

Plaats van de elektrische installatie

Berisa Mehmed

Windmolenstraat 157

2660 hoboken

GSM: 0487138174

e-mail: Abazaj12345@gmail.com

p. 217

Eendiraadschema


2 x 230V ~ 50Hz

- A** vrlg en stpc kamers 2vd
- B** vrlg en stpc kelder
- C** stpc woonkamer
- D** trap vrlg
- E** vrlg kamer 1vd
- F** stpc wasmachine + vrlg en stpc berging glv
- G** vrlg keuken + stpc keuken + badkamer + eetkamer
- H** vrlg + stpc woonkamer
- I** stpc + vrlg berging + badkamer +kamer 1vd
- J** stpc kamer 1vd
- K** vaatwas
- L** stpc tv + cv ketel
- M** kookplaat

Plaats van de elektrische installatie
 Berisa Mehmed
 Windmolenstraat 157
 2660 hoboken
 GSM: 0487138174
 e-mail: Abazaj12345@gmail.com

Installateur

p. 717
 Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz

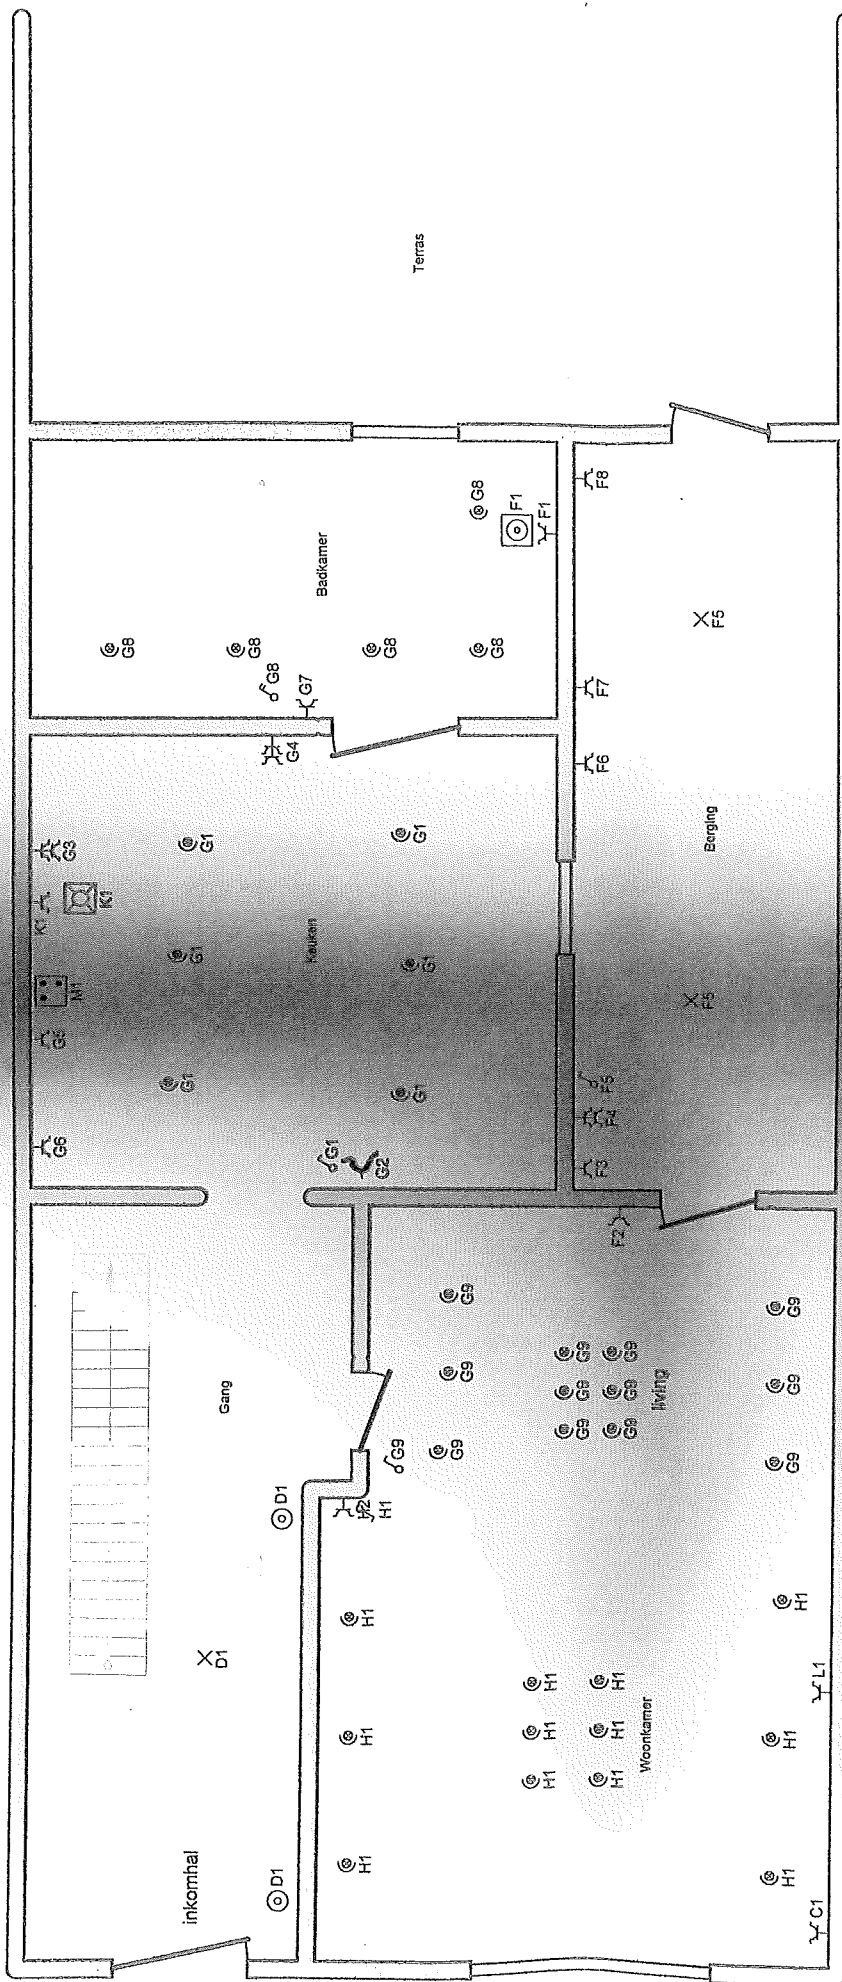


Gelijkvloers

Plaats van de elektrische installatie
 Berisa Mehmed
 Windmolenstraat 157
 2660 hoboken
 GSM: 0487138174
 e-mail: Abaza12345@gmail.com

Installateur

p. 3/7
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

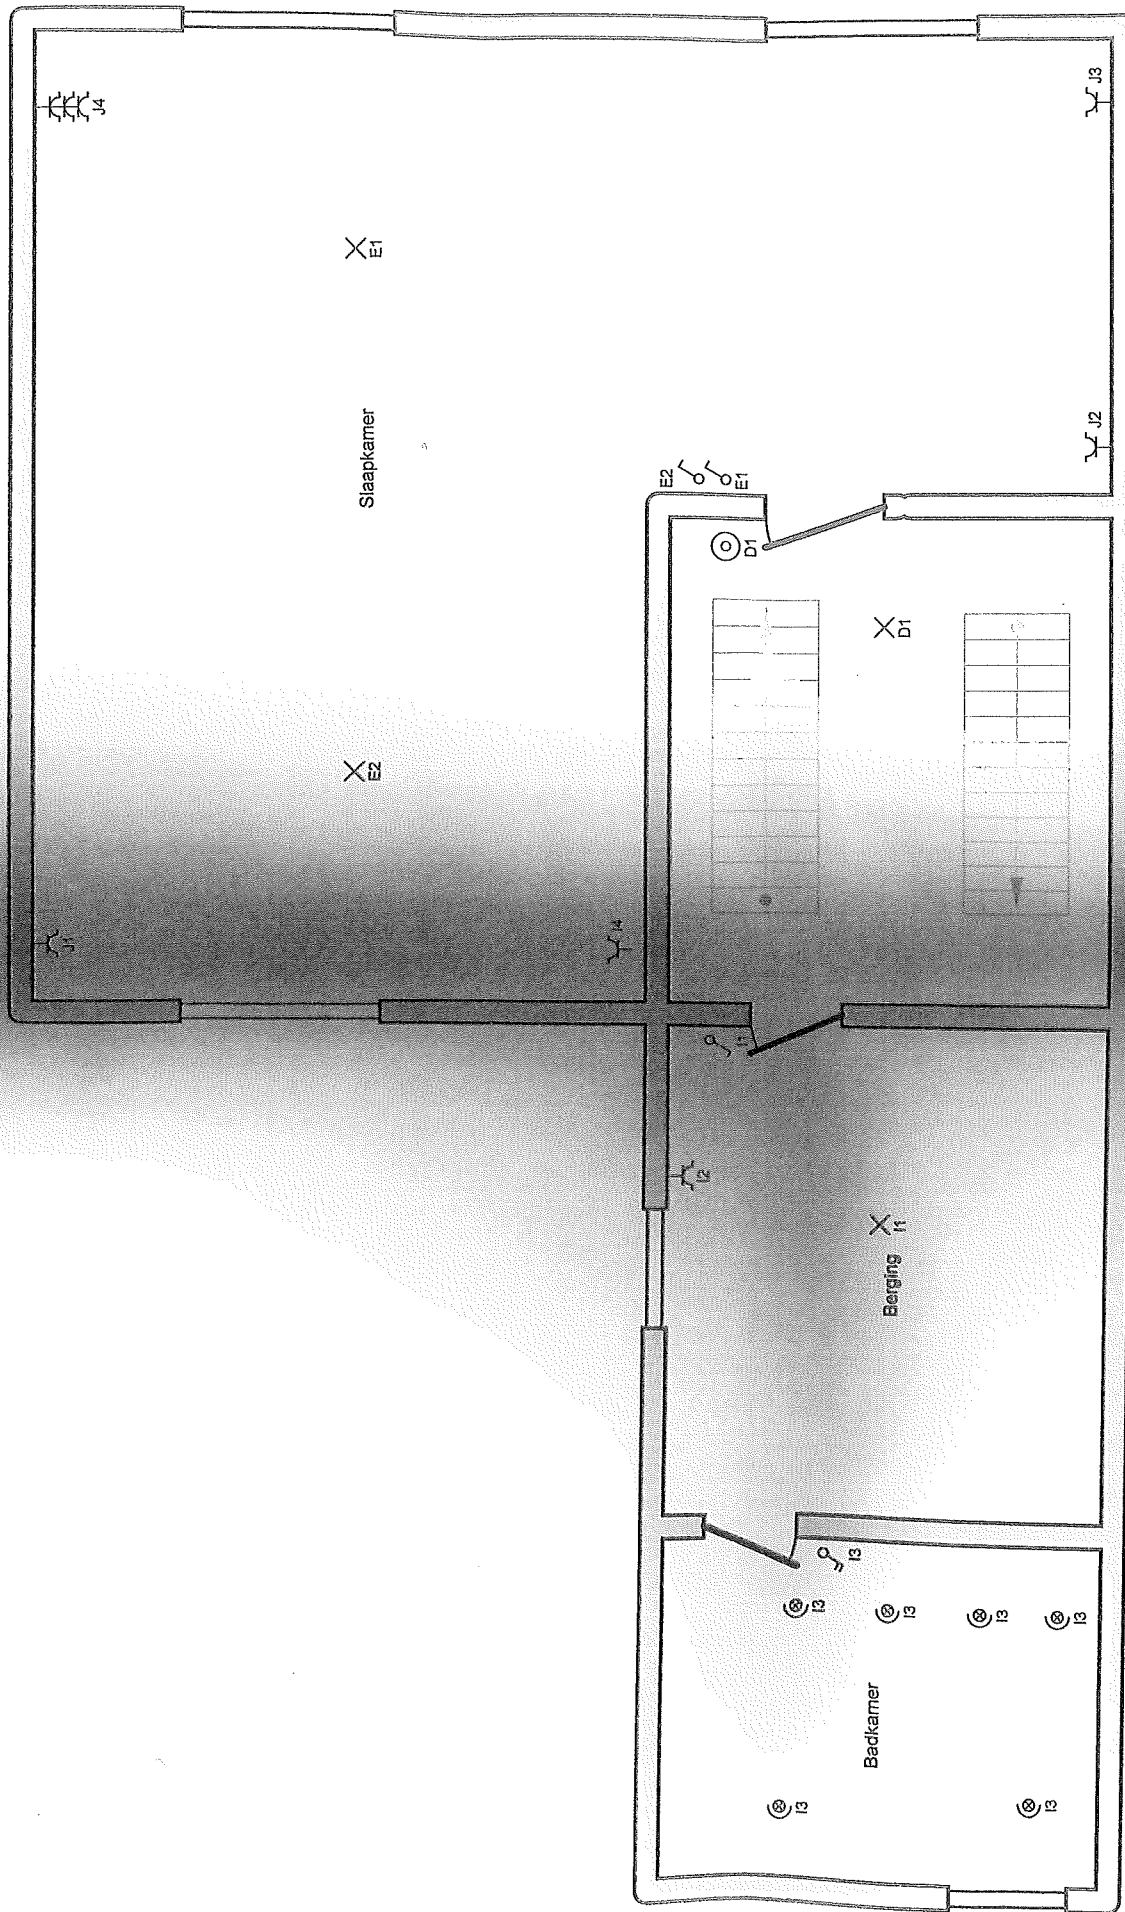


1e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie
 Berisa Mehmed
 Windmolenstraat 157
 2660 hoboken
 GSM: 0487138174
 e-mail: Abazaj12345@gmail.com

Installateur

p. 517
 Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

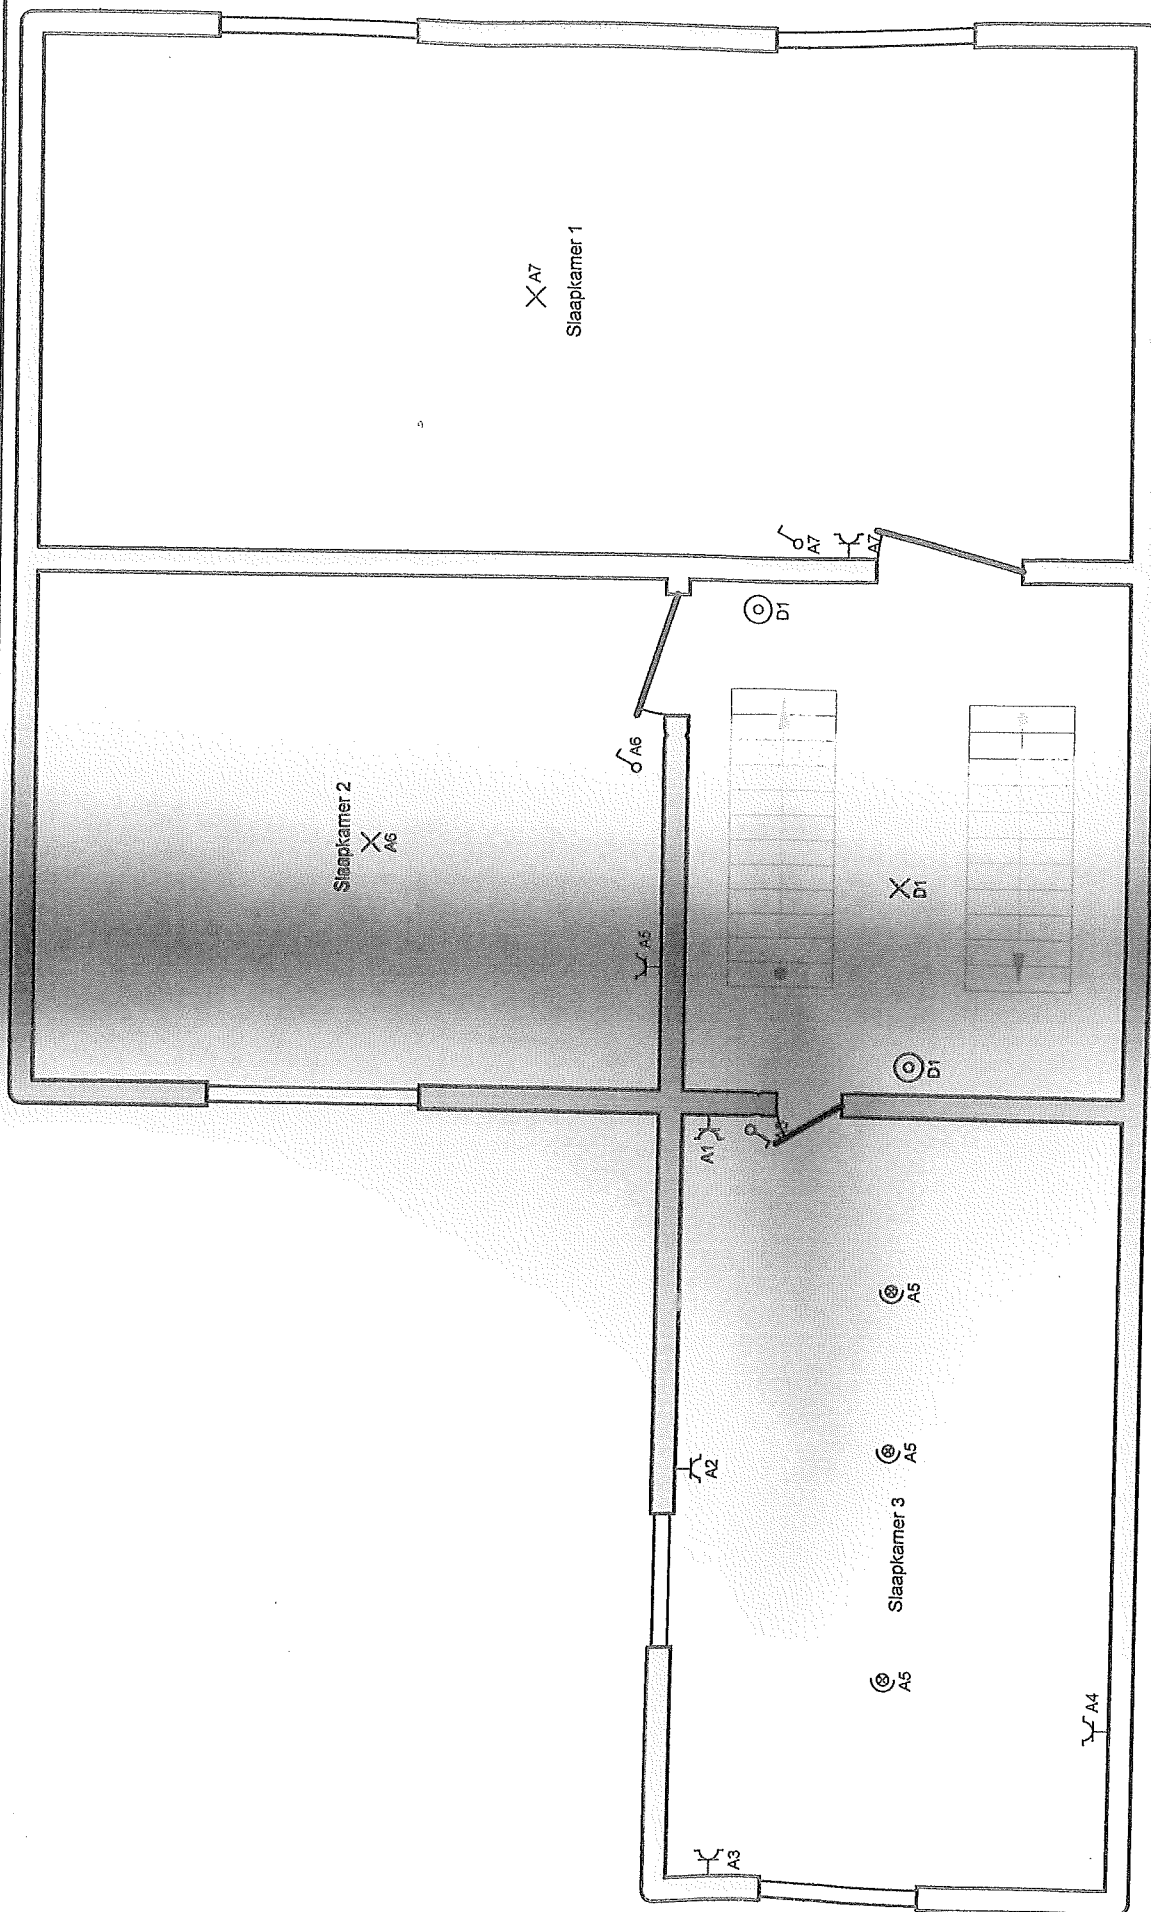

2e Verdieping

Plaats van de elektrische installatie
 Berisa Mehmed
 Windmolenstraat 157
 2660 hoboken
 GSM: 0487138174
 e-mail: Abazaj12345@gmail.com

Installateur

p. 6/7
 Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz
