

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 193/100928/5

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2660 Hoboken

EIGENAAR: Louisalei 74 ghr rechter

Adres: Jan Van de Wereldan 19 Hoboken

OPDRACHTGEVER: Van Camp-Mohs

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 28-9-2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App ghr rechter

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 220 V Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 3 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 22 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: bord kelder = Δ 0,3A 40A type A

2x25A aut- 6mm² VOB

2x10A " 1,5mm² VOB

bord App = Δ 0,3A 40A type A

(8) 2x16A aut- 2,5mm², 1,5mm² VOB

(3) 2x20A " 2,5mm² VOB

2x32A " 6mm² VOB

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen


PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28-9-2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

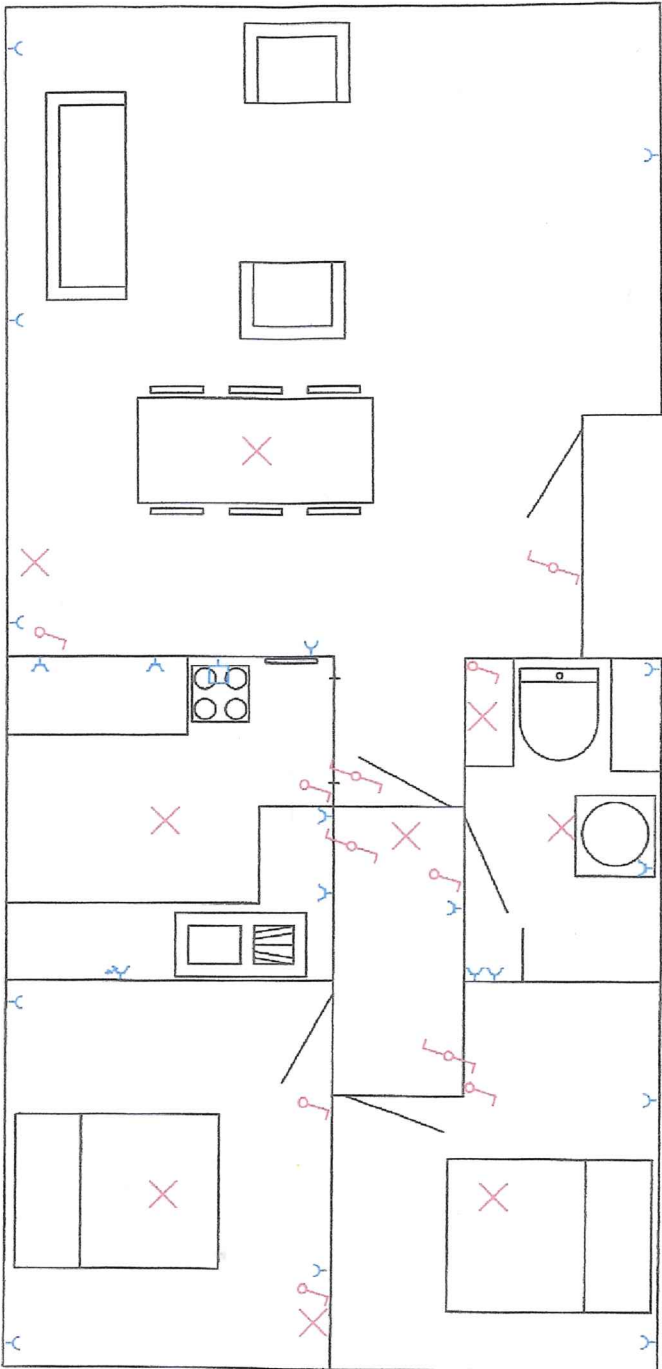

SCHEMA	Klant	Afgevaardigde v/h erkendingsme
Spanning :	Van Camp Noens Louislei 74 2660 Hoboken	Handtekening:
	FOUBERT electro 0473/28 23 88	BT AA 193 28-9-2010
	Fouber t Jurgen Cariet Verstraetensstraat 13 9150 Bezel	

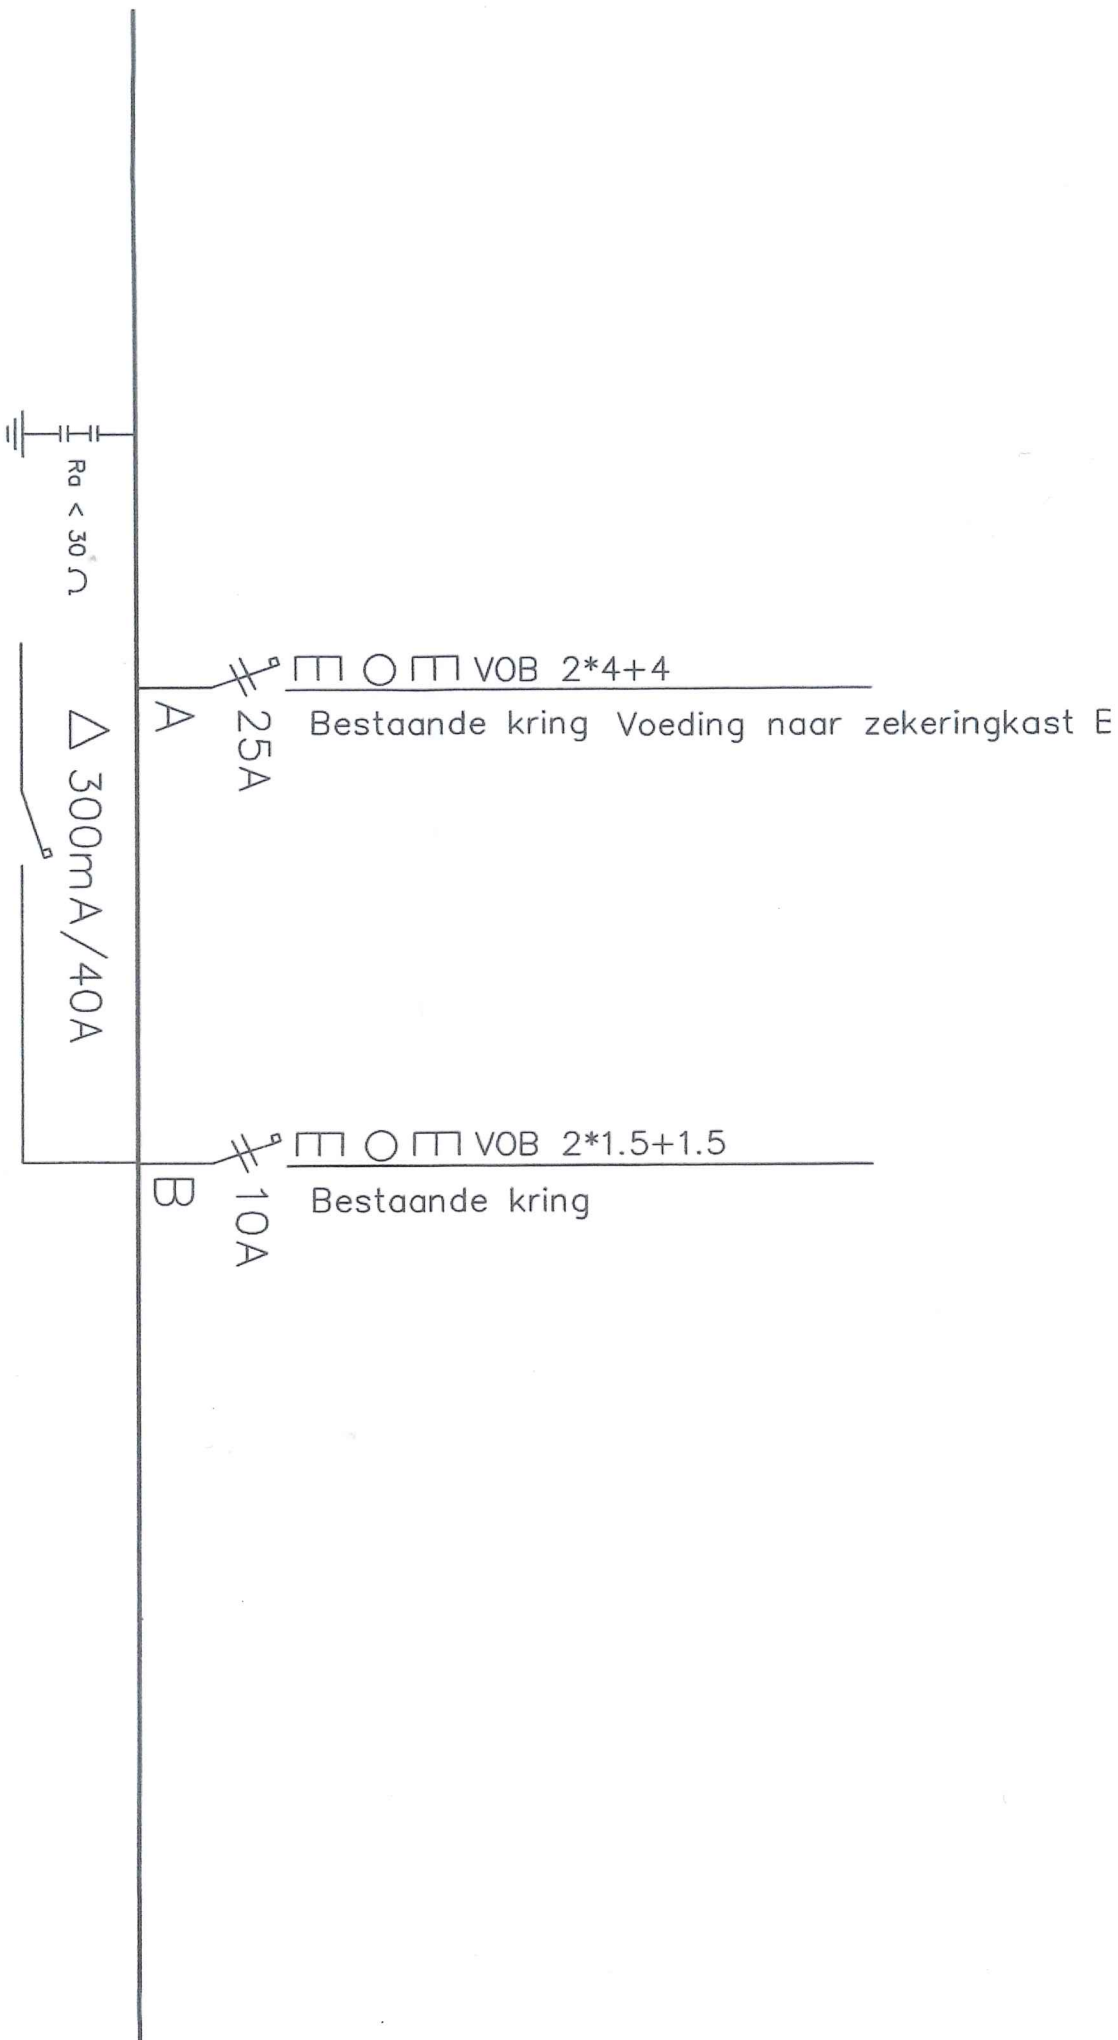

EENDRAADSCHEMA	Klant Van Camp Moens	Afgewaarldigde v/h erkend organisme Handtekening: GTV AA 193 28-9-2010
Spanning : Deel 1 Kast A	 electro FOUBERT 0473/28 23 88 Foubert Jurgen Camiel Verstraetenstraat 13 9150 Bazel	
