

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/12/2019 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: Van Den Brande ELEKTRO BVBA
ID-label: App. Klaverbladreef 2 bus 11 Client reference: IK. nr.:
B.T.W. nr.: BE 664 953 311
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Klaverbladreef
Huisnummer 2
Busnummer 11
Postcode 2660
Gemeente Hoboken
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Klaverbladreef
Huisnummer 2
Busnummer 11
Postcode 2660
Gemeente Hoboken
Land België

Installateur

Naam Van Den Brande ELEKTRO BVBA
BTW nr. BE 664 953 311
Telefoonnummer 0477/77.14.22
E-mail vdb.elektro@telenet.be

Naam contactpersoon Wim Van den Brande
Telefoon 0477/77.14.22
Gsm nr. (SMS)

Teller Nr.: : 67 460 667

Type : appartement

EAN : 54

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 15 Isolatie: 3,63 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 14,03 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	20		3	-
1	C	16		3	-
10	C	20		2	-
3	C	16		2	-

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 2/12/2044
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 6

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE42 7340 3433 2854 - BTW BE0846.351.031


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/12/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

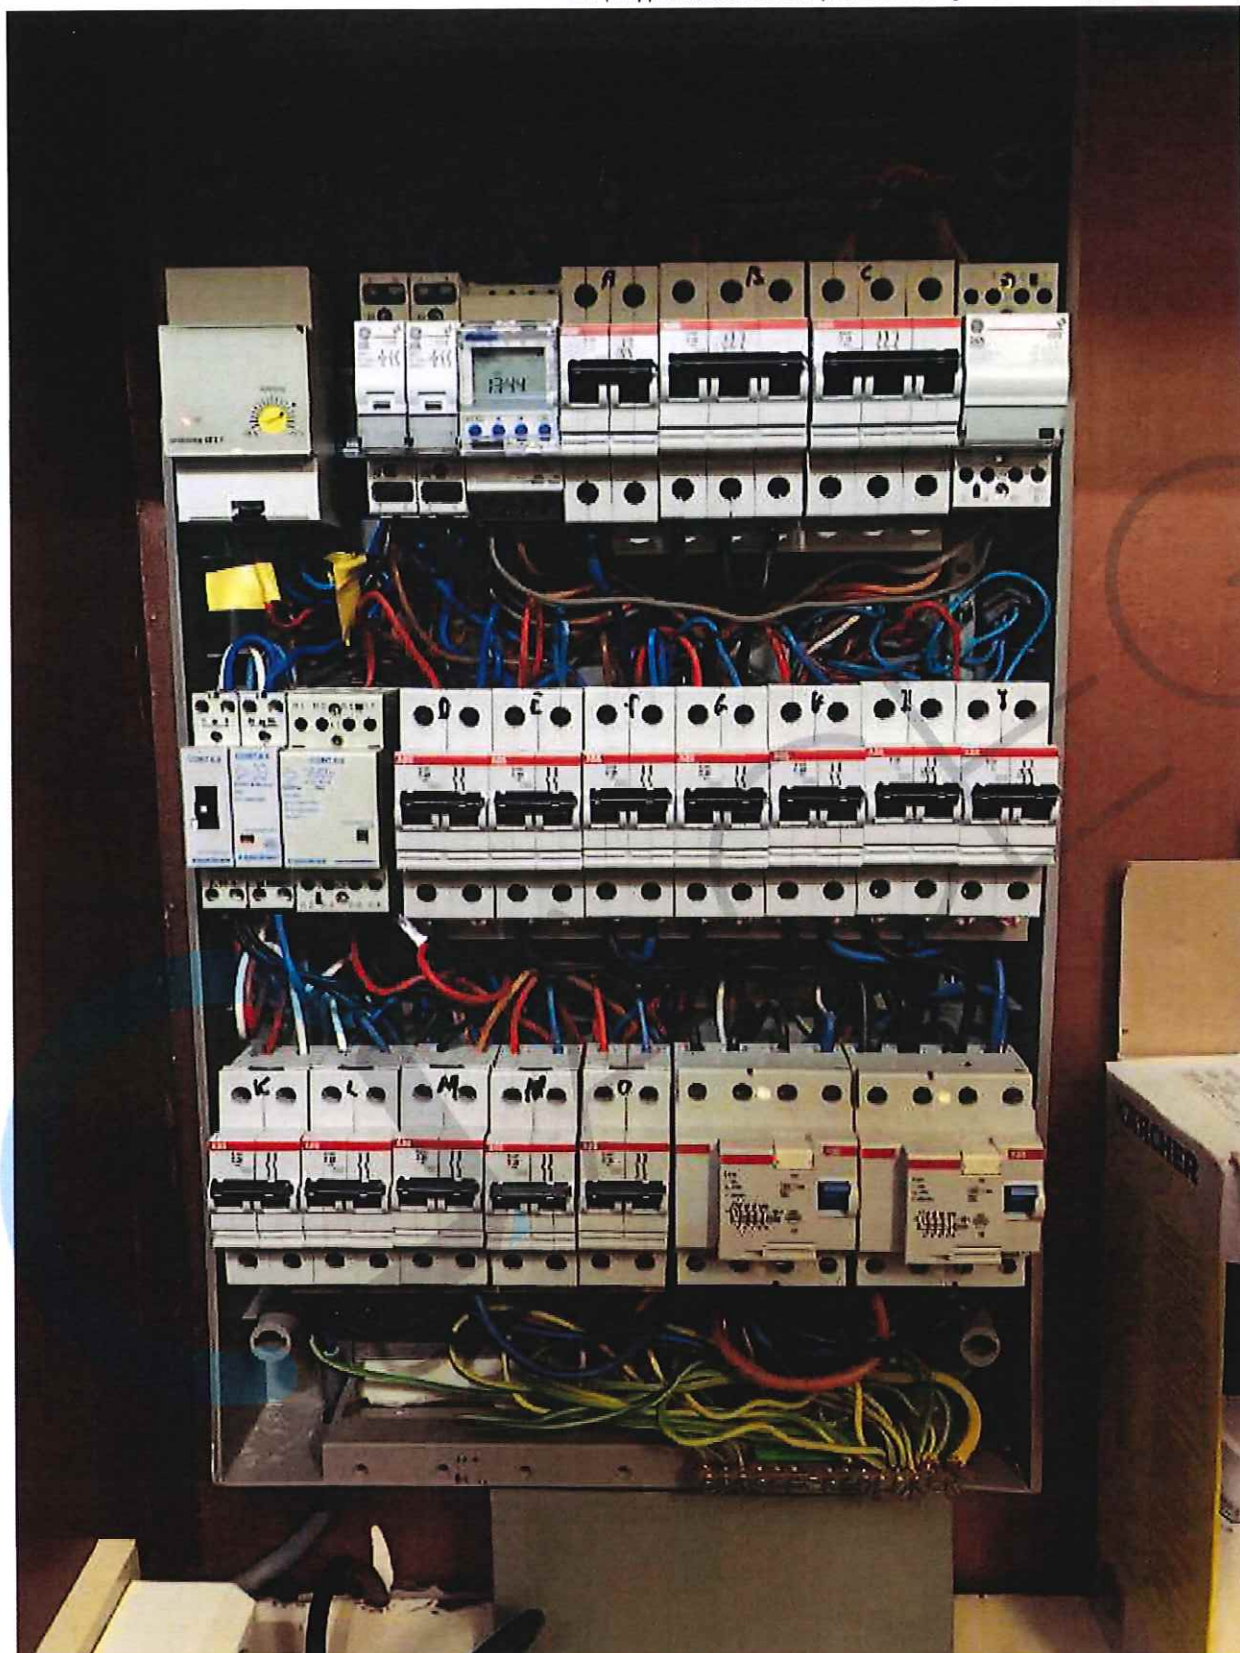


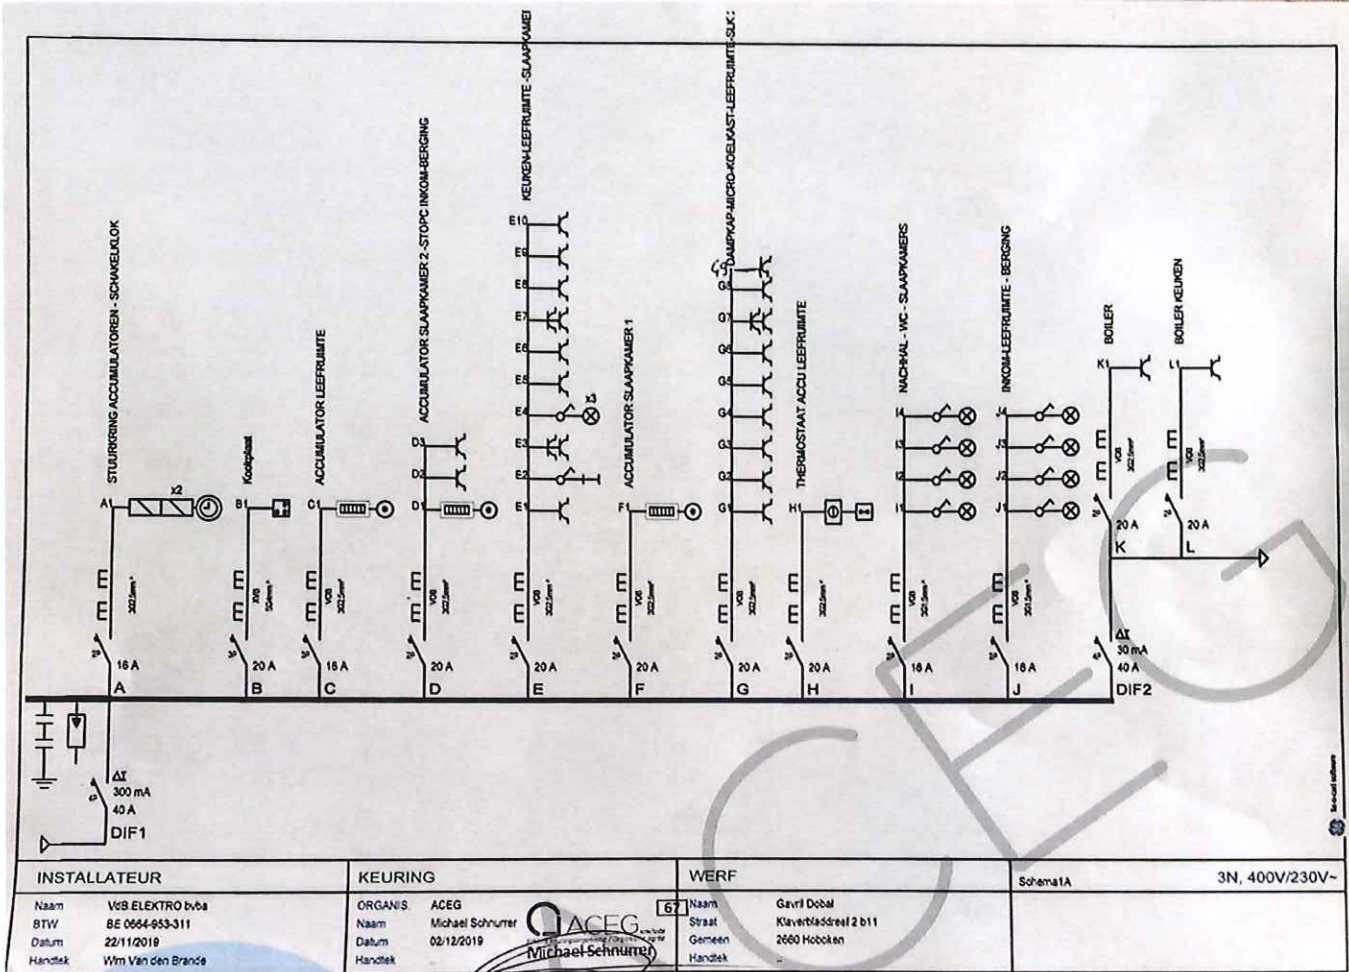

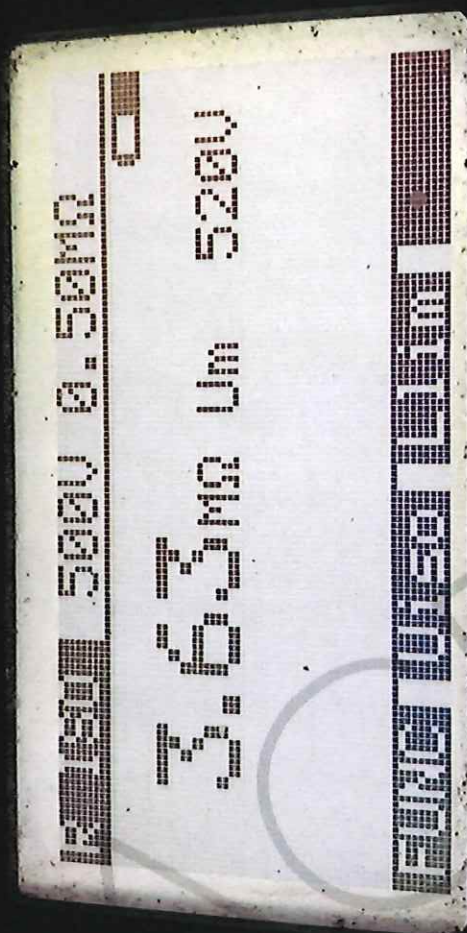



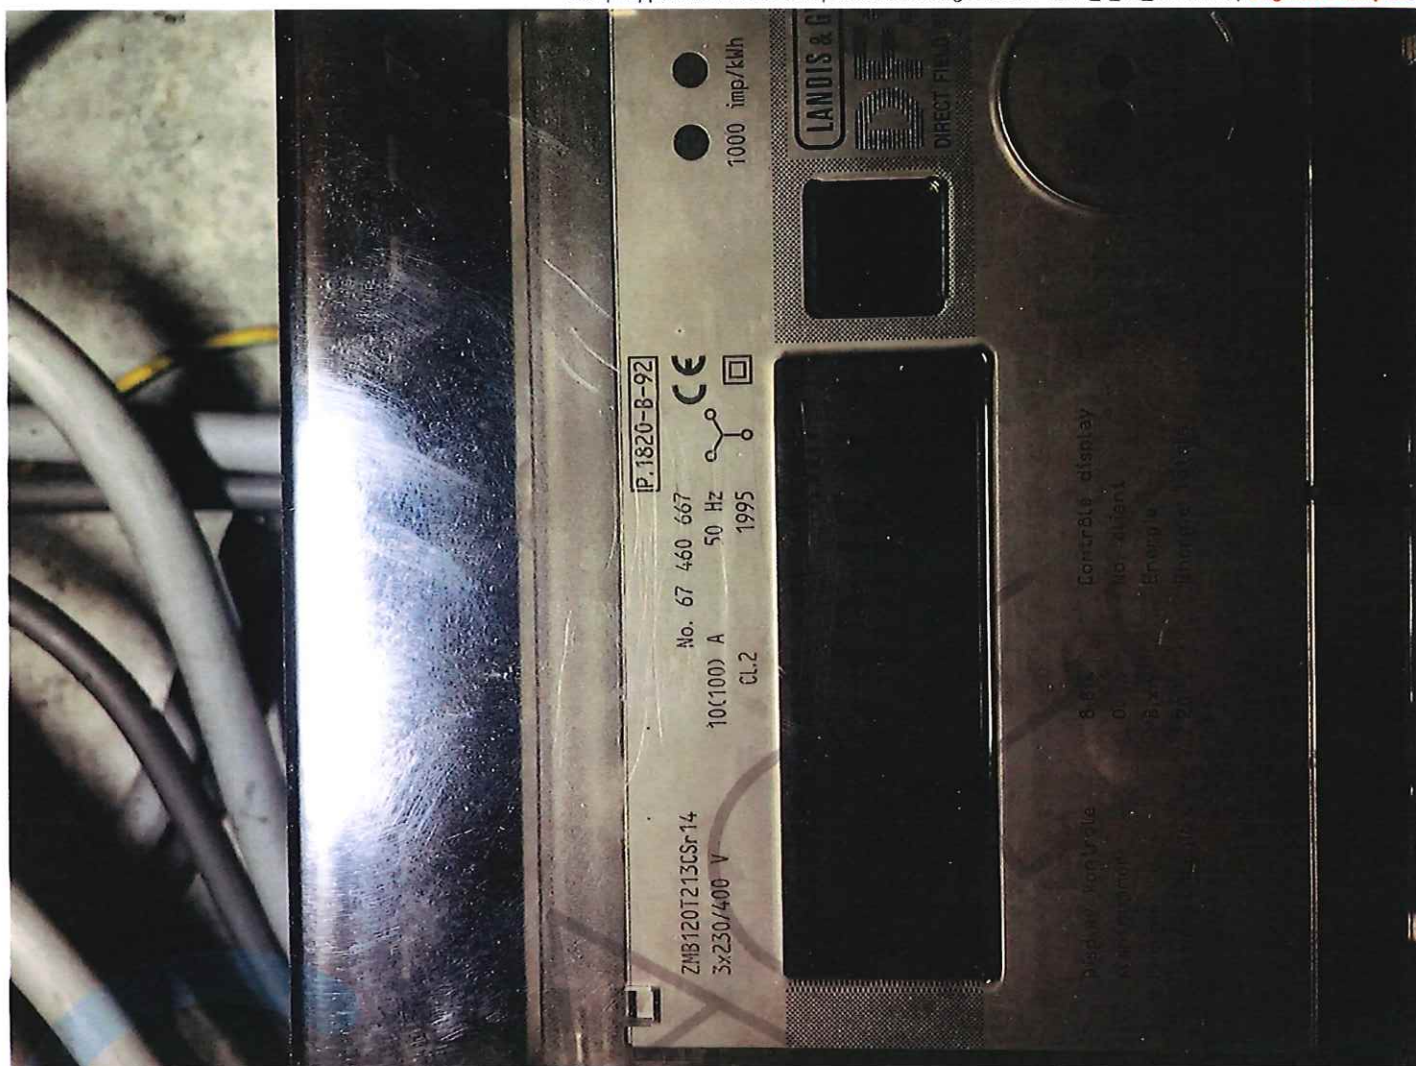




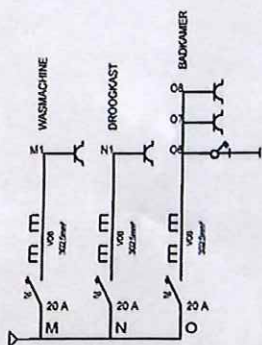



INSTALLATEUR		KEURING		WERF	Schéma 1B	3N, 400V/230V~
Naam V&B ELEKTRO bvba		ORGANIS ACEG		157 Naam	Gevril Dobal Klaverbladdeef 2 b11 2660 Hoboken	
BTW BE 0664-953-311		Naam Michael Schnurter		Straat		
Datum 22/11/2019		Datum 02/12/2019		Gemeente		
Handteek Wm Van den Brande		Handteek Michael Schnurter		Handteek		

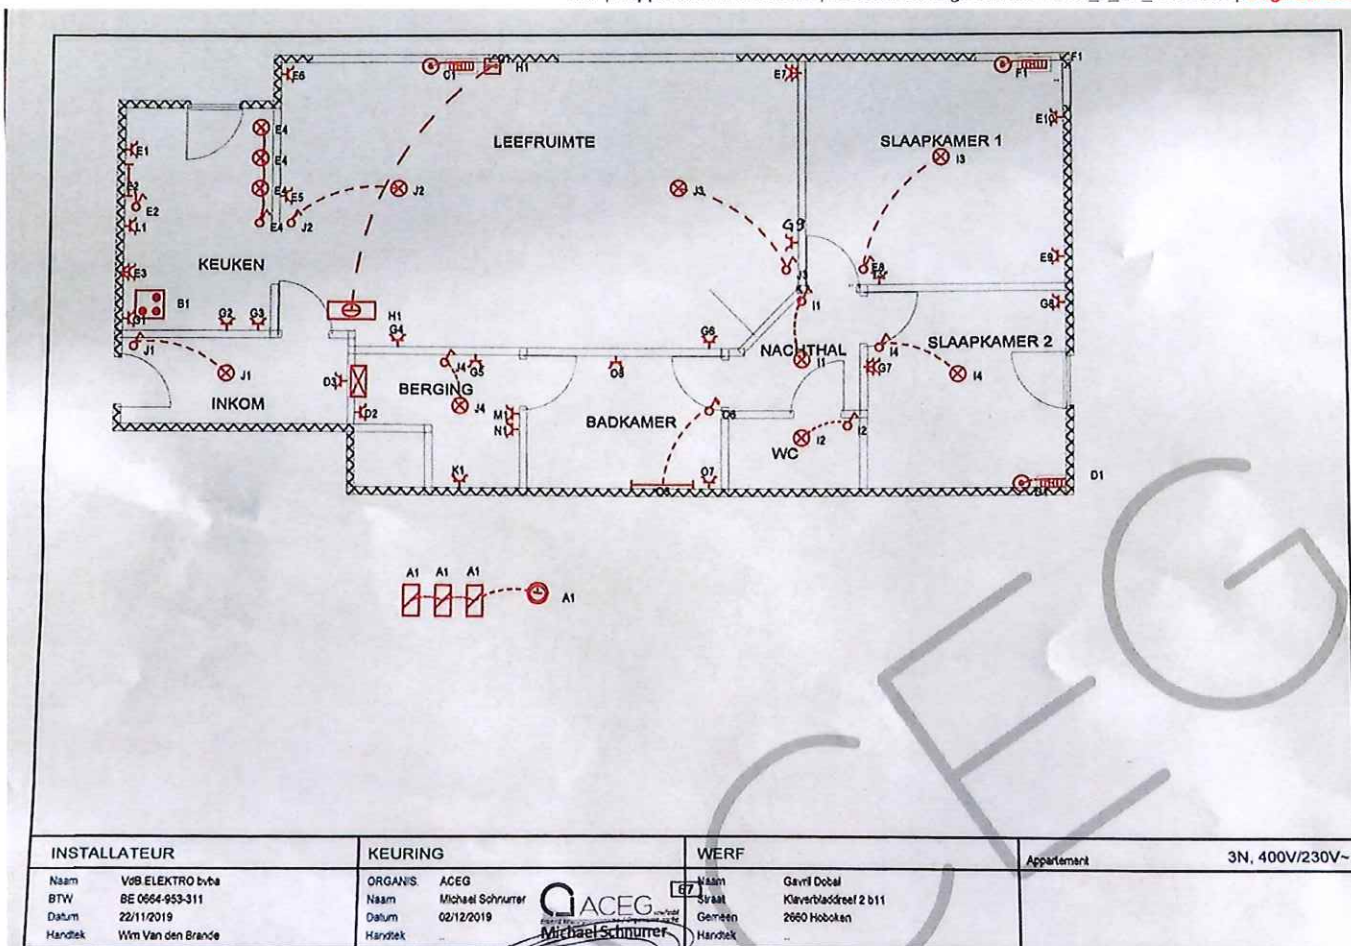

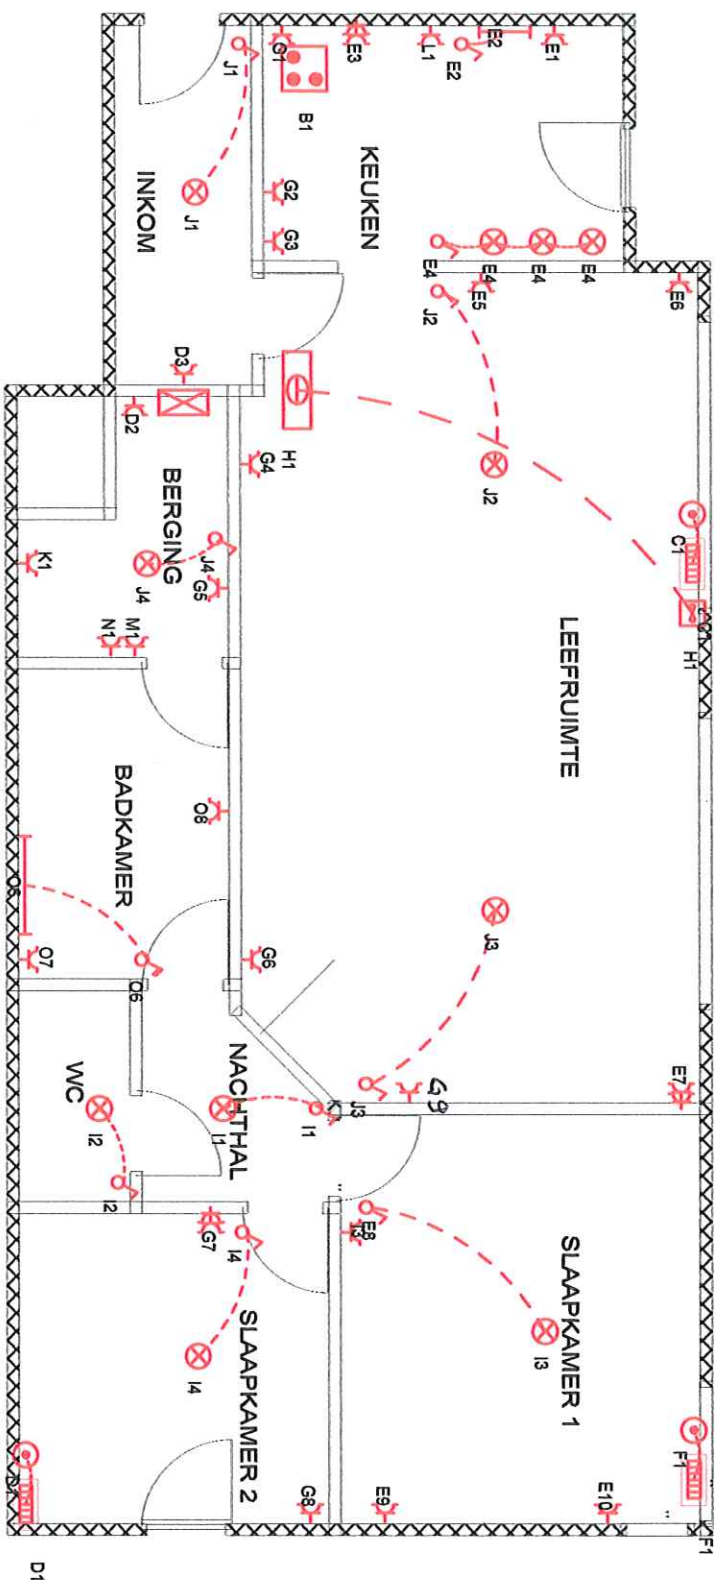

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Appartement
Naam	VAB ELEKTRO bvba	ORGANIS.	ACEG	Naam	Gavril Dobal	
BTW	BE 0664-953-311	Naam	Michael Schnurer	Straat	Klaverbladreef 2 b11	3N, 400V/230V~
Datum	22/1/2019	Datum	02/12/2019	Gemeen	2660 Hoboken	
Handtek	Wim Van den Brande	Handtek	..	Handtek	..	

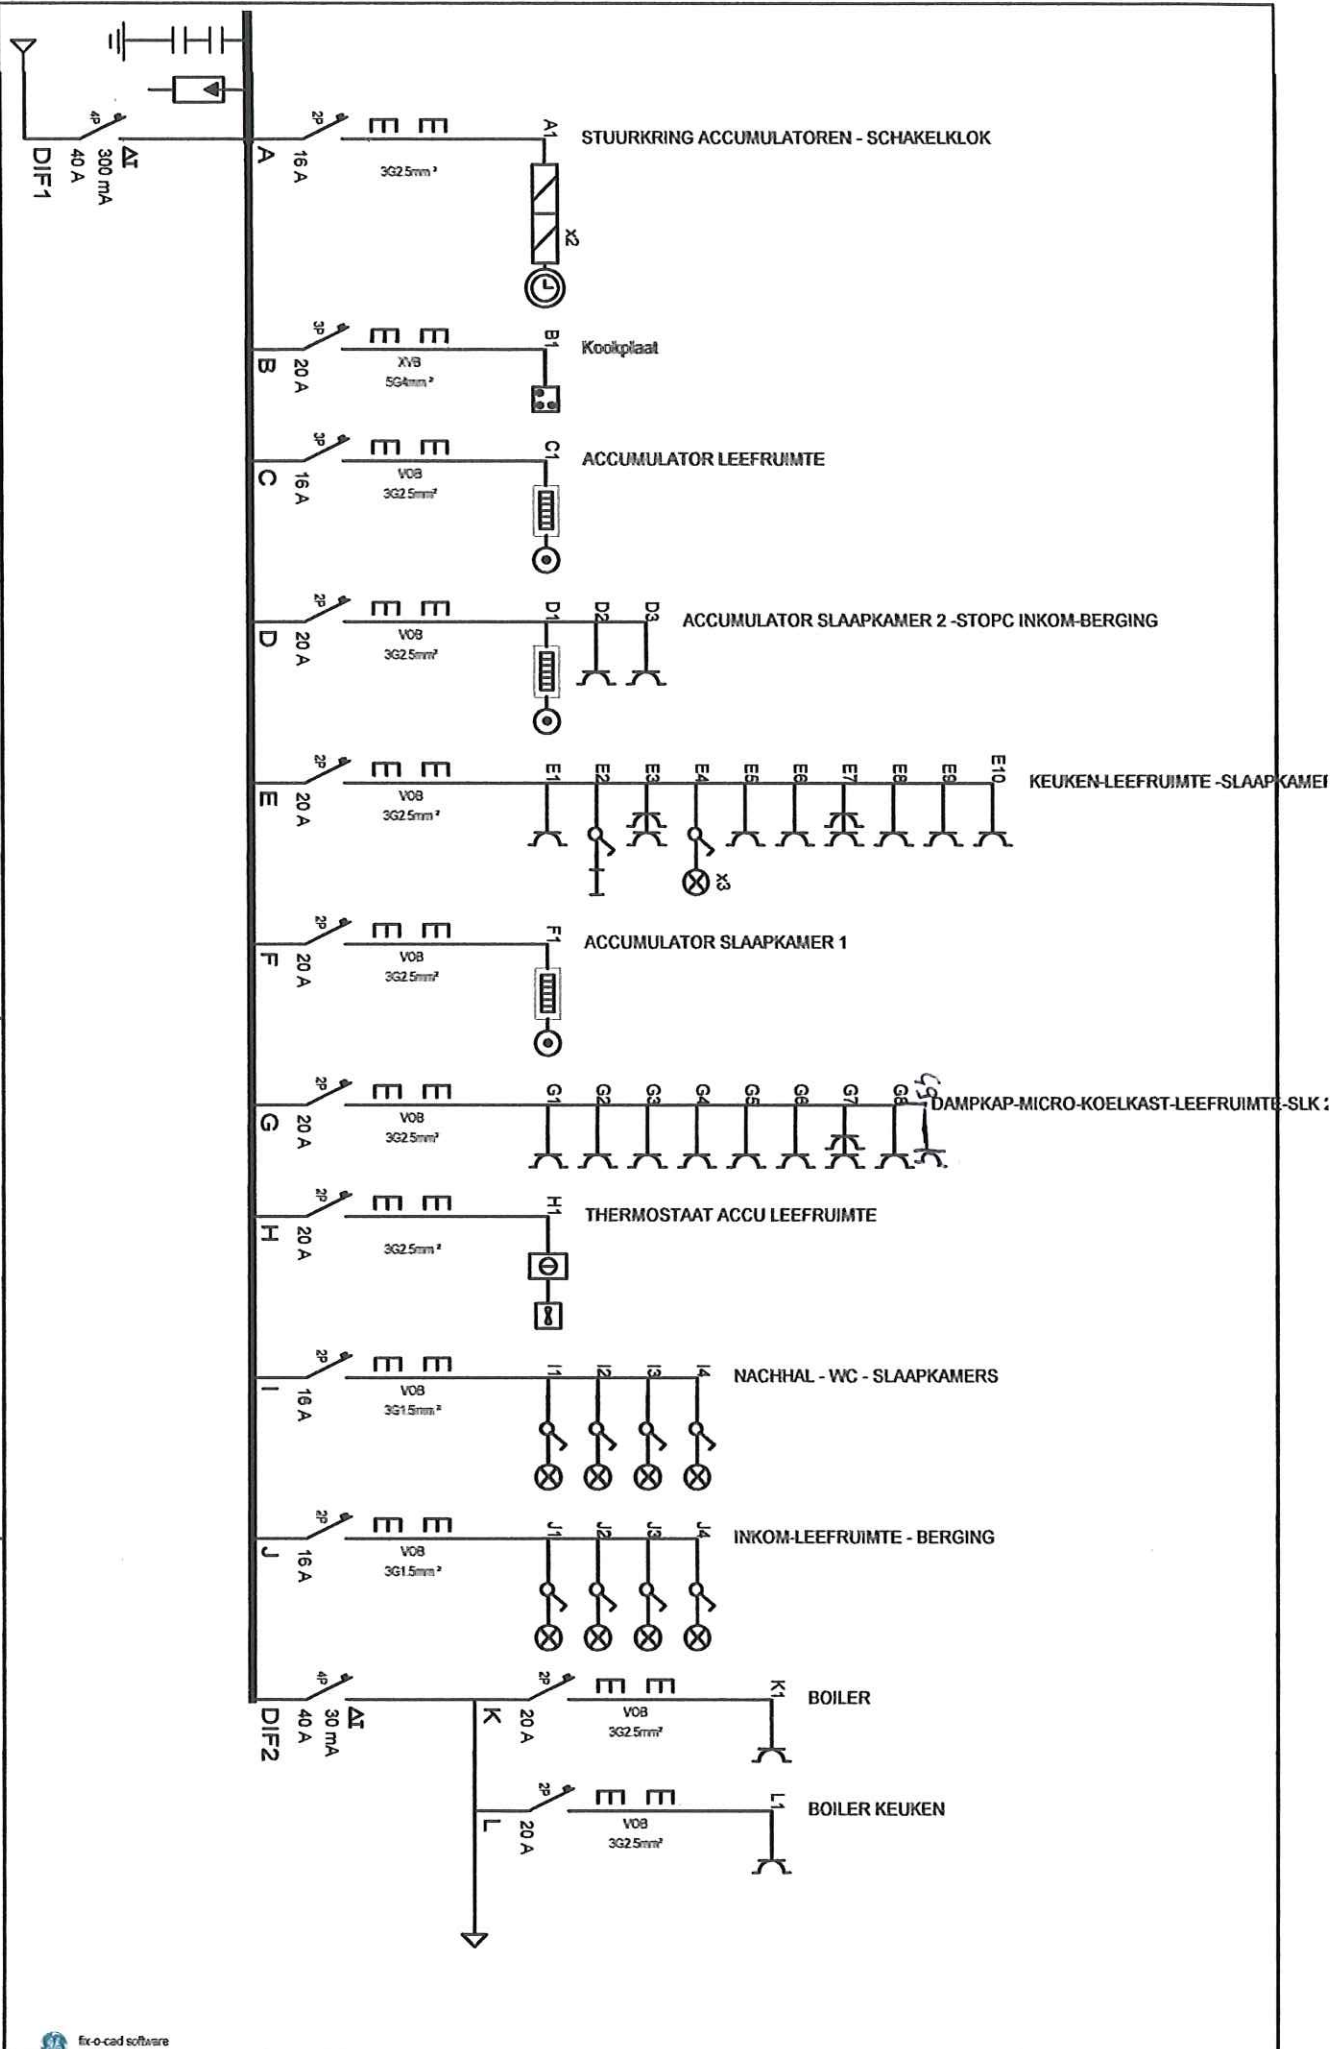

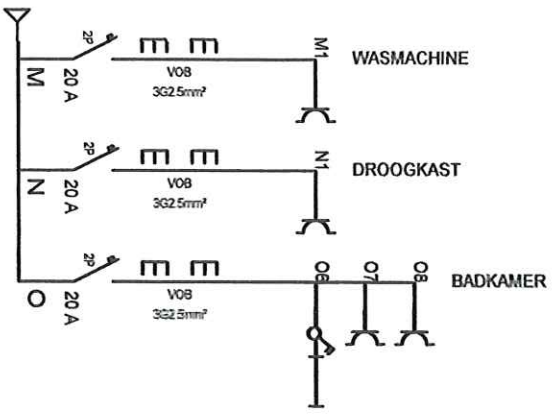

INSTALLATEUR

Naam VdB ELEKTRO bvba
 BTW BE 0664-953-311
 Datum 22/1/2019
 Handtek Wirt Van den Brande

KEURING

ORGANIS. ACEG
 Naam Michael Schnurter
 Datum 02/12/2019
 Handtek ..

WERF

Naam 67 Naam Gavril Dobal
 Straat Klaverbladreef 2 b11
 Gemeen 2860 Hoboken
 Handtek ..

SchematB

3N, 400V/230V~
