

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 15/09/2022

Inspecteur: Jurgen Goethals

Mentor:

Installateur: Elektro Schoonaert

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 458 187 121

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
Eurotest ET61557

Serienummer: 18460134

Datum verslag: 15/09/2022

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 863344

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Albert I Laan
Huisnummer	68
Busnummer	N0301
Postcode	8620
Gemeente	Nieuwpoort
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Albert I Laan
Huisnummer	68
Busnummer	N0301
Postcode	8620
Gemeente	Nieuwpoort
Land	België

Installateur

Naam	Elektro Schoonaert
BTW nr.	BE 458 187 121
Telefoonnummer	+32 58 31 40 69
E-mail	elektro@schoonaert.be

Type :

EAN : 54

Teller Nr.: :-

 Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15

Ri algemeen: >0.5 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 1.7 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
1	C	32		2	6
9	C	16		2	1,5
5	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoeestellen en/of -meubels nog te voorzien.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT


- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 15/9/2047
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

+32 2 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 15/9/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

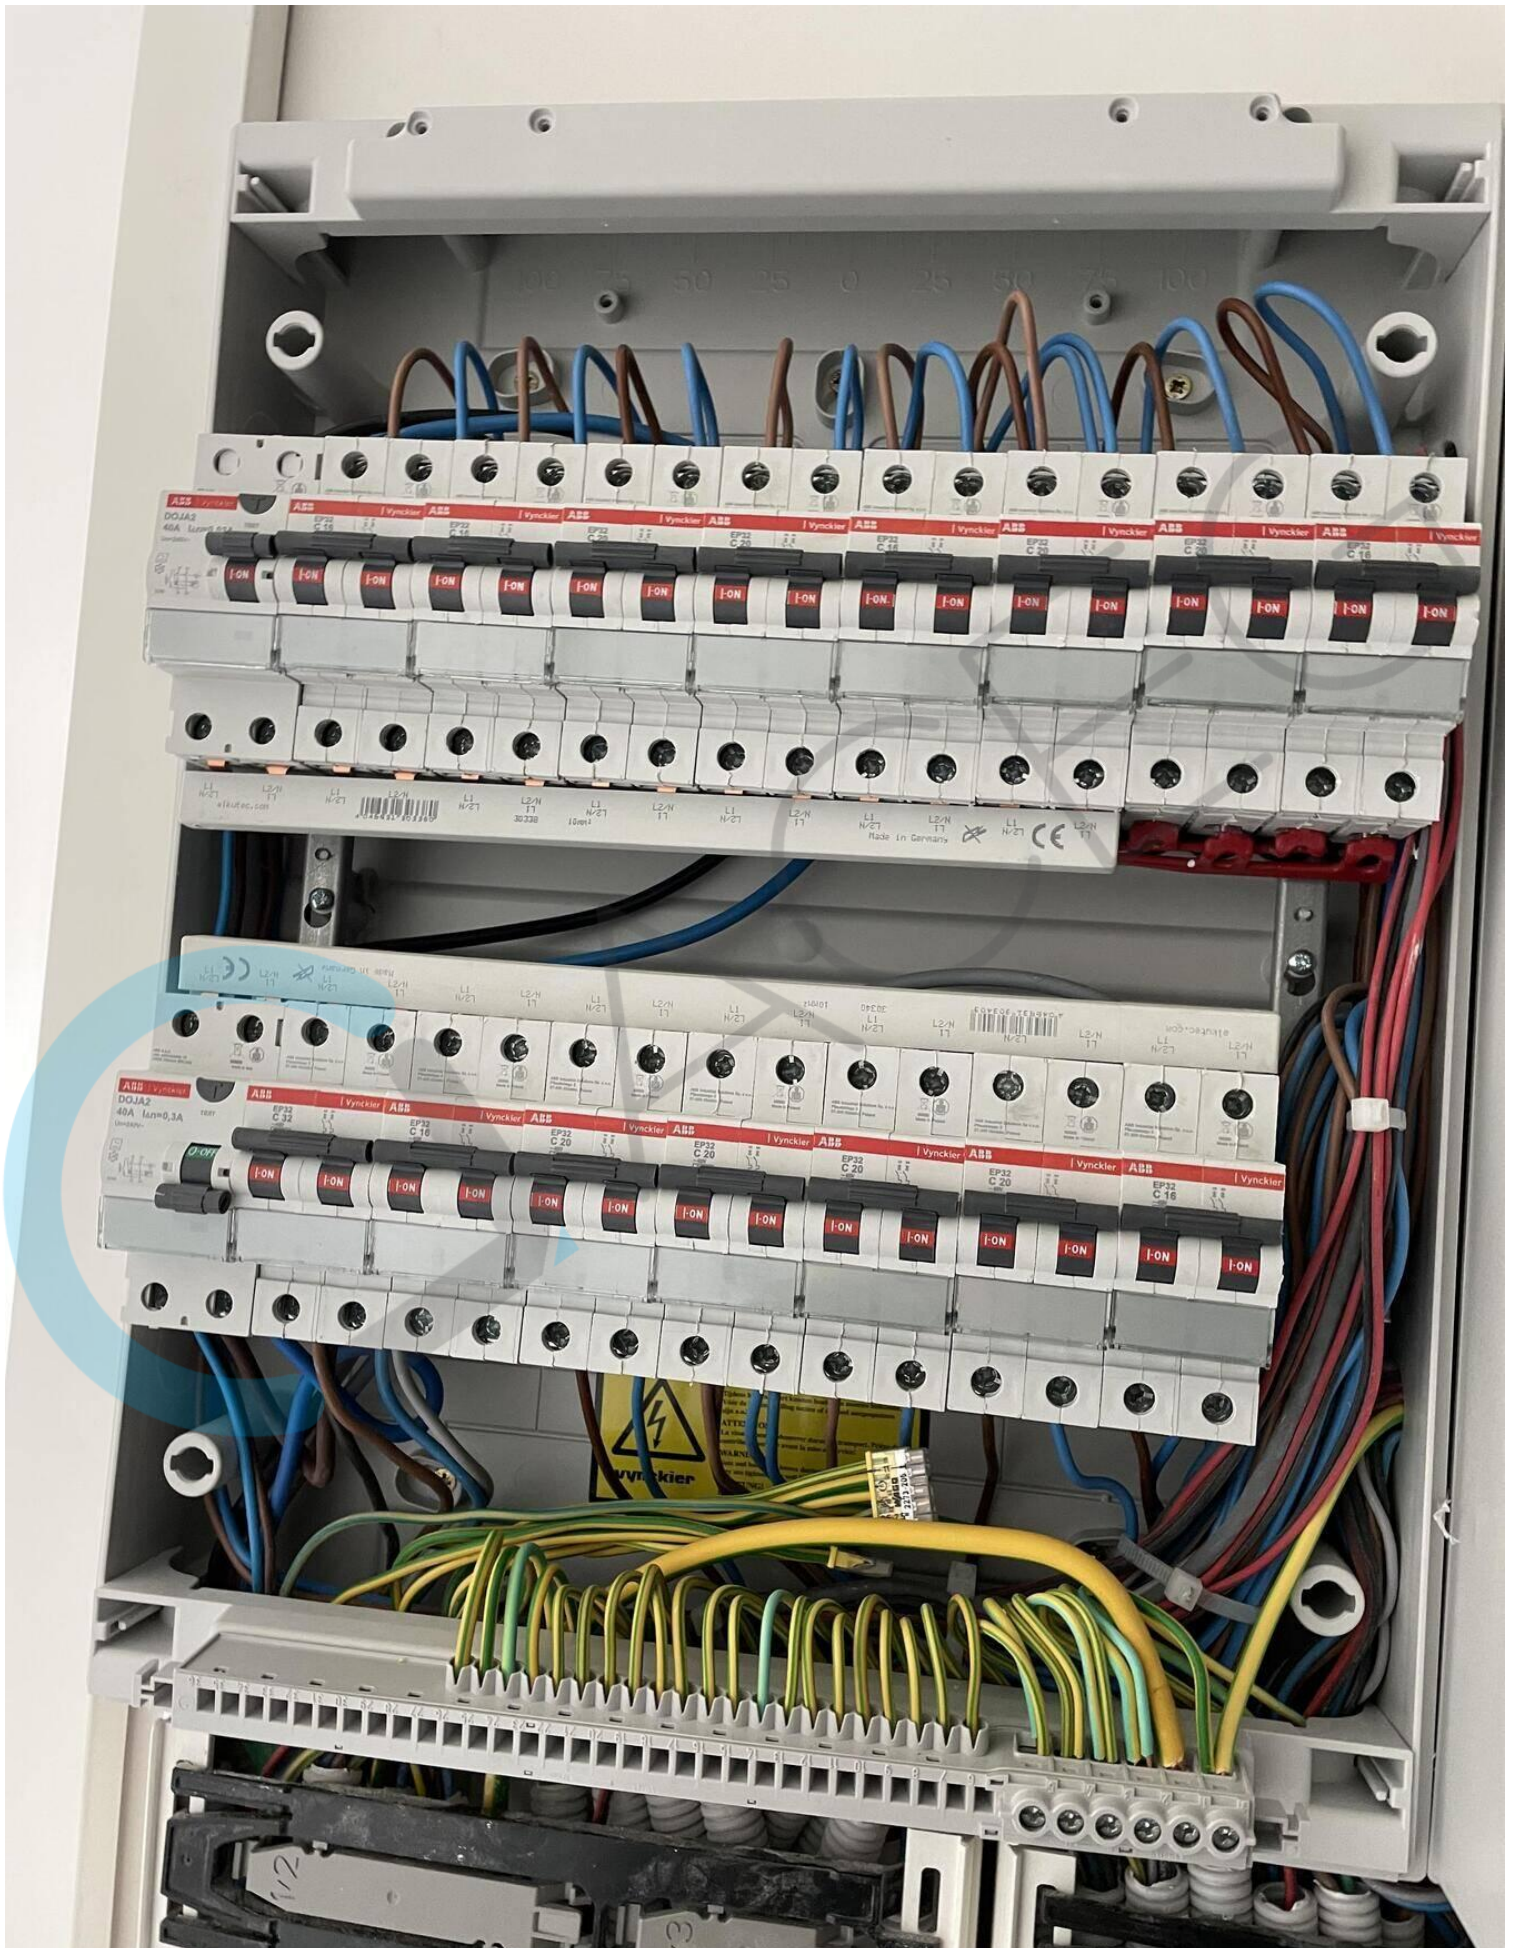




DAACCEEG

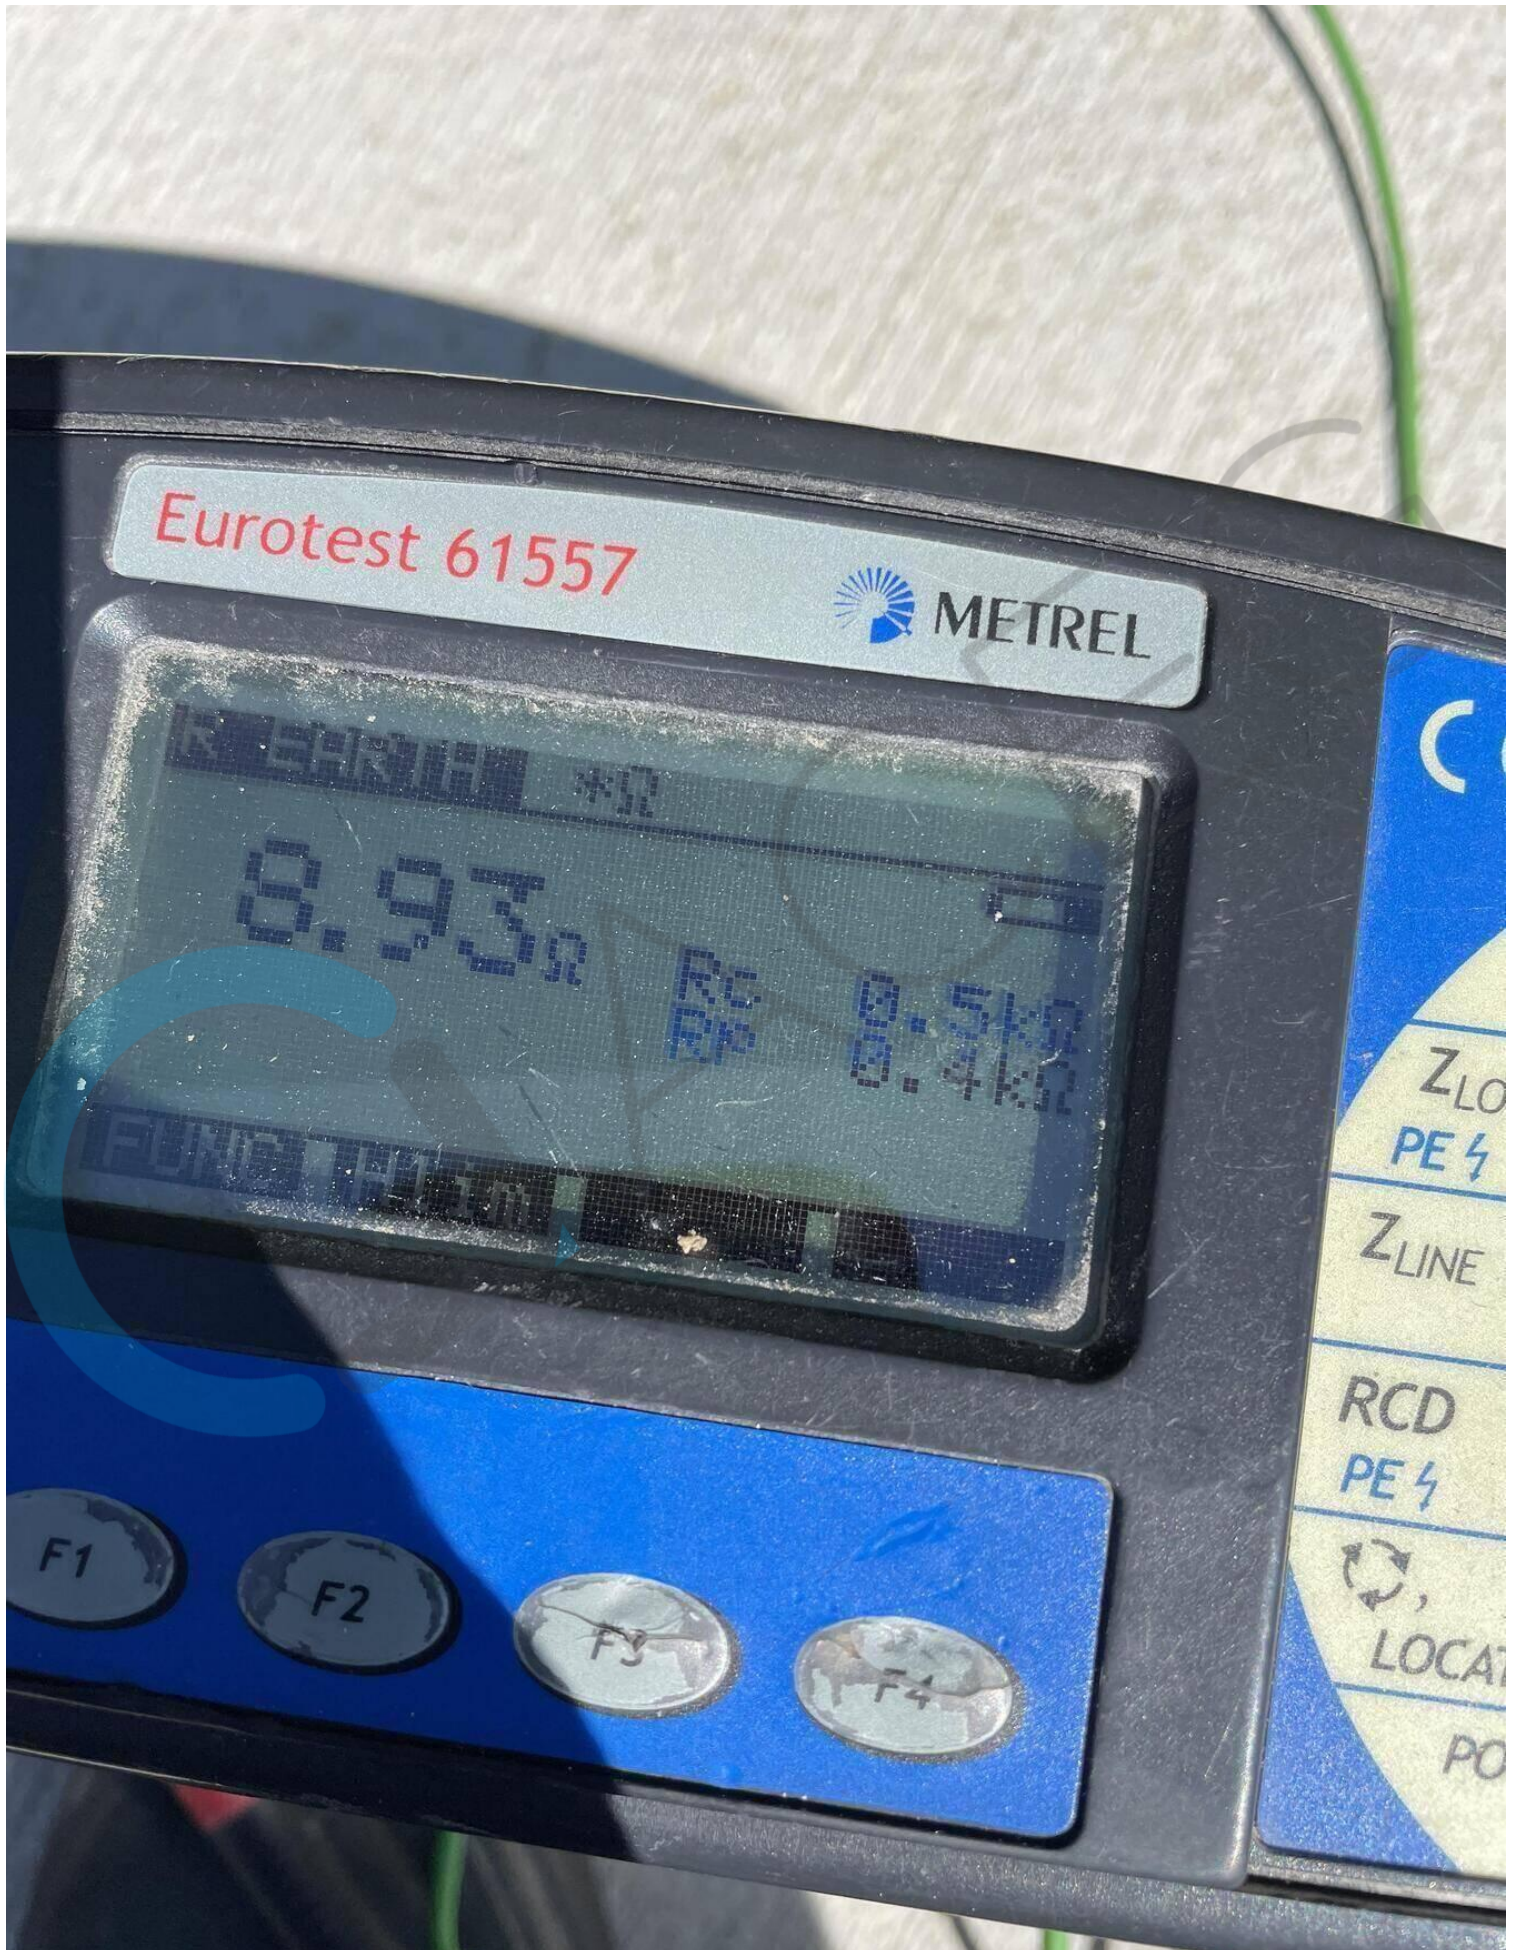




DAACEEG

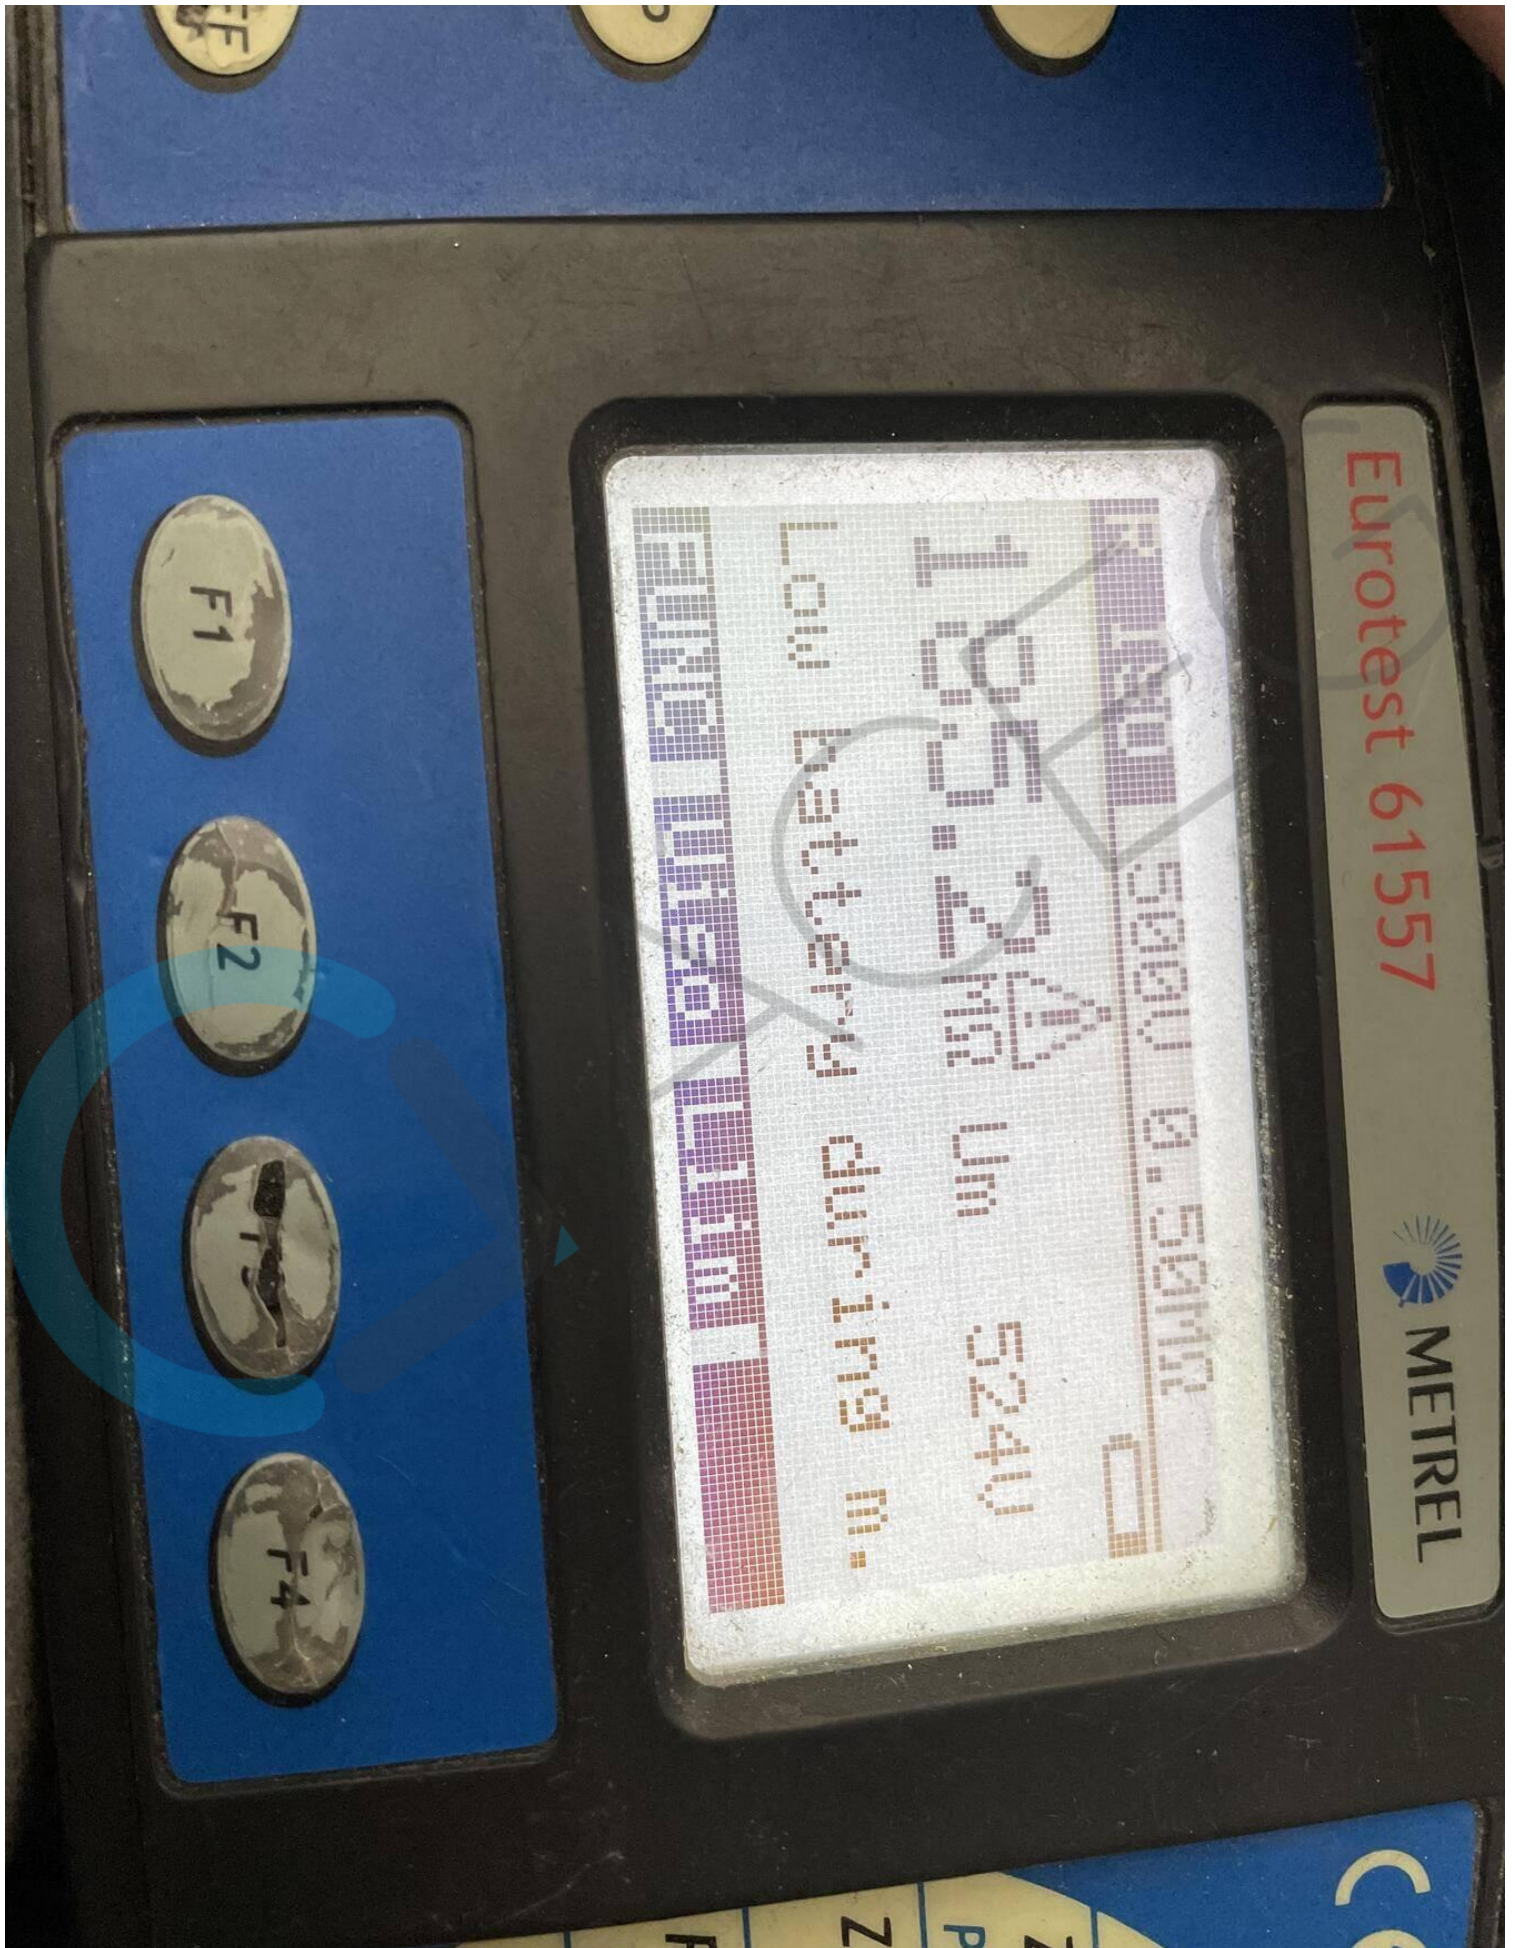






DAACFEG

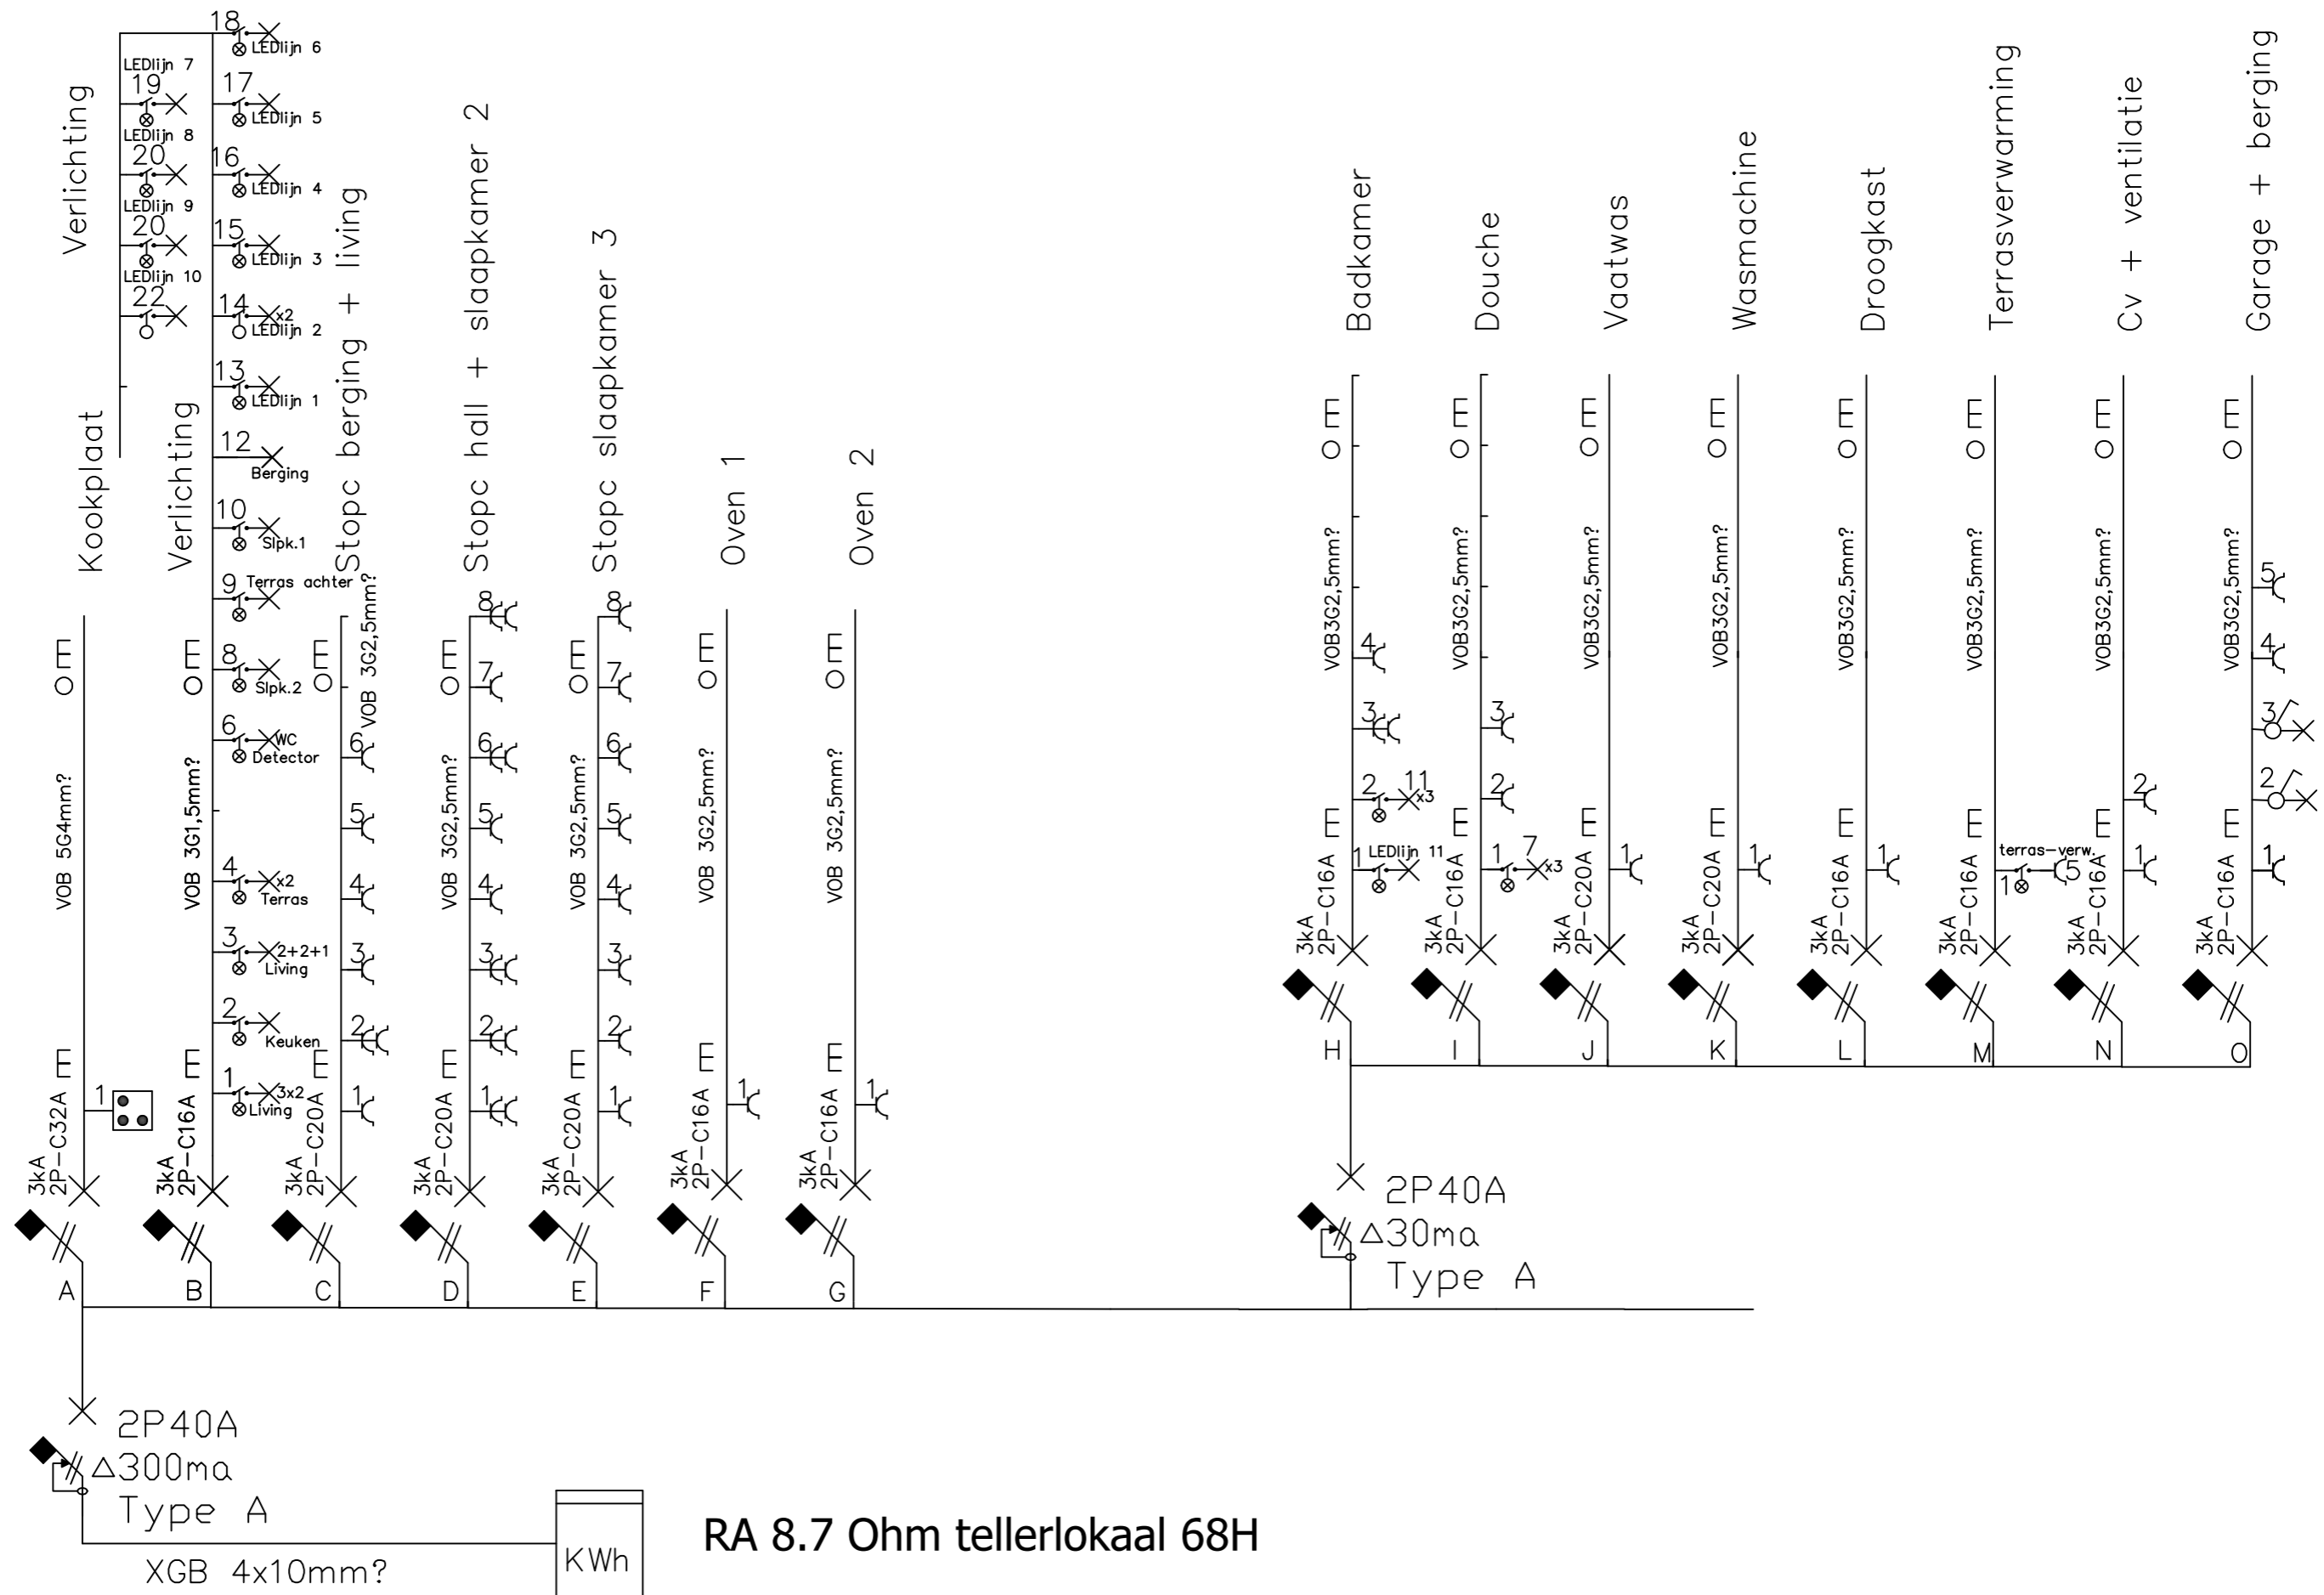

68N 03.01 EAN 541448860021650608

Project	Bouwheer	Keuringsorganisme:	Plan:	Wijzigingen:	ELEKTRO SCHOONAERT REYGAERDIJKSTRAAT 18 8630 VEURNE Tel 058 31 40 69 Fax 058 31 55 42 elektro@schoonaert.be www.elektro-schoonaert.be
Jan Turpin F5 Albert I Laan 68 8620 Nieuwpoort	NV Jan Turpin Construct Houtmarkt 9 8500 Kortrijk		Blad:		
			Schaal:		
			Datum:		



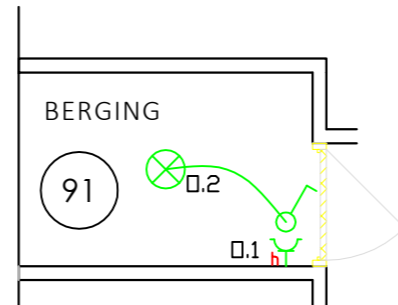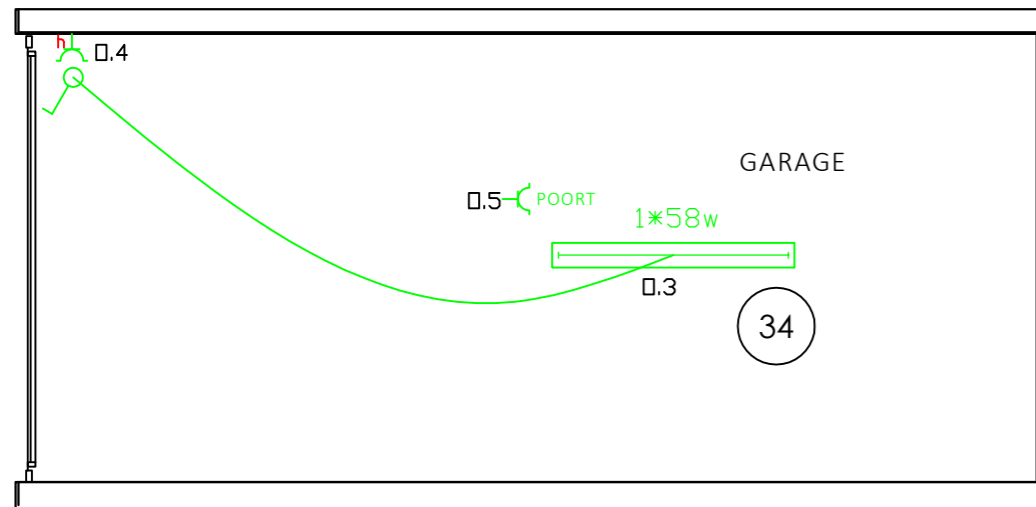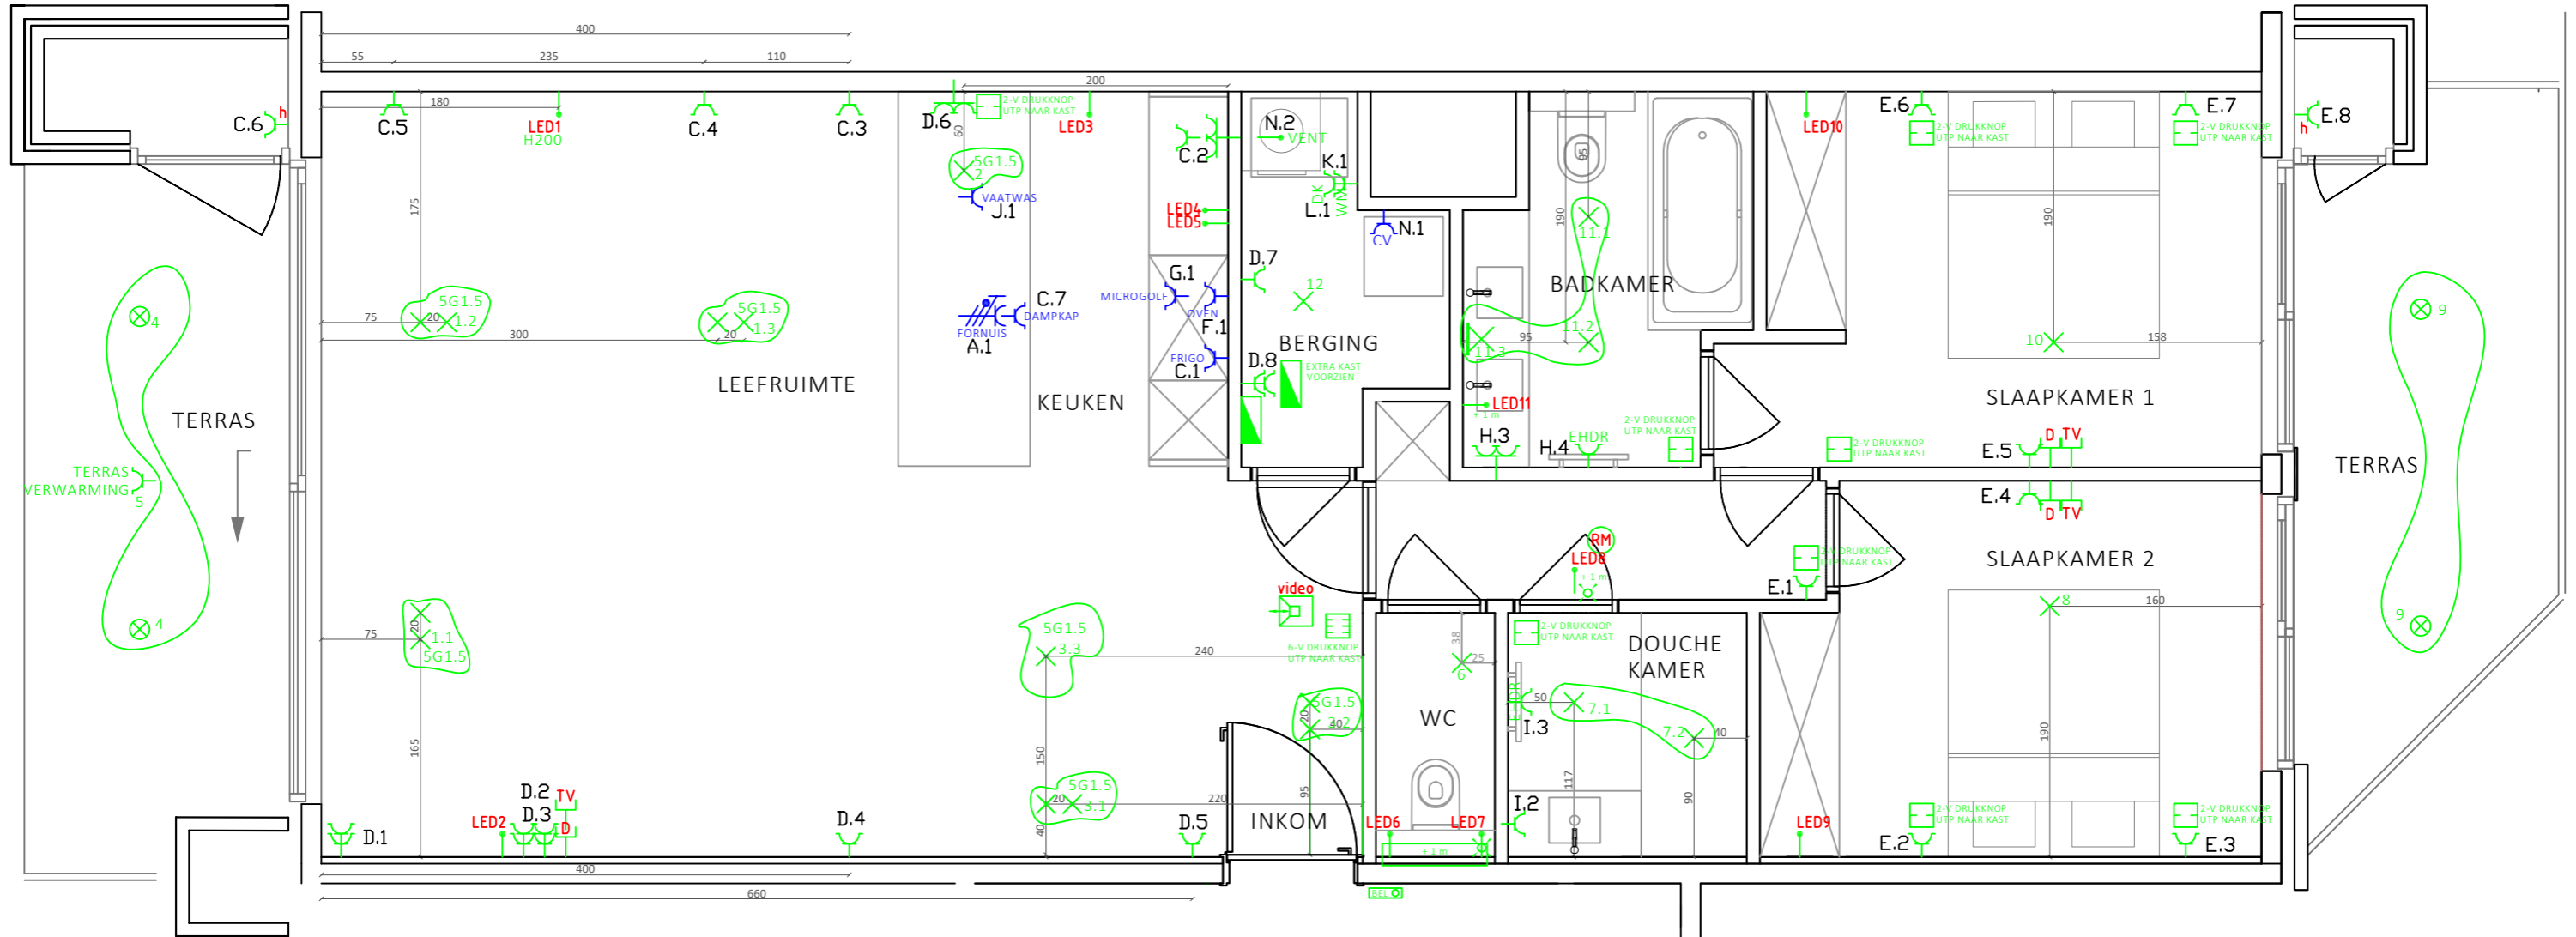

68N 03.01

EAN 541448860021650608

15-09-2022

Project	Bouwheer	Keuringsorganisme:	Plan:	Wijzigingen:	ELEKTRO SCHOONAERT REYGAERDIJKSTRAAT 18 8630 VEURNE Tel 058 31 40 69 Fax 058 31 55 42 elektro@schoonaert.be www.elektro-schoonaert.be
Jan Turpin F5 Albert I Laan 68 8620 Nieuwpoort	NV Jan Turpin Construct Houtmarkt 9 8500 Kortrijk		Blad:		
			Schaal:		
			Datum:		
