

Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG DIESER BERICHT ANNULIERT UND ERSETZT DEN BERICHT 118/2024/71535/01:1 REF. 118/2024/71535/01:2

DATUM DER KONTROLLE 08/07/2024 (14:30 - 15:30) INSPIZIERENDE KONTROLLLEUR Denis Widy
ADRESSE DER KONTROLLE Sourbrodter Straße 17 - 4750 Bütgenbach ART DER KONTROLLE Periodische Prüfung (6.5.)



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse der Installation Sourbrodter Straße 17 - 4750 Bütgenbach
Art der Räume Wohneinheit (Haus)
Anlass der Kontrolle Anfrage im Rahmen eines Verkaufs
Besitzer Paasch
Verantwortliche der Arbeiten Dollendorf tommy
#MwSt be0664.591.936
Anwendbare/angewendete Ausnahmen 8.2.2. - 6.5.8.1.



ANGABEN ZUM STROMANSCHLUSS

Betreiber Verteilungsnetz (BVN) ORES ASSETS
EAN-Code Nicht mitgeteilt
Zählernummer 32650037
Index Tag/Nacht 53245,7//
Typ der allgemeinen Abschaltung Teco
Kabel Stromkasten VVB 4 x 10 mm²
Nominale Betriebsspannung 3x400V + N - AC
Nominaler Strom der Schutzverbindung 25A

KONTROLLE

Konformität Kabelschema und Lageplan	OK	Anzahl Stromkasten	1	Anzahl Stromkreise	12
Beschreibung der Stromverteilung(en): Siehe Pläne im Anhang					
Die Fundamente stammen von	Vor 01/10/1981	Differentialvorrichtung am Kopf der Anlage	ID - 40A - 300mA - Typ A - Test OK		
Erdung	Stäbe	Zusätzliche Differentialvorrichtung	ID - 40A - 30mA - Typ A - Test OK		
Erdungswiderstand (Ω)	30	Zusätzliche Differentialvorrichtung	ID - 16A - 10mA - Typ A - Test OK		
Konformität der equipotential Verbindungen und der PE	OK	Fixierung/Zustand/Verschlechterung	OK		
Test Kontinuität	Schlüssig	Sichtprüfung von stationären und/oder mobilen Geräten	OK		
Kontrolle Fehlerstromschleife	Schlüssig	Schutz gegen direkte Kontakte	OK		
Schutz gegen indirekte Kontakte	OK	Allgemeine Isolationswiderstand ($M\Omega$)	5,10		
		Korrespondenz zwischen Hauptdifferential - Erdung	OK		
		Angemessenheit Überspannungsschutzvorrichtungen - Schaltungsabschnitten	OK		

ABSCHLUSS : KONFORM

Im Datum von 08/07/2024, ist die Elektro-Installation von Sourbrodter Straße 17 - 4750 Bütgenbach ist konform mit den Anforderungen von Buch 1 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 über elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung. Die nächste periodische Kontrolle ist auszuführen, ohne tiefgreifende Modifizierung der Elektro-Installation, vor dem 08/07/2049.
Die von Certinergie ausgeführte Kontrolle bezieht sich auf die sichtbaren und normal zugänglichen Teile der Installation.
Vor und nach dem Fehlerstromschutzschalter ist der Zugang zu den Anschlussklemmen durch Plomben gesichert.
Das oder die einphasige(n) Netzschema(s) und Lageschema(s) wurden überprüft stimmen mit der Installation überein.

Unterschrift des Prüfers



Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

DIESER BERICHT ANNULIERT UND ERSETZT DEN BERICHT 118/2024/71535/01:1

REF. 118/2024/71535/01:2

Erinnerung der reglementierten Vorschriften :

Der Eigentümer, Verwalter oder Betreiber der Elektroinstallation muss :

- a) den Unterhalt sicherstellen oder aufrechterhalten ;
- b) alle geeigneten Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass die Bestimmungen von Buch 1 des Königlichen Erlasses vom 8. September 2019 zur Erstellung von Buch 1 über elektrische Anlagen mit niedriger und sehr niedriger Spannung jederzeit eingehalten werden ;
- c) die Dokumente in einer Akte aufbewahren, einschließlich der Kontrollberichte der elektrischen Installation, und für jede Person verfügbar halten die sie einsehen möchte, und eine Kopie dieser Akte für jeden möglichen Mieter bereithalten ;
- d) die Akte bezüglich der Elektroinstallation an den neuen Eigentümer, Verwalter oder Betreiber übertragen ;
- e) den für die Aufsicht zuständigen Beamten des föderalen öffentlichen Dienstes unverzüglich über alle Unfälle mit Personen zu informieren, hervorgerufen direkt oder indirekt durch das Vorhandensein elektrischer Anlagen ;
- f) in der Akte der Elektroinstallation alle nicht wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation vermerken ;
- g) eine Konformitätsprüfung der grösseren Änderungen oder Erweiterungen der Elektroinstallation von einem zugelassenen Kontrollorgan durchgeführt lassen, bevor sie verwendet wird ;
- h) wenn während der Inspektion Verstöße festgestellt wurden, muss eine neue Inspektion vom gleichen zugelassenen Kontrollorgan durchgeführt werden, um das Beheben der Verstöße am Ende eines Zeitraums von einem Jahr überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass während dieses zweiten Kontrollbesuchs weiterhin Verstöße vorliegen, muss das zugelassene Kontrollorgan eine Kopie des Inspektionsberichts senden an die Generaldirektion Energie welche zuständig ist für die hohe Überwachung der häuslichen Elektroinstallationen.

Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung


TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

DIESER BERICHT ANNULIERT UND ERSETZT DEN BERICHT 118/2024/71535/01:1


REF. 118/2024/71535/01:2

› ANHÄNGE

Verdrahtungsschema(s) der Installation

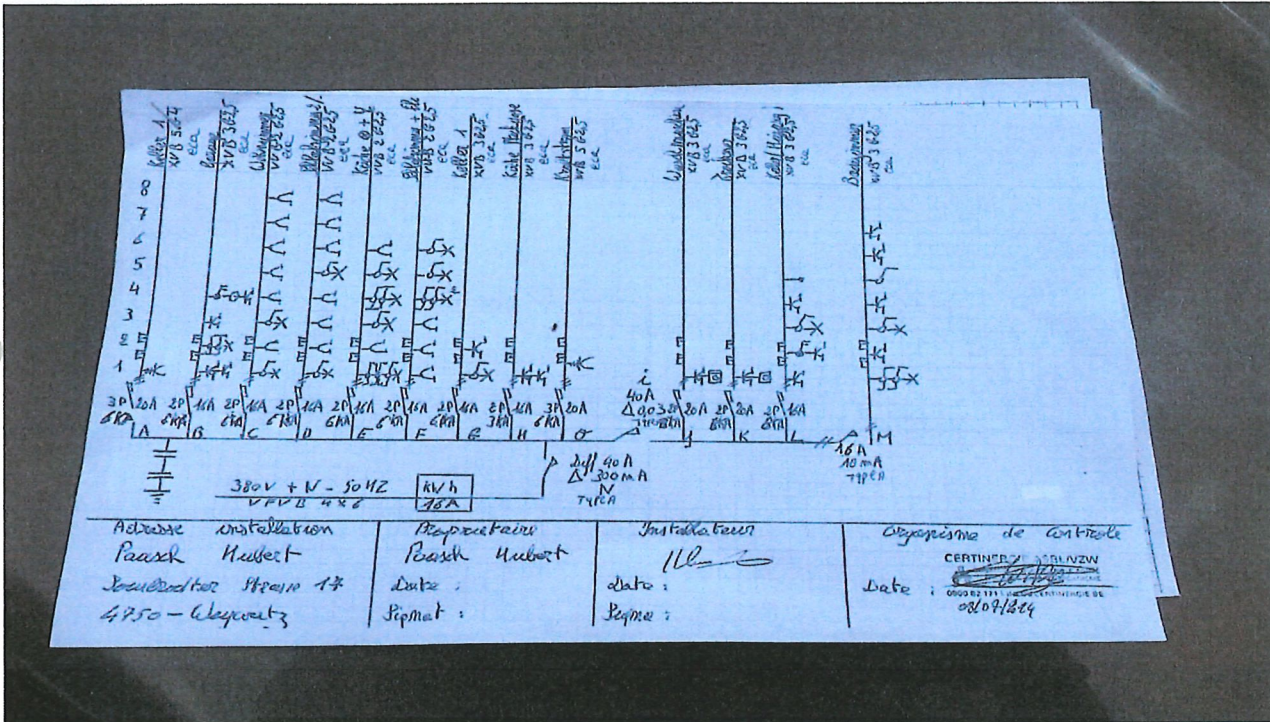

Situationsplan der Installation

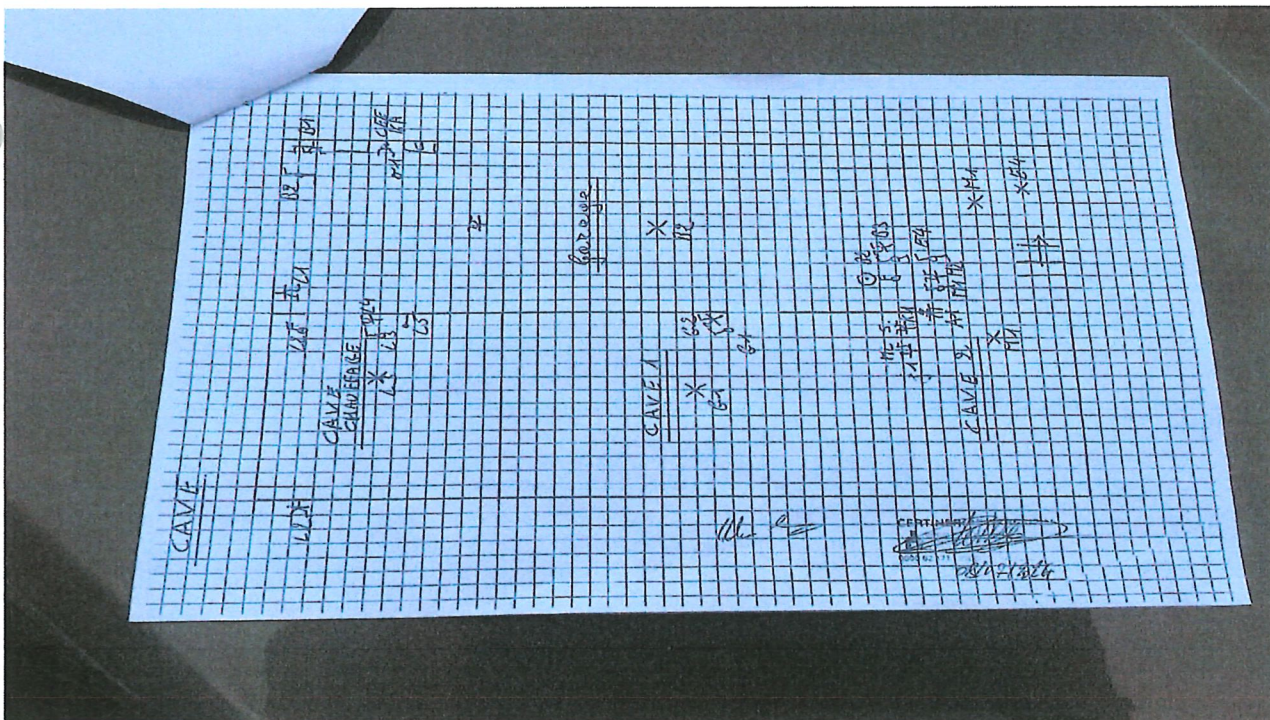

Inspektionsbericht von elektrischen Anlagen bei Niederspannung und sehr niedriger Spannung

TRADUCTION/ÜBERSETZUNG

DIESER BERICHT ANNULIERT UND ERSETZT DEN BERICHT 118/2024/71535/01:1

REF. 118/2024/71535/01:2

› ANHÄNGE

Situationsplan der Installation

