

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 27/04/2023

Inspecteur: Kim Dedecker

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 27/04/2023

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Markt
Huisnummer	85
Busnummer	2A
Postcode	1780
Gemeente	WEMMEL
Land	België

### Eigenaar

Naam	De Vuyst Aimé
Straatnaam	Markt
Huisnummer	85
Busnummer	2A
Postcode	1780
Gemeente	WEMMEL
Land	België

### Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : appartement

EAN : 541448860007132470

Teller Nr.: : 34586560

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



### Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS  
Aantal borden: 1  
Aardelektrode: Aardingslus



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.  
Spanning: 1N400V  
Aantal kringen: 16  
Meter / bord verbinding: 16 mm²  
Max beveiliging: 63 A

Ri algemeen: 83,2 MΩ

RE: 0,59 Ω

OK

OK

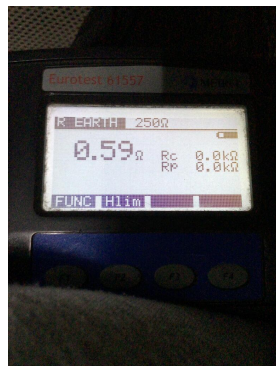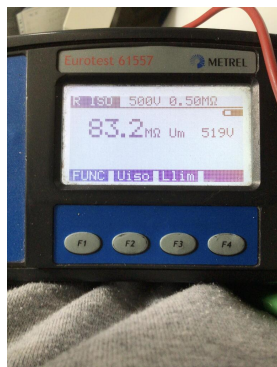

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I <sub>t</sub>	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

**BESCHRIJVING INSTALLATIE**

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm <sup>2</sup> )
2	C	10		2	1,5
1	C	10	Reserve	2	-
8	C	16		2	2,5
4	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

**BESLUIT**

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 27/4/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Kim Dedecker

Kim Dedecker  
ACEG VZW - #270

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

**Stappenplan voor een installatie die conform is:**


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27/4/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.




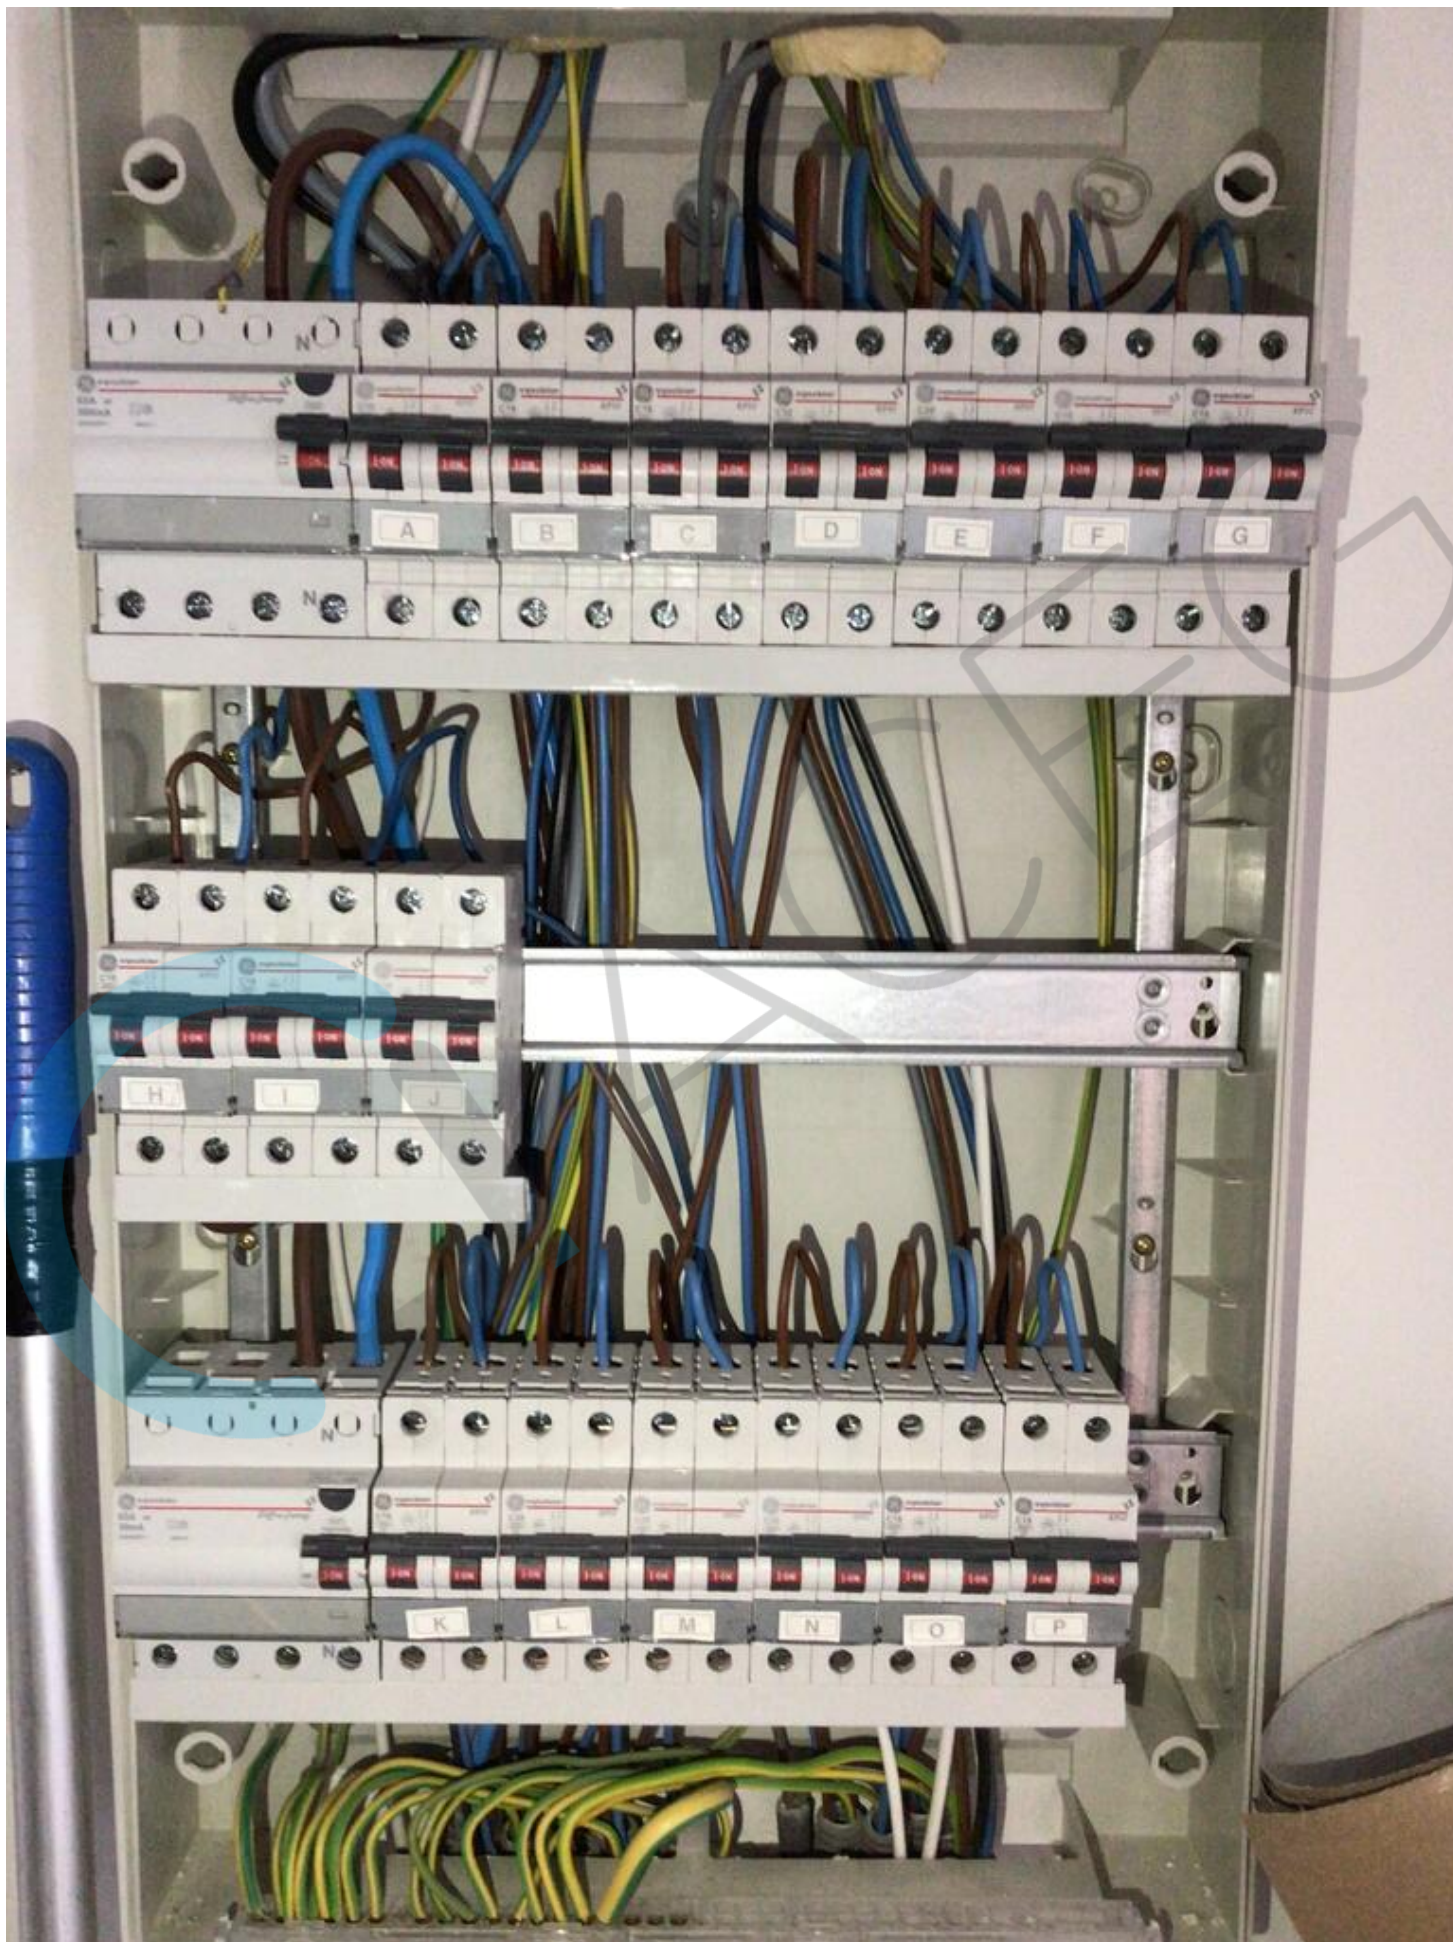

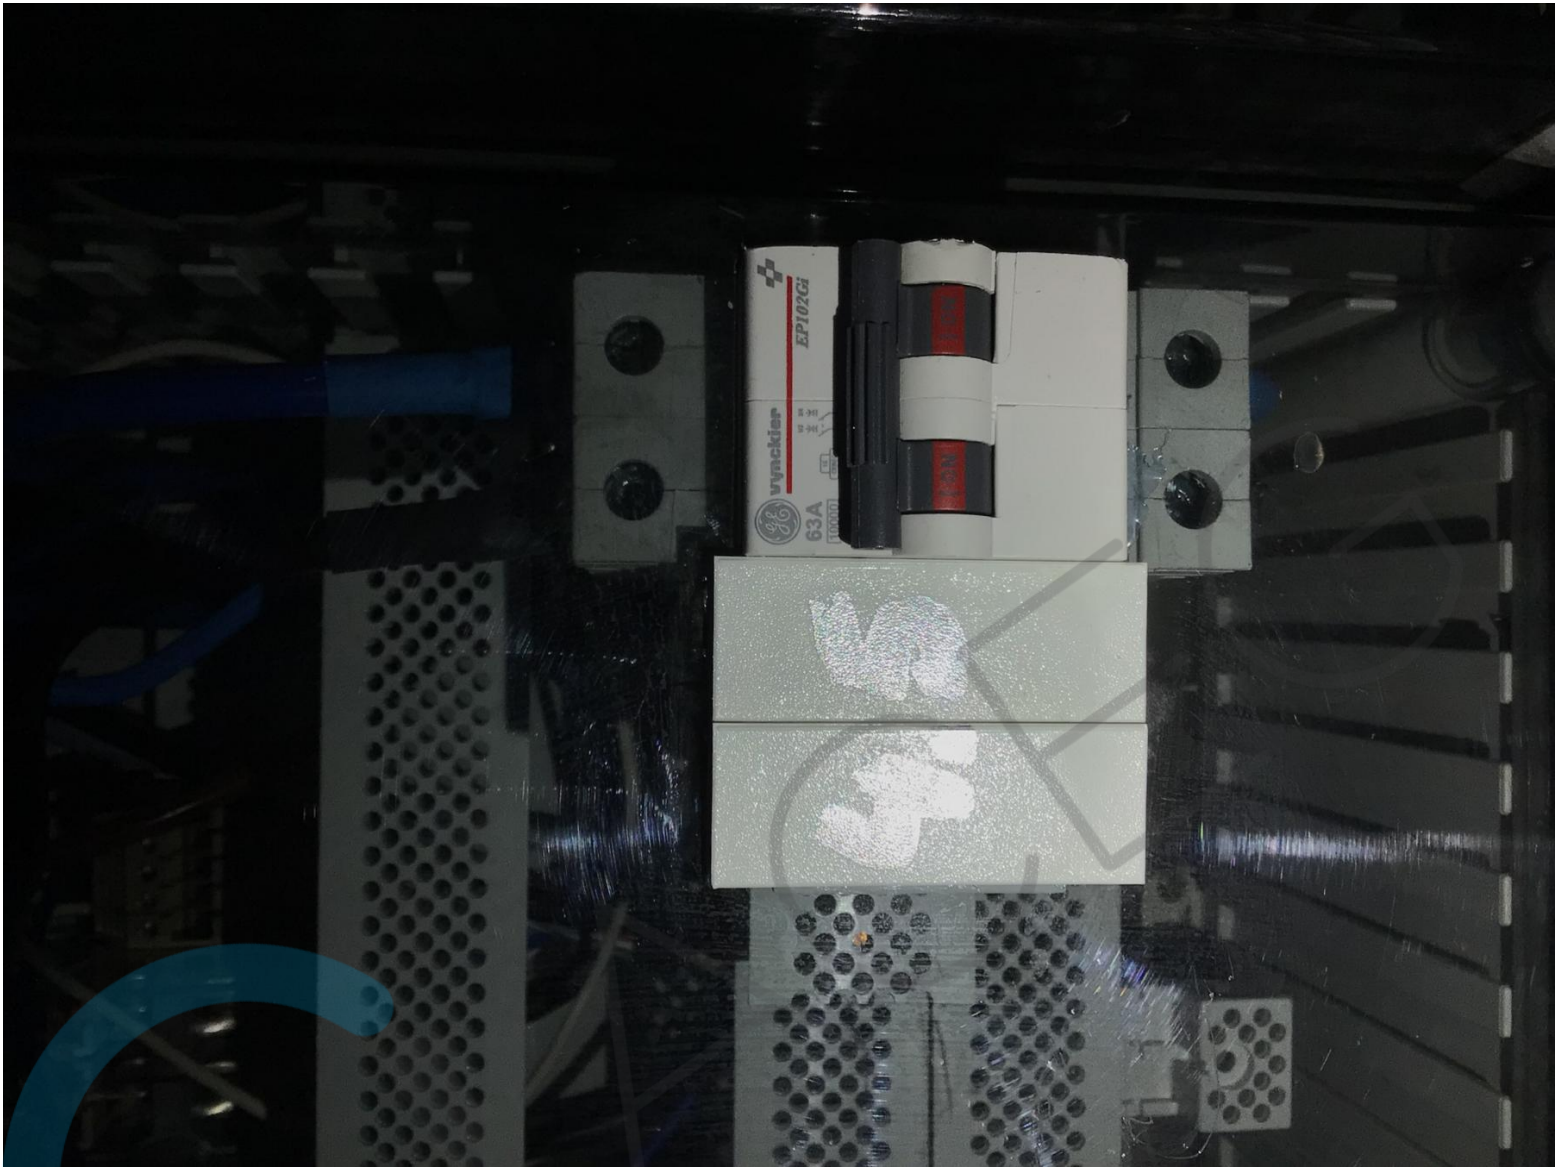




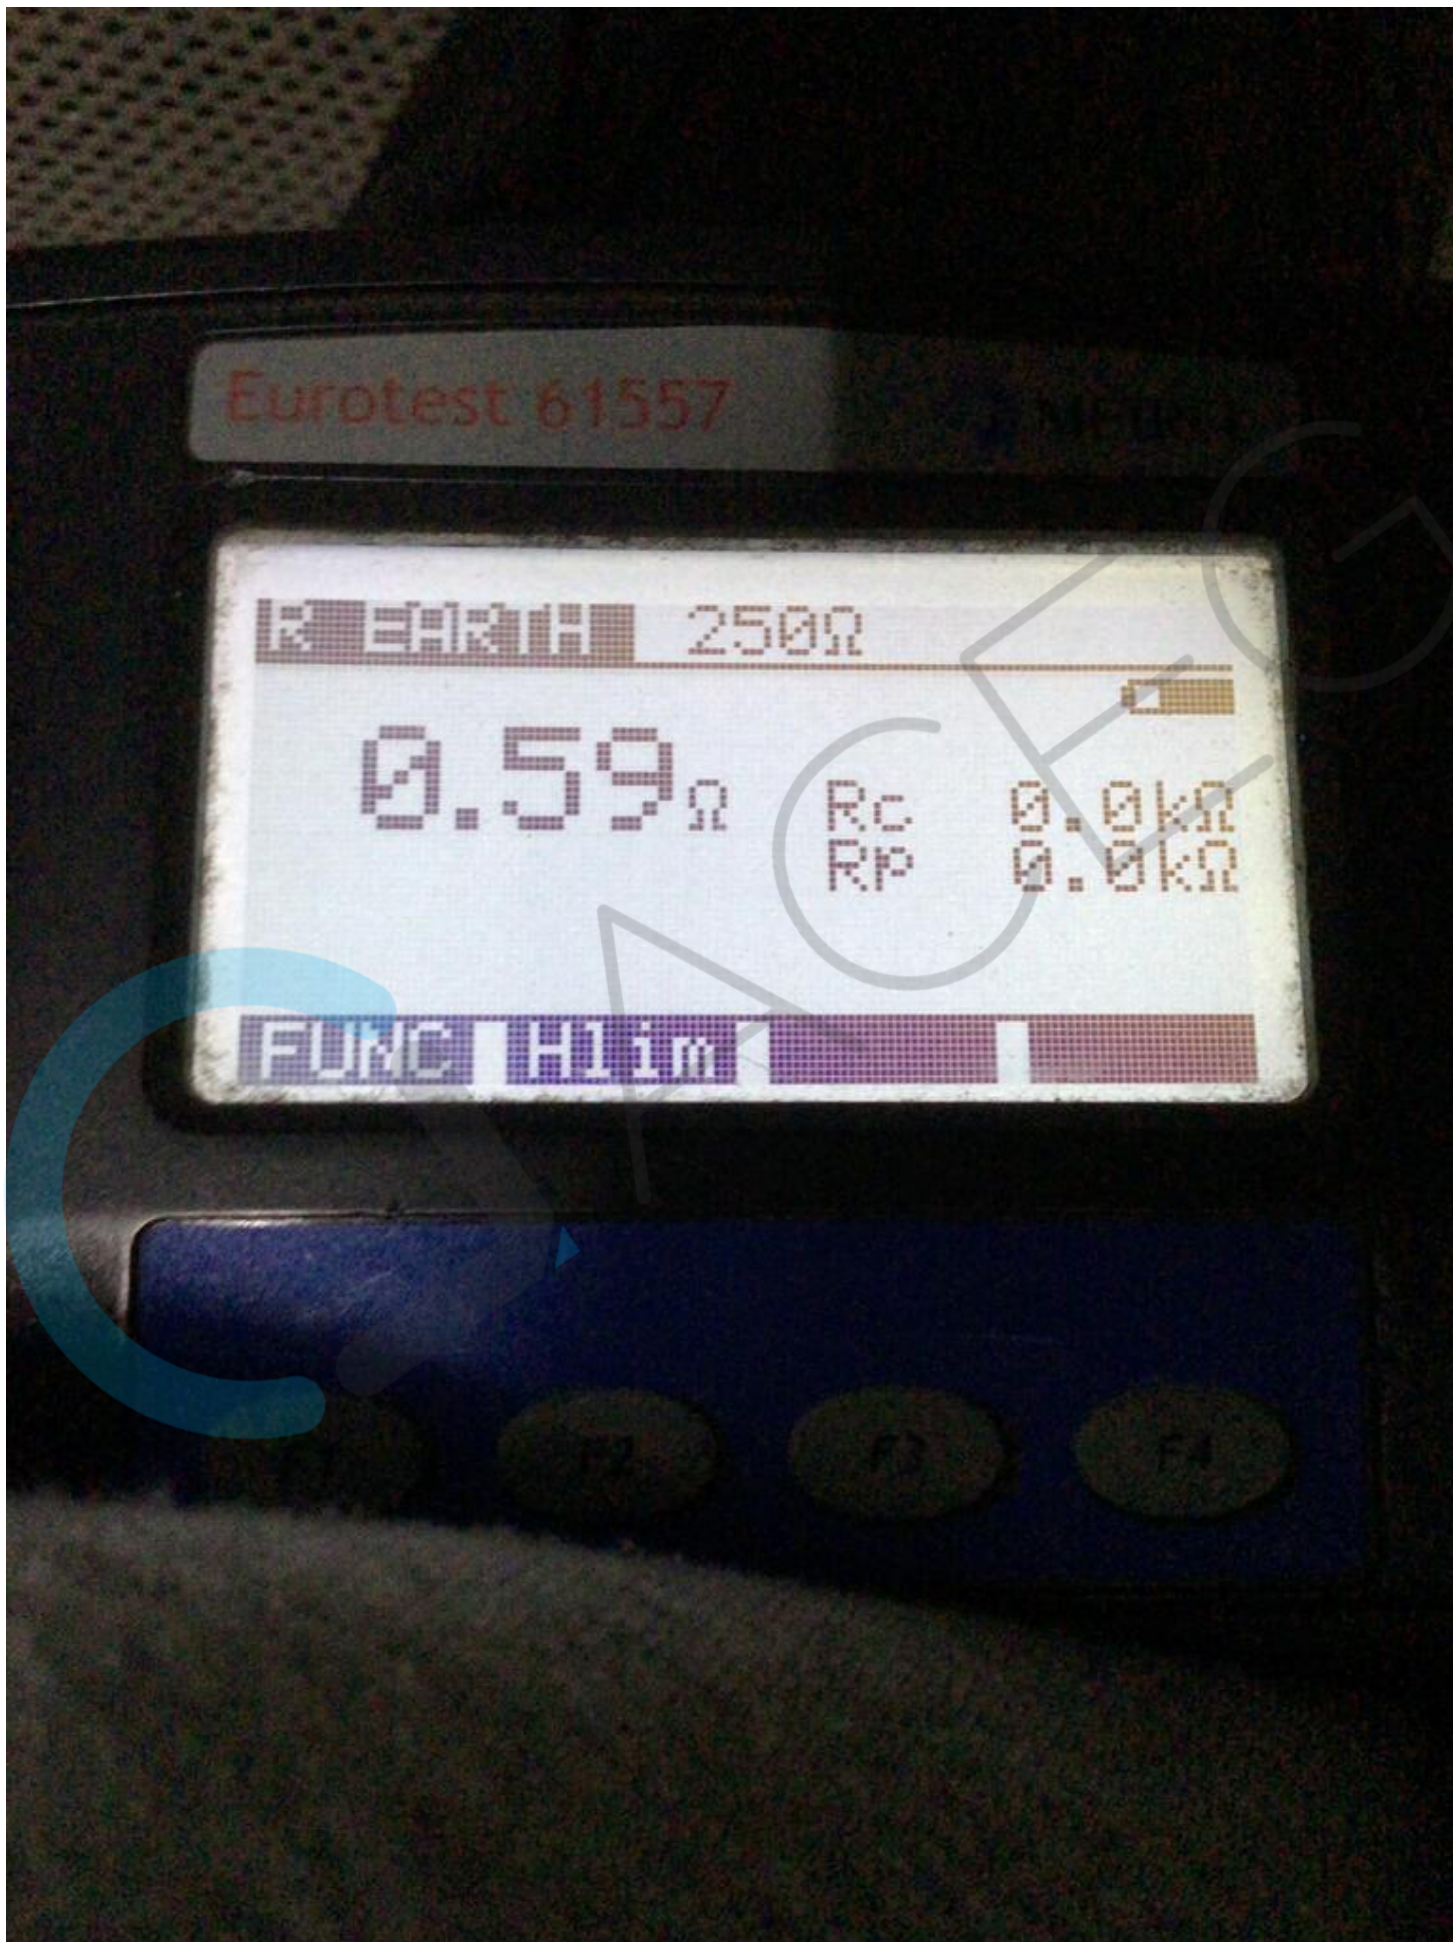


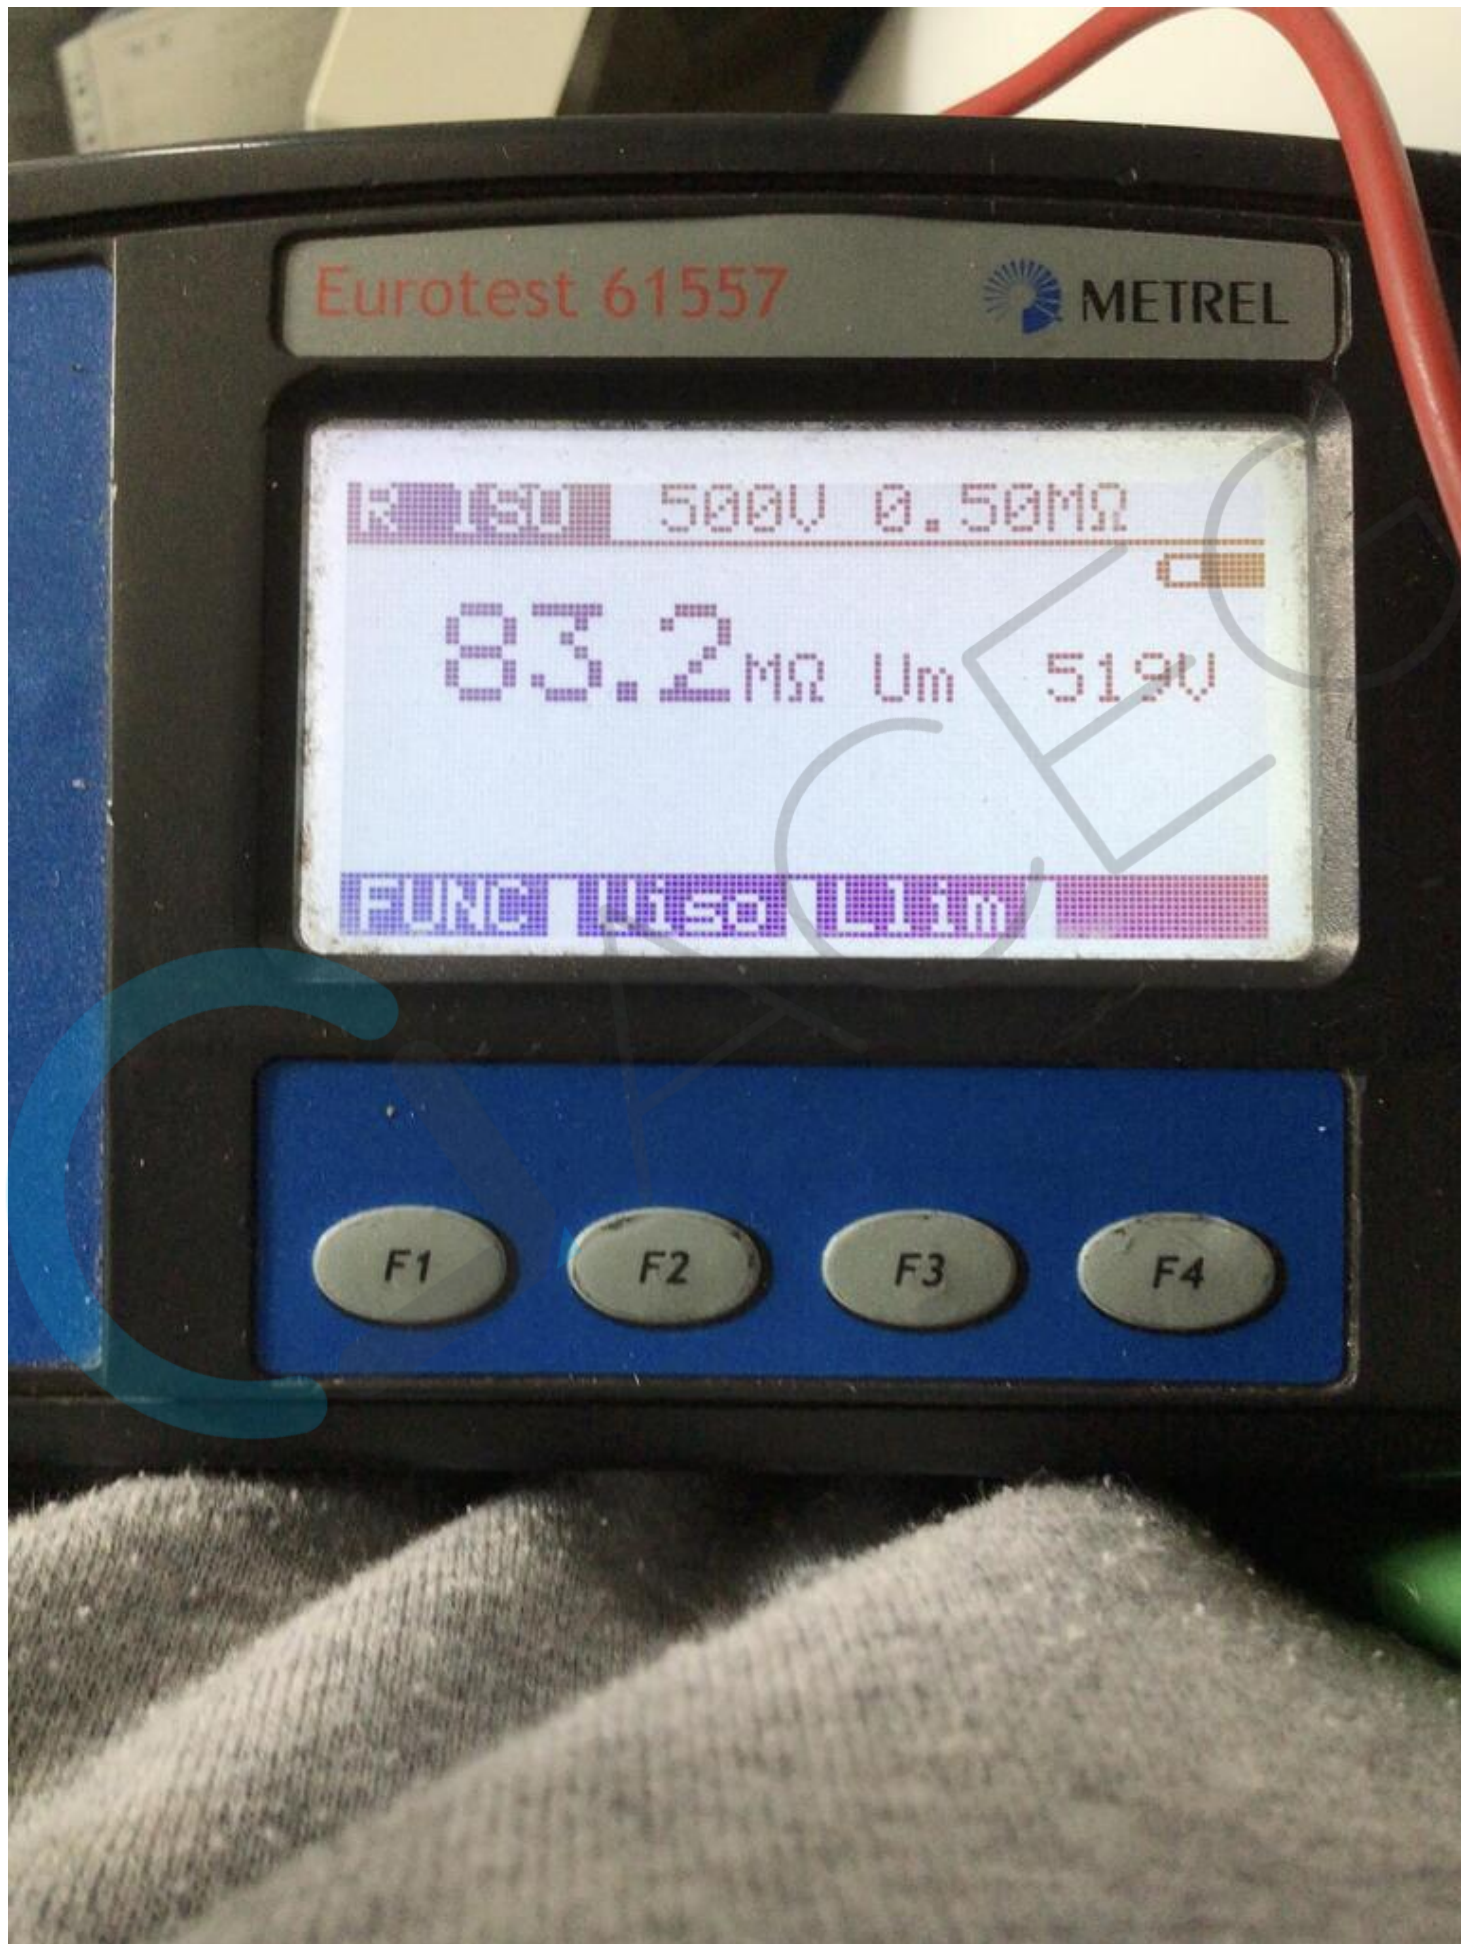



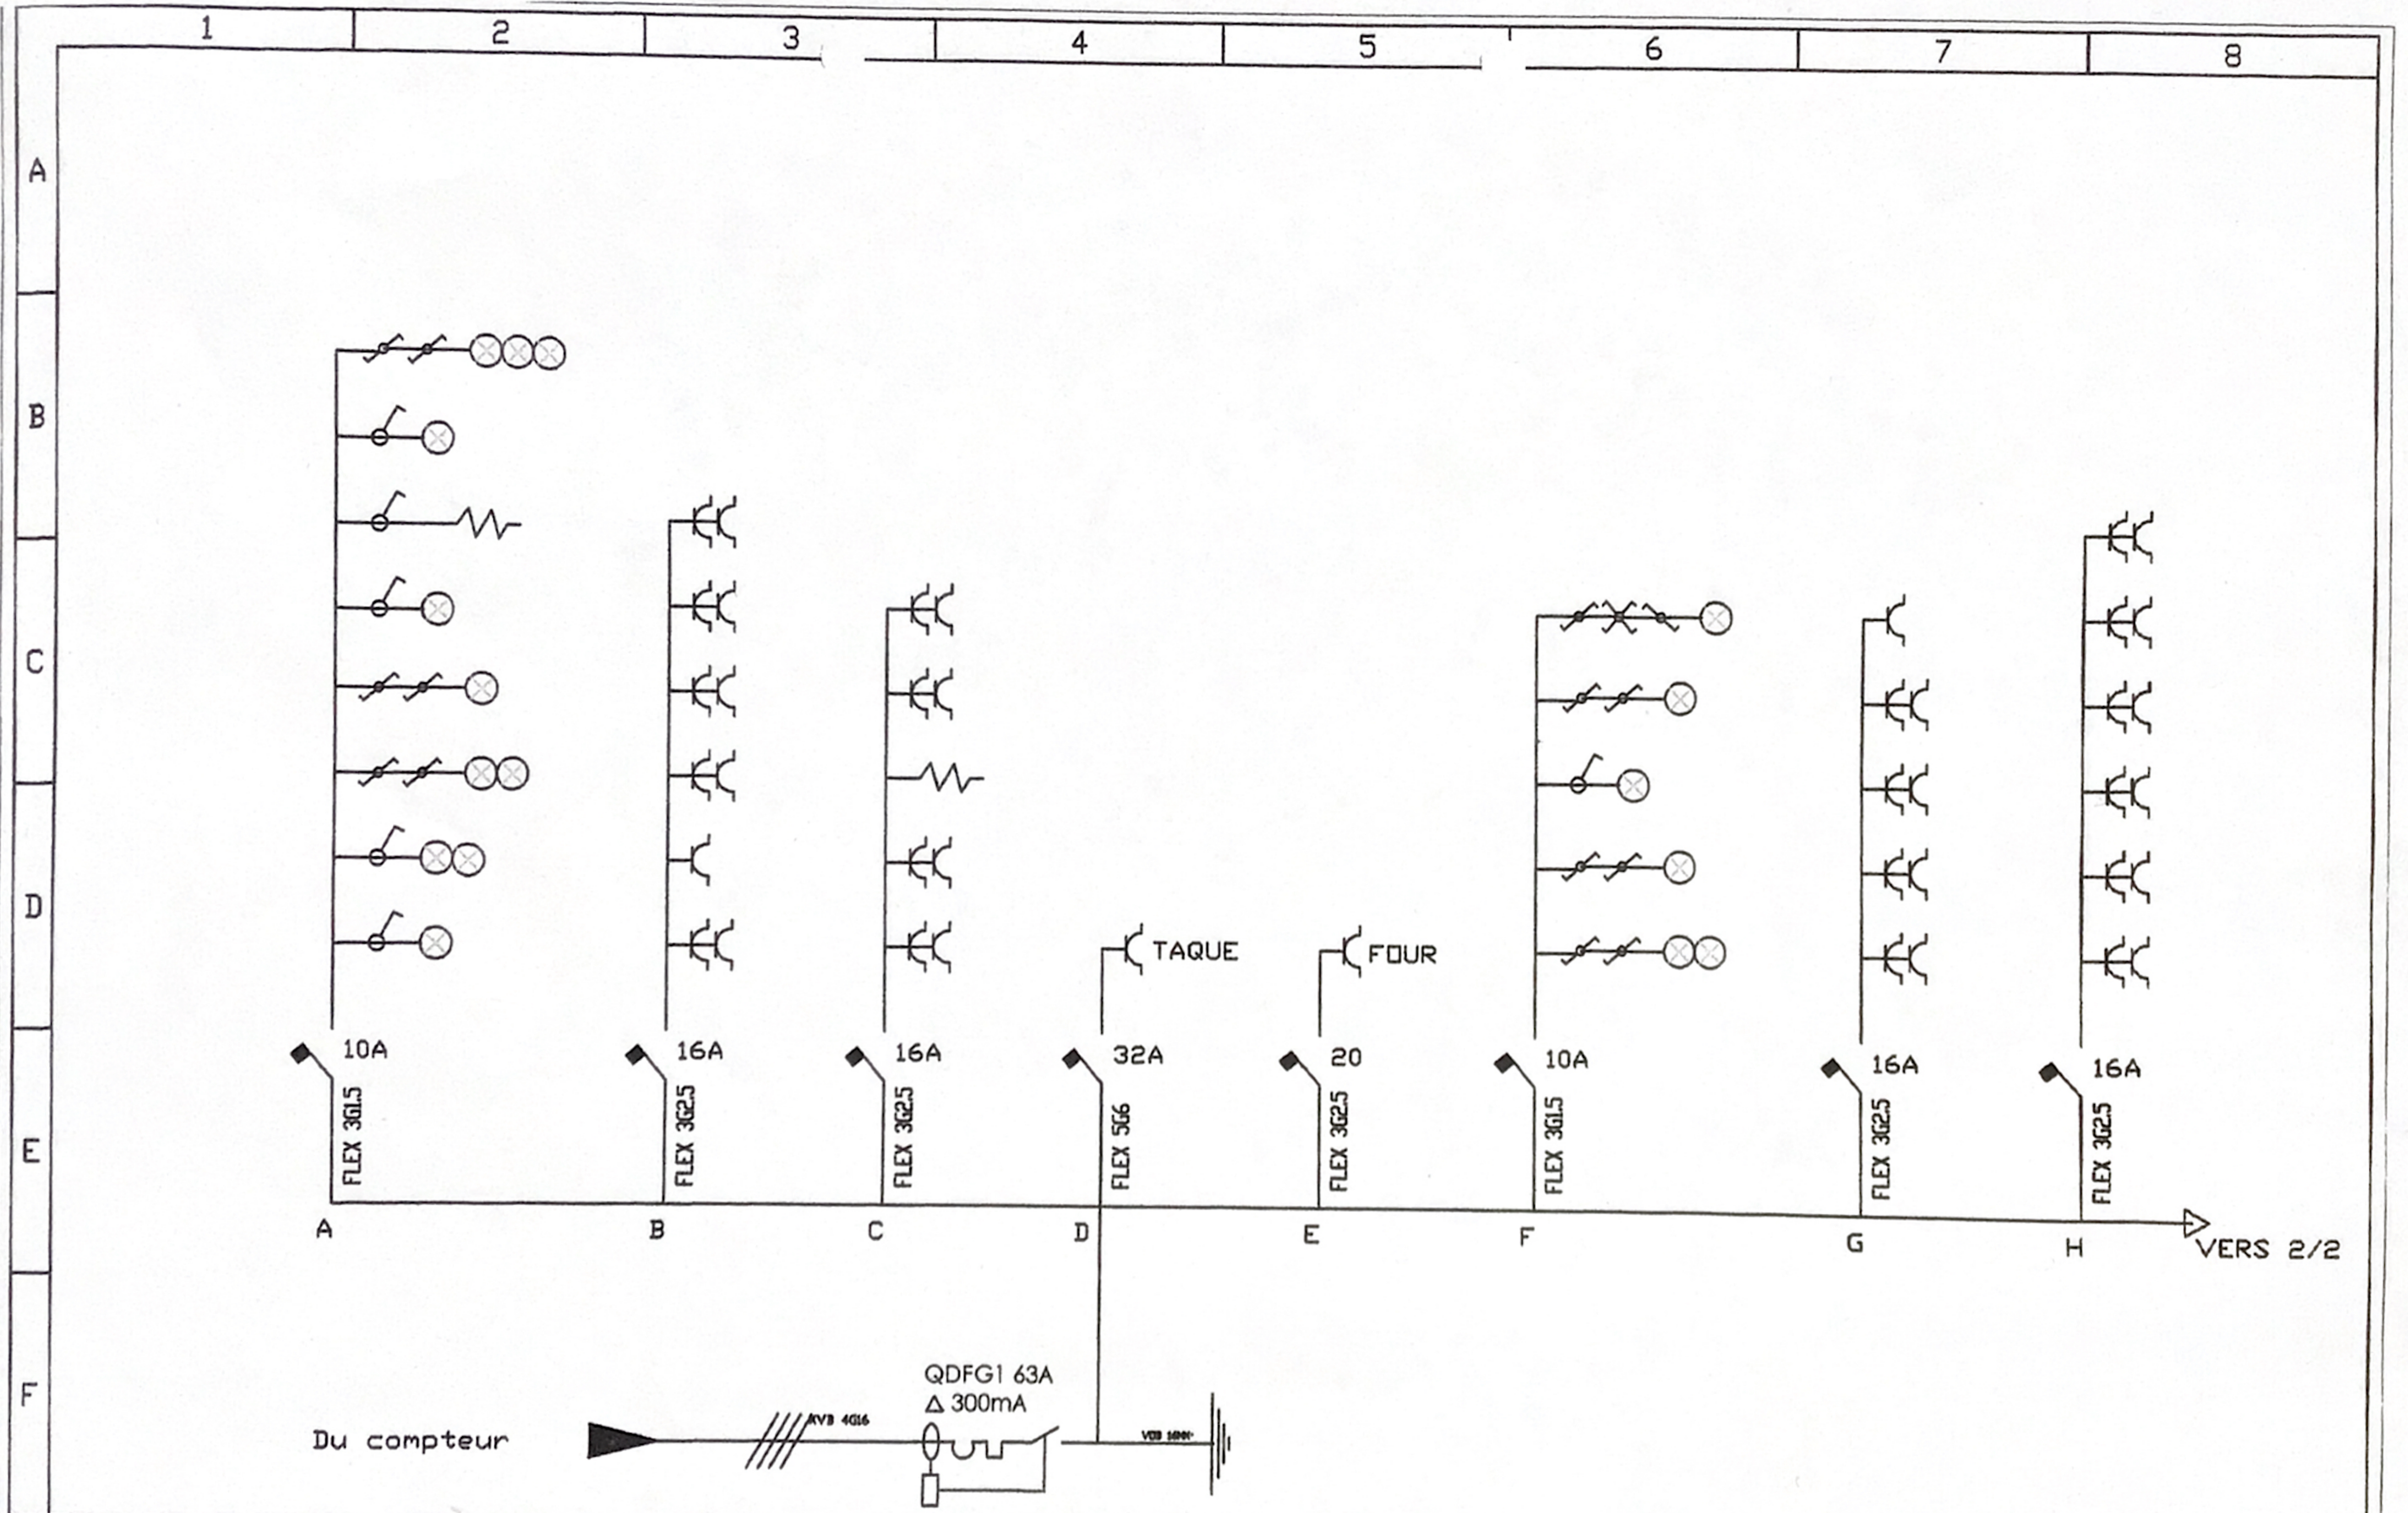

Du compteur

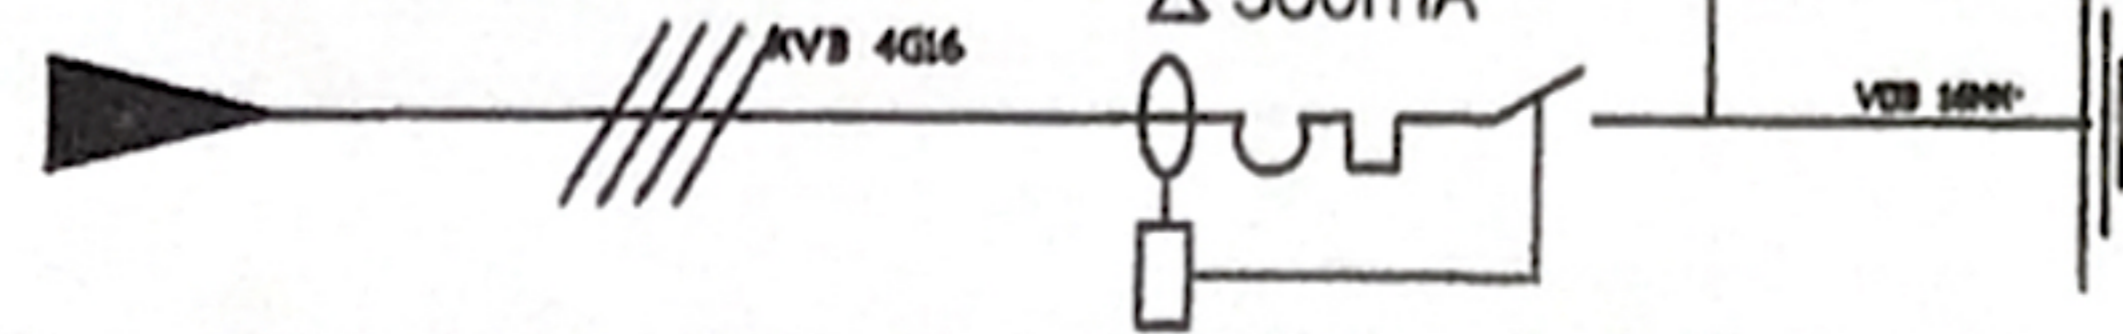


VERS 2/2

**AS TECHNICS**  
RUE DE L ANGLE 23 - 6040 JUMET  
TEL:0477/17.10.10

Désignation du dossier	WEMMEL COLISEUM		
Désignation du folio	APPARTEMENT 4.5		

Concepteur AS TECHNICS	Date	20/08/2009	AS-BUILT	Date dossier
	Réalisateur	GDW	<i>Signature</i>	Date folio
Vérificateur ALKAN			<b>ACEFG</b> 270 Kim Dedecker	1/2
				27/04/2023

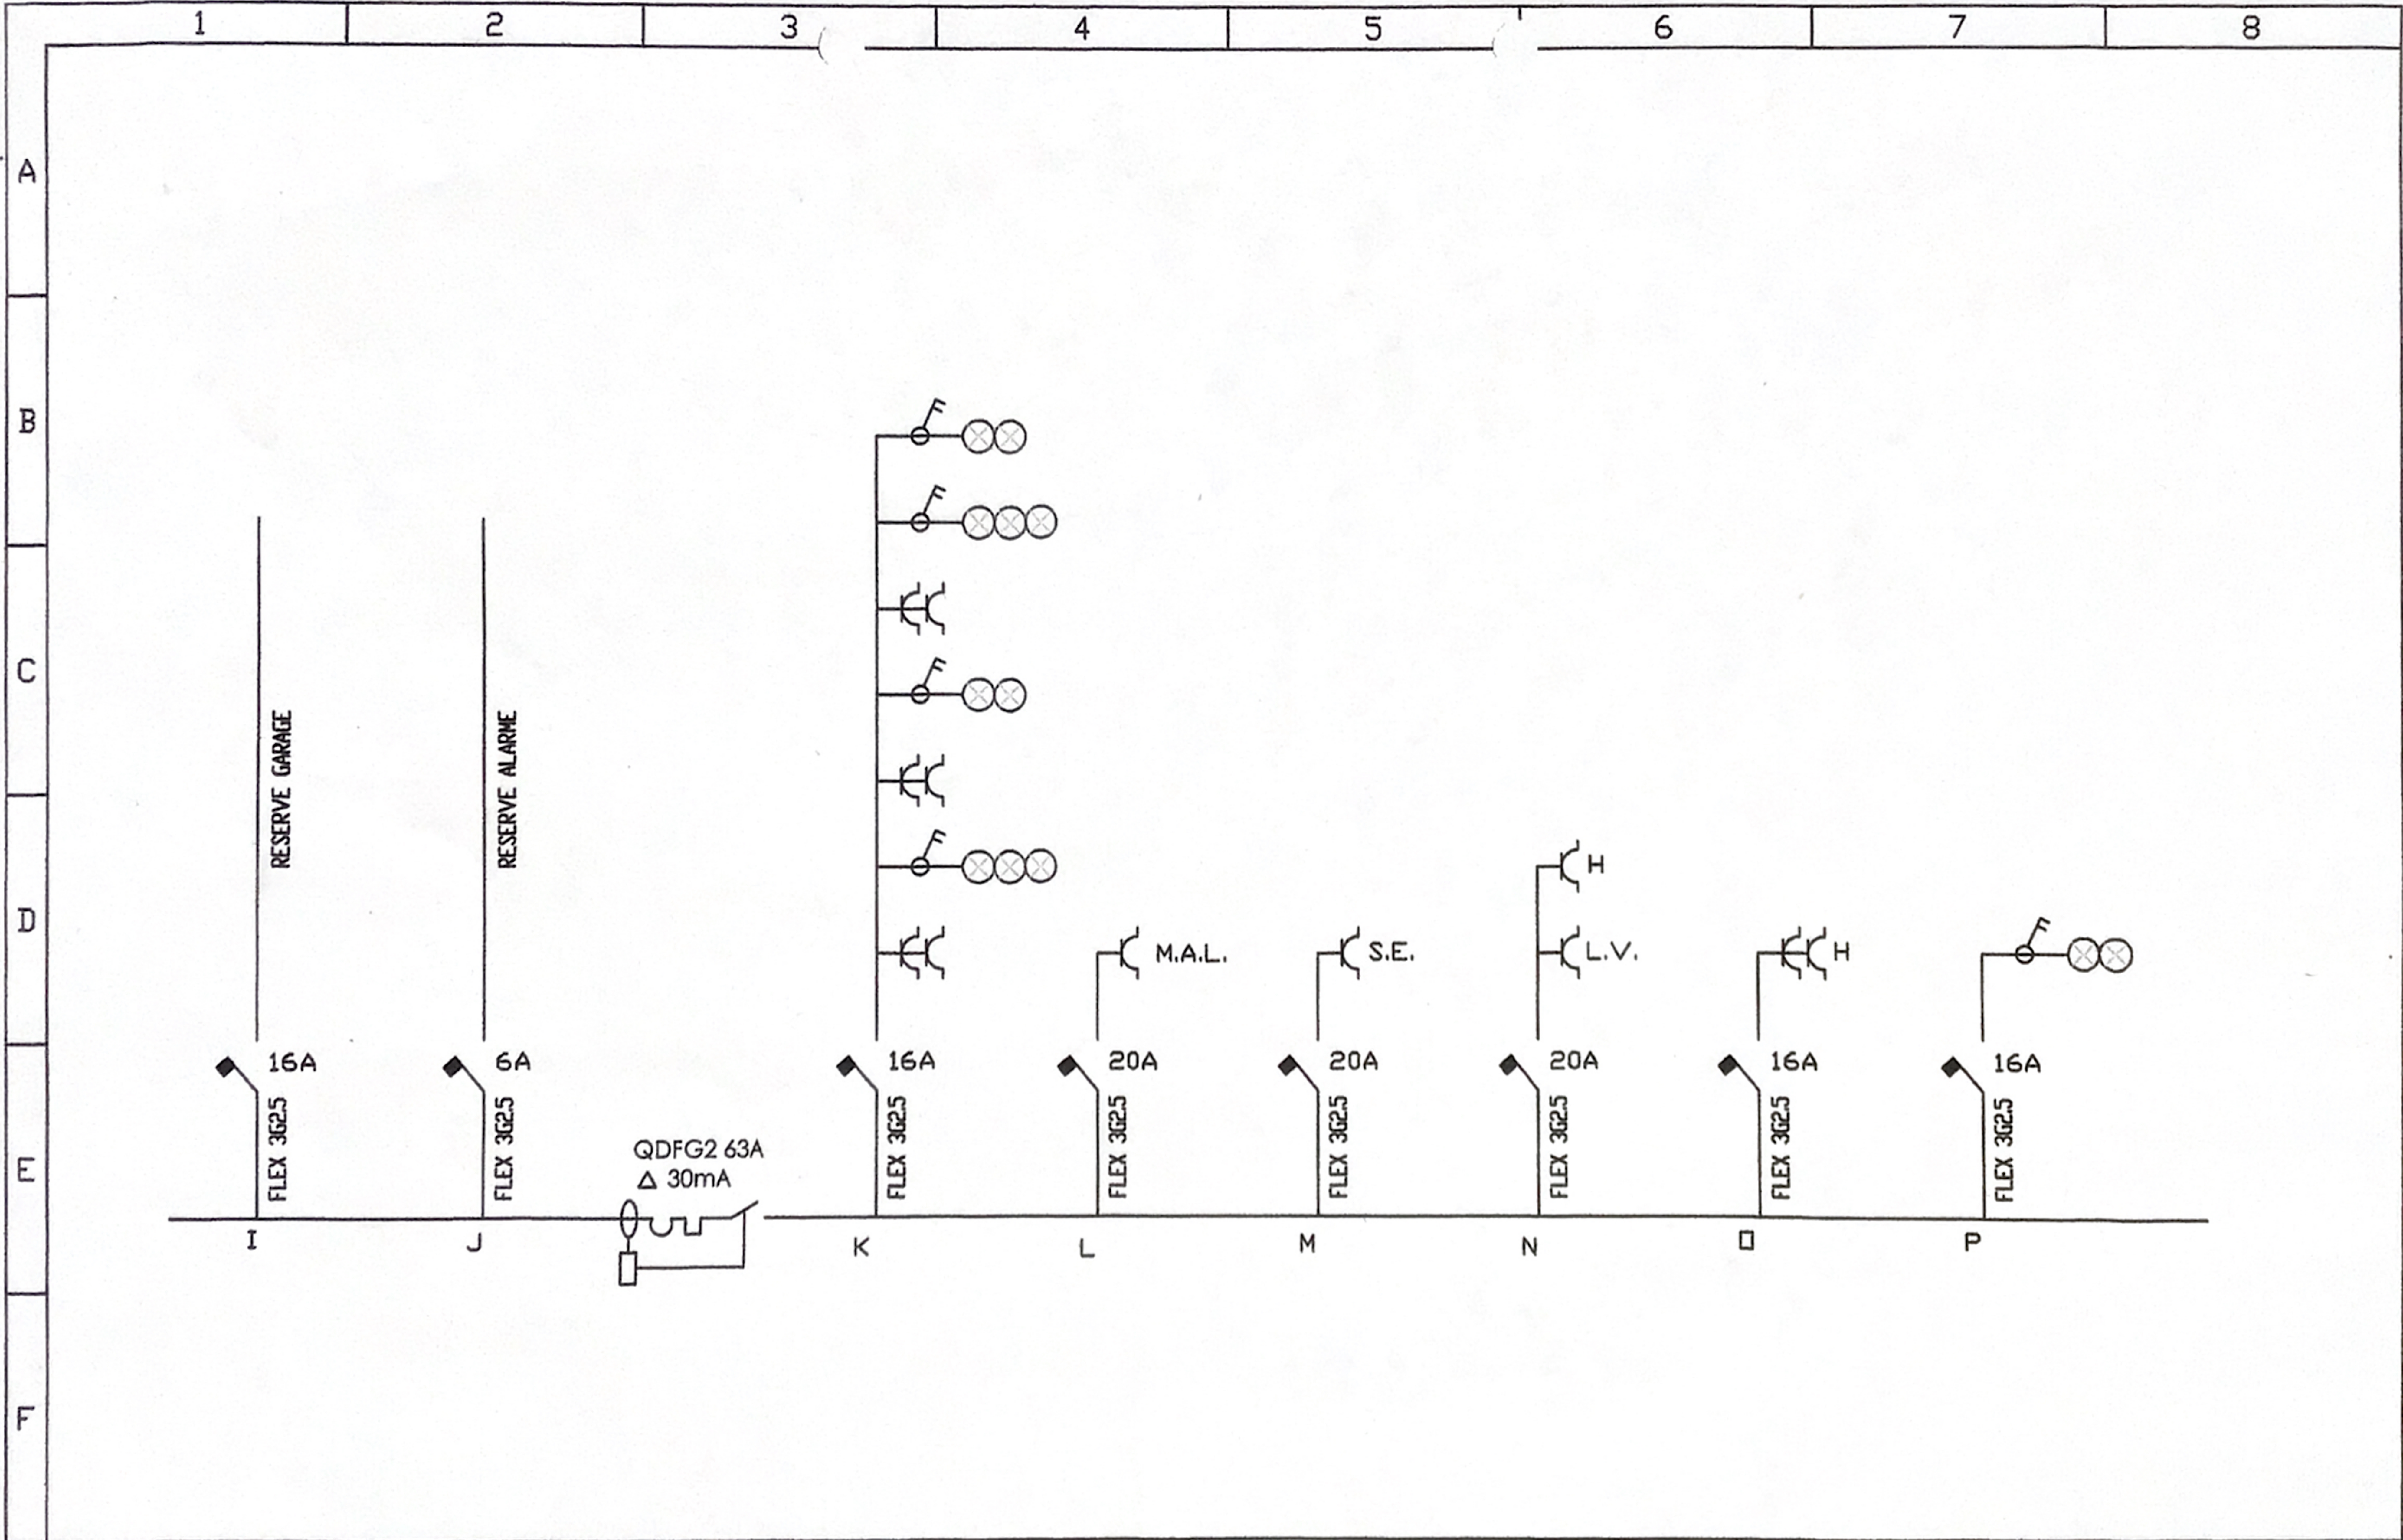


**AS TECHNICS**  
 RUE DE L ANGLE 23 - 6040 JUMET  
 TEL:0477/17.10.10

Désignation du dossier  
**WEMMEL COLISEUM**

Désignation du Folio  
**APPARTEMENT 4.5**

Concepteur <b>AS TECHNICS</b>	Date	Modifications	Date dossier
	20/09/2009	AS-BUILT	
Réalisateur <b>GJW</b>		<i>[Signature]</i>	Date Folio
Vérificateur <b>ALKAN</b>		<b>QACEG</b> [278] Kim Dedecker	2/2
		27/04/2023	

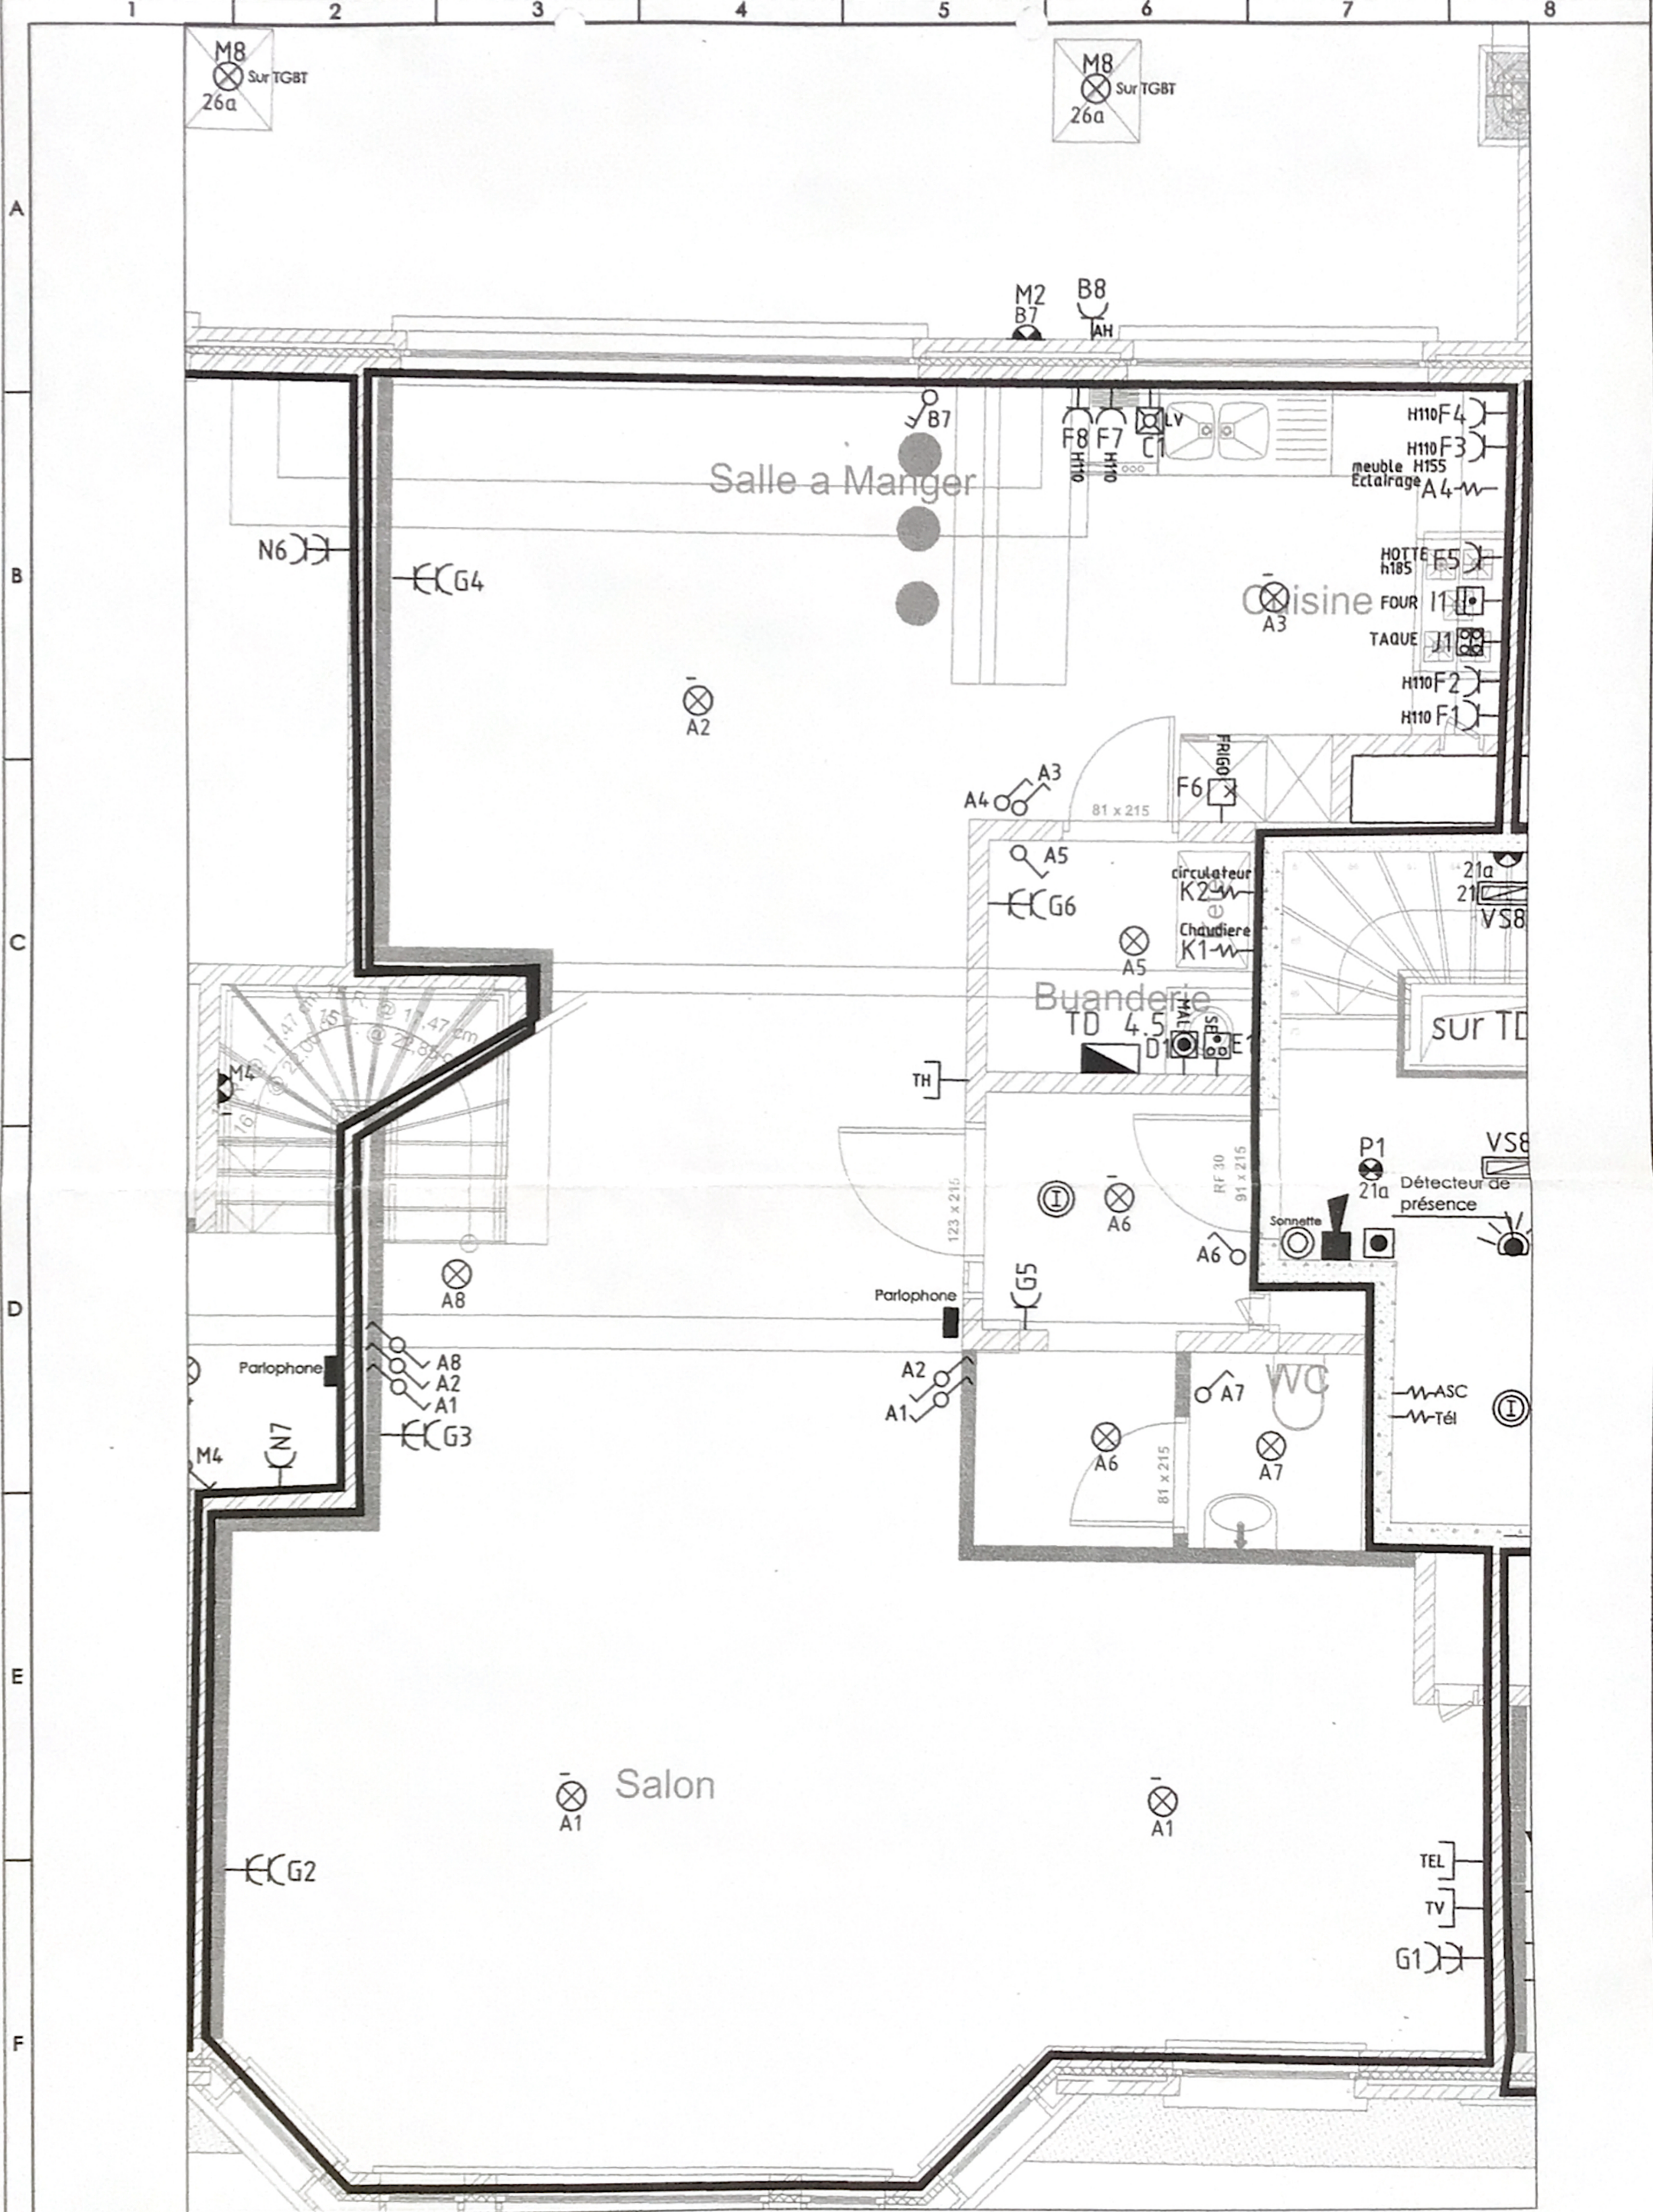

**AS TECHNICS**

RUE DE L ANGLE 23 6040 JUMET  
TEL 071/35-02-22 FAX 071/35-02-23

Désignation du dossier

WEMMEL COLISEUM

Désignation du lot

Deuxième étage, appartement 4.5

Concepteur

AS TECH

Matriculeur

GDW

Vérificateur

ALKAN

Date

22-06-09

Date de l'auto

27/04/2023

Date de l'auto

27/04/2023

Date dossier


22-06-09

Date de l'auto

27/04/2023

Date de l'auto


1/2

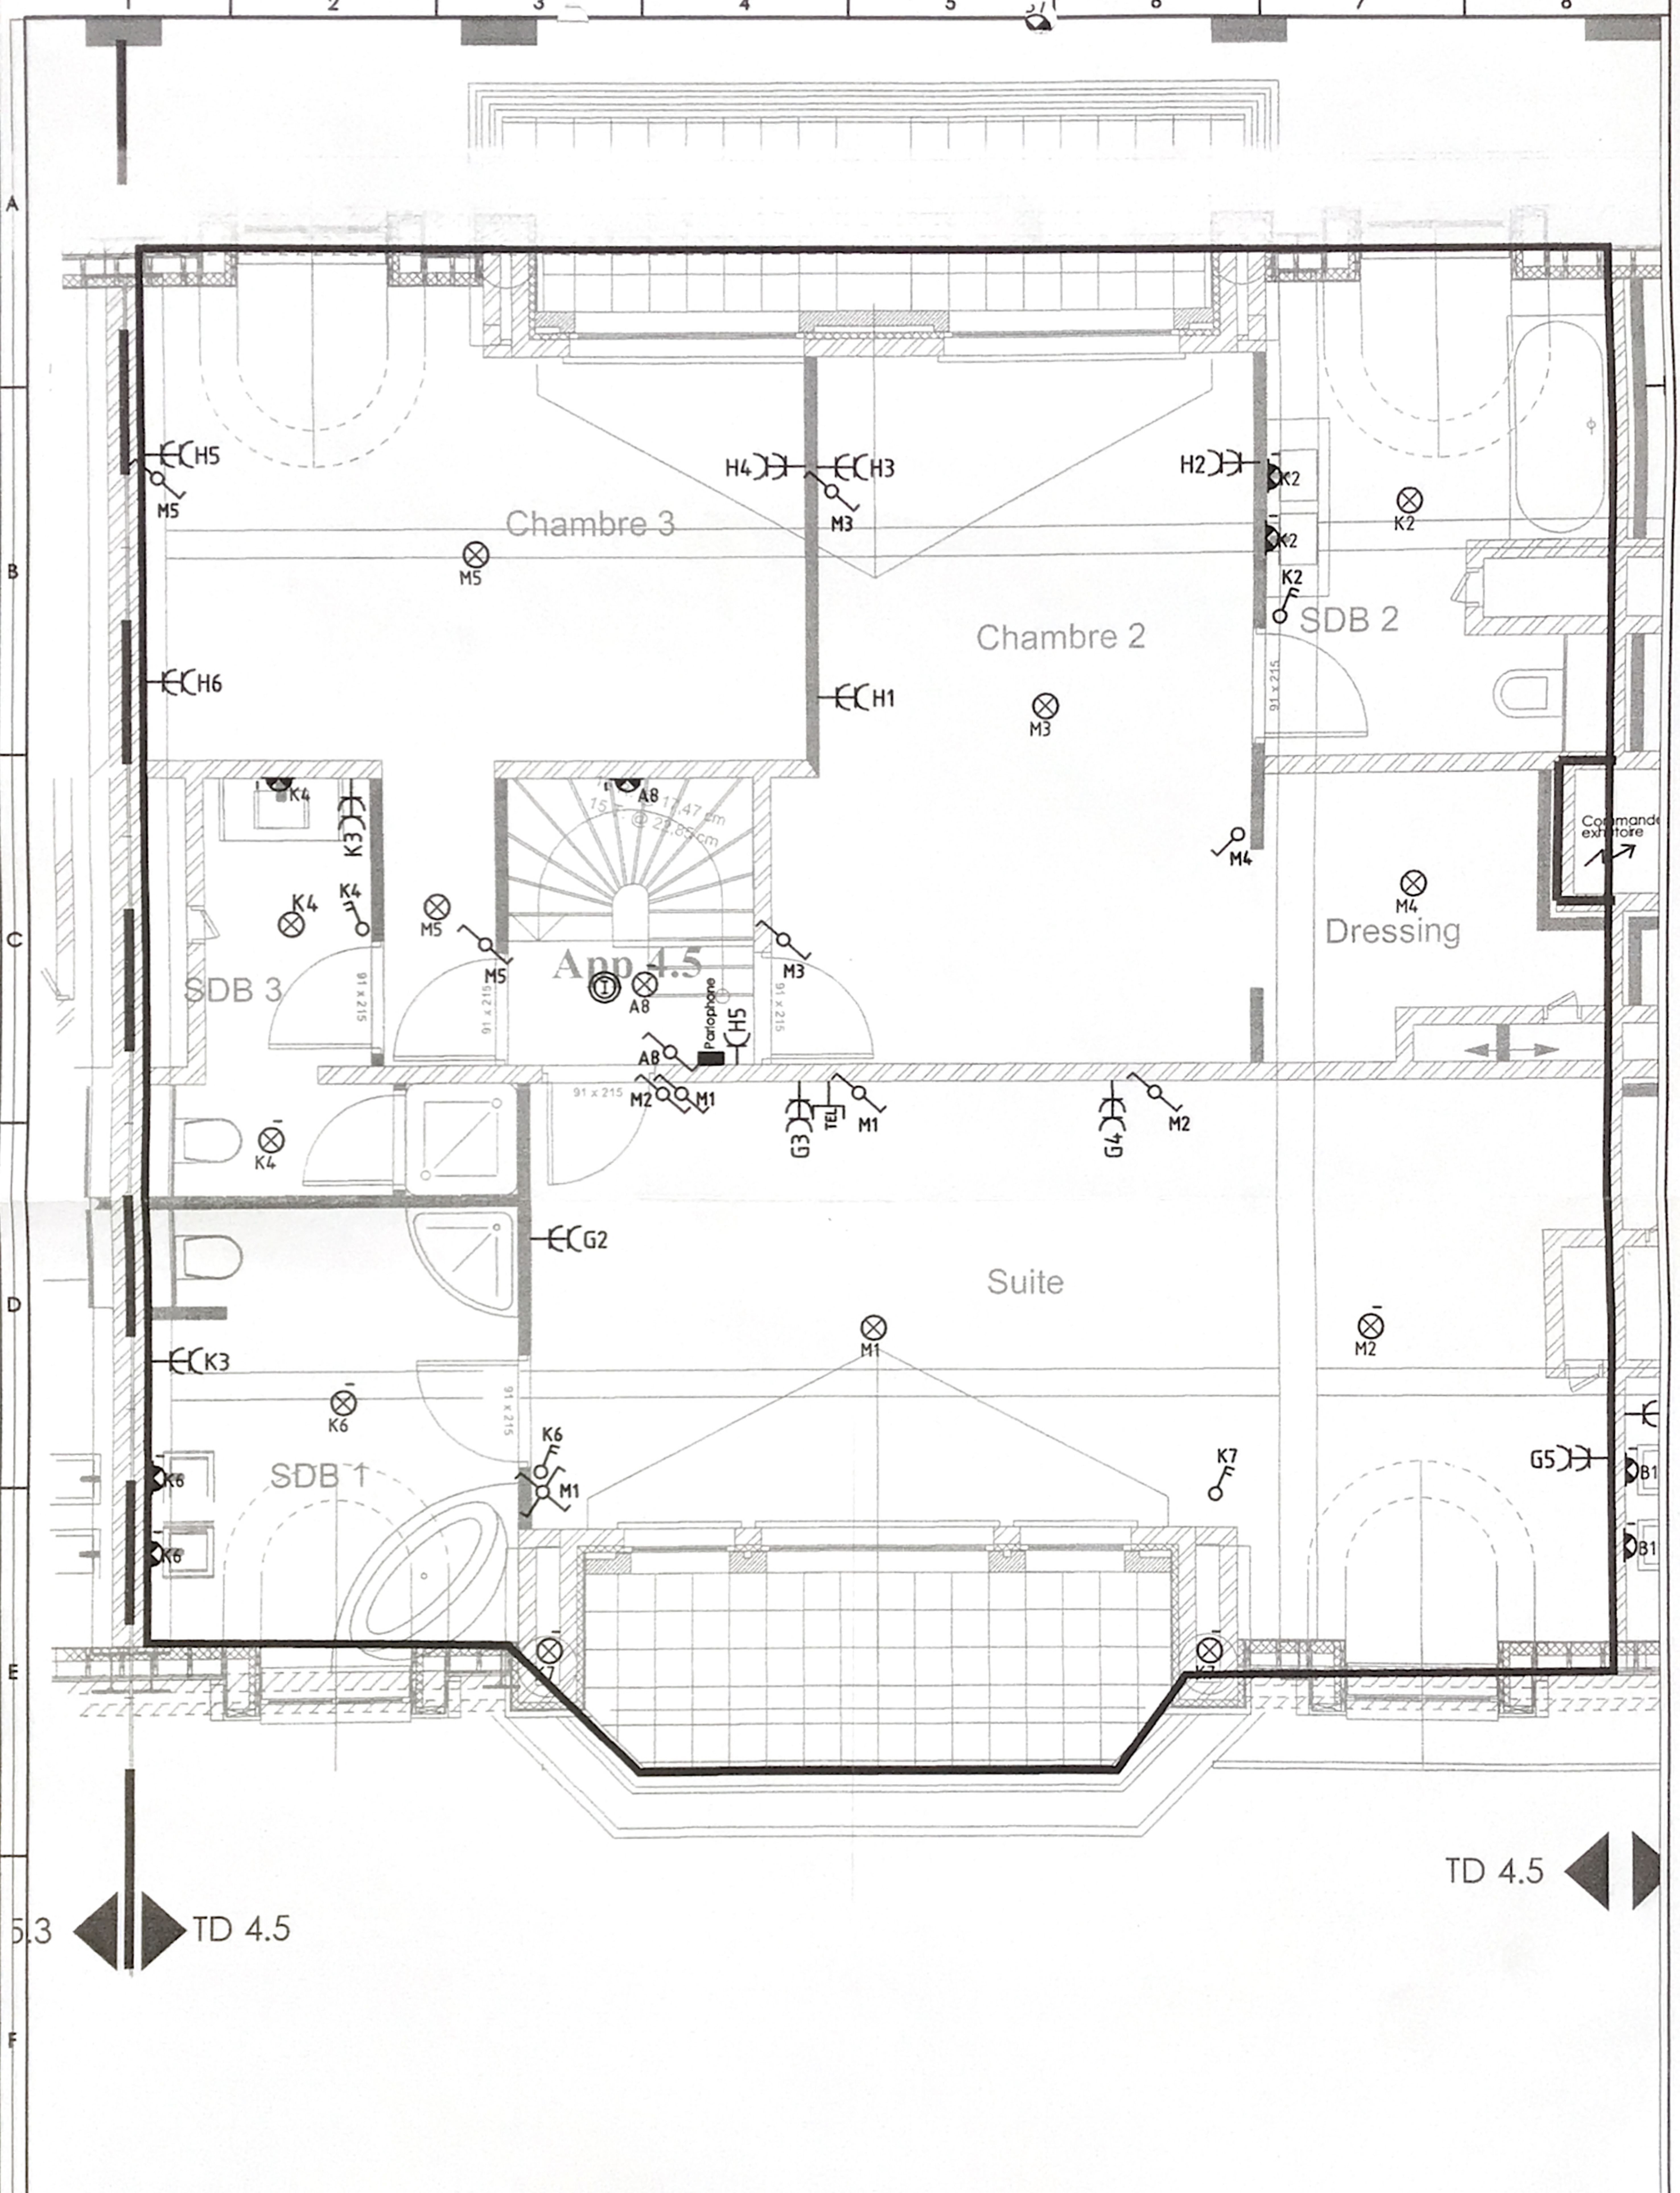

**AS TECHNICS**

Rue de l'Angle 23 - 6040 Jumet  
 TEL: 071/35.02.22 FAX:071/35.02.23

Désignation du dossier: **WEMMEL COLISEUM**  
 Désignation du lot: **DEUXIEME ETAGE APPART 4.5**

Concepteur	AS TECHNICS	Date	22-06-09	Modificateur	AS BOUT	Date dossier
Rédacteur	GDW					Date lots
Vérificateur	ALKAN					
				 K&M Dedecker 27/04/2023		
