



vzw - AIB-VINCOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 1035430341.1.14

N 028193

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: Van Cleemput

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, Voornaam: Van Cleemput L en R
Ident. Kaart nr.:
BTW nr.: BE 0475766509
Naam, Voornaam: FIVA
Adres: Hufferstraat 30
Post nr. + Stad: 1900 St. Niklaas
Tel.:
Schoofstraat 12
Bxl

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☒ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.:	Meterstand dag: nacht:														☐ kWh excl. nacht meter:	
	Bescherming aansluiting (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐														nr.:	Meterstand:
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n :	☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V ☐														Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A):	☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐														☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord:	4 X 10 mm ² - Type: AkB														☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting:	230V A / 300mA														Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen: 17
☒ Zie bijlage	zie schema																

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 4,5 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: 2,5 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken		Visum DNB:
Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNB:
Bestaande installatie		Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen	laadk. niet geplaatst	Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Vanden Vaele Agent nr.: 3543

Datum: 12/12/2013

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s):

☒ Eéndraadsschema(s):

☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te ...
De Federale overheidsservice economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen op elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, inzicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overbrenging zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreedingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

EENDRADSSCHEMA

Bijlage : nr
Verslag : nr


Adres installatie: Straat Hofstraat nr 30
Post nr. 9100 Gemeente St-Niklaas

BELGIUM

BESTAANDE INSTALLATIE ☐ NIEUWE INSTALLATIE ☒

Bord: App. Type B1

5e verdiep

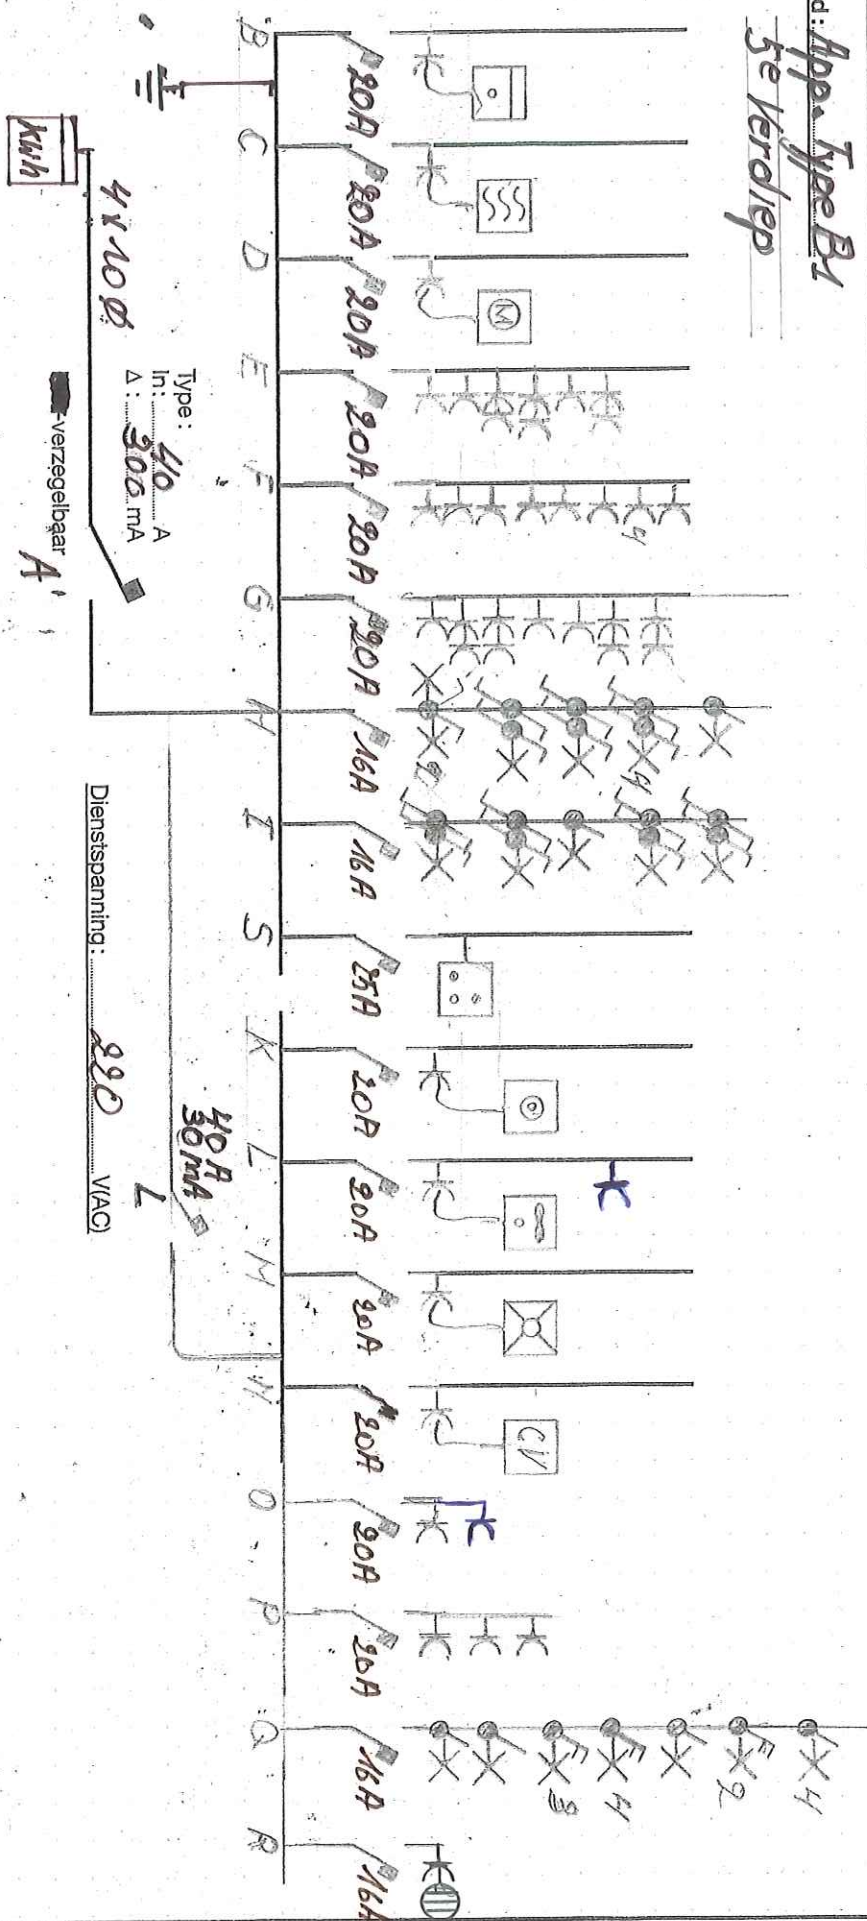

De erkende controle-instelling:
Handtekening:
Datum:

De eigenaar:

Naam:
Identif. nr.:
Handtekening


De installateur:
B.T.W. nr. 0005700
PARTNER ID-nr. 0005063

VAN CLEENPUT LEO & ZOON B.V.B.A.
Hofstraat 96
9100 Sint-Niklaas



VANDER VETMAM
Inspecteur
0475/68.83.44

Select a label Partner



ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
B.V.B.A. VANCLEEMPUT LEO & ZN

Hofstraat 96 9100 Sint-Niklaas
 Tef. 03/777.12.08
 Fax 03/766.51.13
 Gsm 0475/62.87.26 - 0475/56.56.07
 Antw. app. 03/77769.55
 E-Mail: VanCleemputLeo-Zn@pandora.be
 B.T.W.: BE 475.706.509

Beschrijving verdeelbord techn. Ruimte
Standaard

B1.5

Bouplaats : Residentie Boudelo
 Hofstraat 30
 9100 St-Niklaas

Opdrachtgever: F.I.V.B
 Fédérale Immobilienvennootschap van het Bouwbedrijf nv
 Stoofstraat 12 1000 Brussel

spanning: 1F+N 220V
 MONO 40A

S	T	U	V	W	X	Y	Z	
25A								
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
30mA 40A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	16A	16A
A	B	C	D	E	F	G	H	I
300mA 40A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	16A	16A

Beschrijving verdeelbord techn. Ruimte

Standaard

B1.5

Bouplaats : Residentie Boudelo
Hofstraat 30
9100 St-Niklaas

Opdrachtgever: F.I.V.B
Fédérale Immobilienvennootschap van het Bouwbedrijf nv
Stoofstraat 12 1000 Brussel

spanning: 1F+N 220V
MONO 40A

A	Hoofd aardlekschak	
B	stopk.	oven
C	stopk.	micro golf
D	stopk.	ventilatie
E	stopk.	keuken
F	stopk.	inkom slaapkamers 2 / 3 deur zithoek berging
G	stopk.	slaapkamers
H	licht	inkom wc zithoek berging keuken
I	licht	slaapkamers
J	Aardlekschak.vochtige componenten	
K	stopk.	wasmachine
L	stopk.	droogkast + w.c
M	stopk.	vaatwas
N	stopk.	cv
O	stopk.	tv tel techniek + bijkeuken
P	stopk.	badkamer
Q	licht	techniek wasplaats bakamer terras
R	licht STOPK	reserve Bijverwarming BADK.
S	aansluitpunt	kookplaat
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		
