

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 06/06/2016 Inspecteur: Koen De Lausnay Mentor: - Installateur: GLP electro services
Datum verslag: 06/06/2016 B.T.W. nr.: - IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 1779012 Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Koningin Fabiolapark
Huisnummer 787
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas
Type woning

Eigenaar:

Naam Ferket Vicky
Straatnaam Koningin Fabiolapark
Huisnummer 787
Postcode 9100
Gemeente Sint-Niklaas

EAN : -

Teller Nr.: : 8313498

Aard onderzoek: Herkeuring van huishoudelijke installaties van voor 1981 die bij het gelijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI artikels 274, 278 en 86.

Netbeheerder: EANDIS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 9 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 1 Ω Isolatie: 500 M Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I_{Δ}	I_n	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	9	Ok	Ok
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
Zie schema					

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☒ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

CONCLUSIE

- ☒ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.** De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 06-06-2041
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.** Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Koen De Lausnay


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit


Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

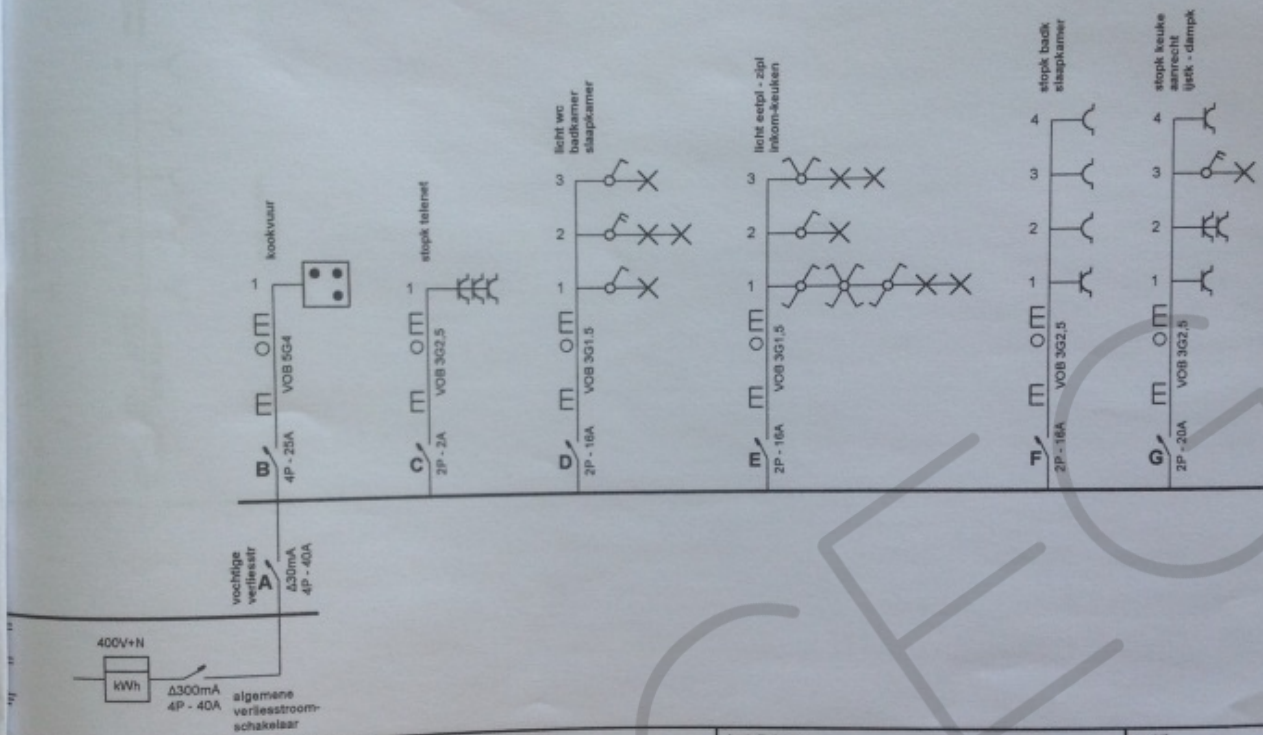

nd Organisme
ing :


QACEG 10
Koen de Lausnay


Plaats van de elektrische installatie
Ferket Vicky bedriferrevisor bvba
Koningin Fabiolapark 787
9100 Sint-Niklaas
e-mail: Vicky Ferket <vickyferket@hotmail.com>
BE0546.532.840

Installateur
GLP Electro-Services bvba
Kiemerstraat 44
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
e-mail: peter.gl@telenet.be
BTW BE 0834.176.244

GLP
Electro - Services bvba
Kiemerstraat 44 - 9100 St-Niklaas
GSM 0479 70 20 17
peter.gl@telenet.be

p. 1/2
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

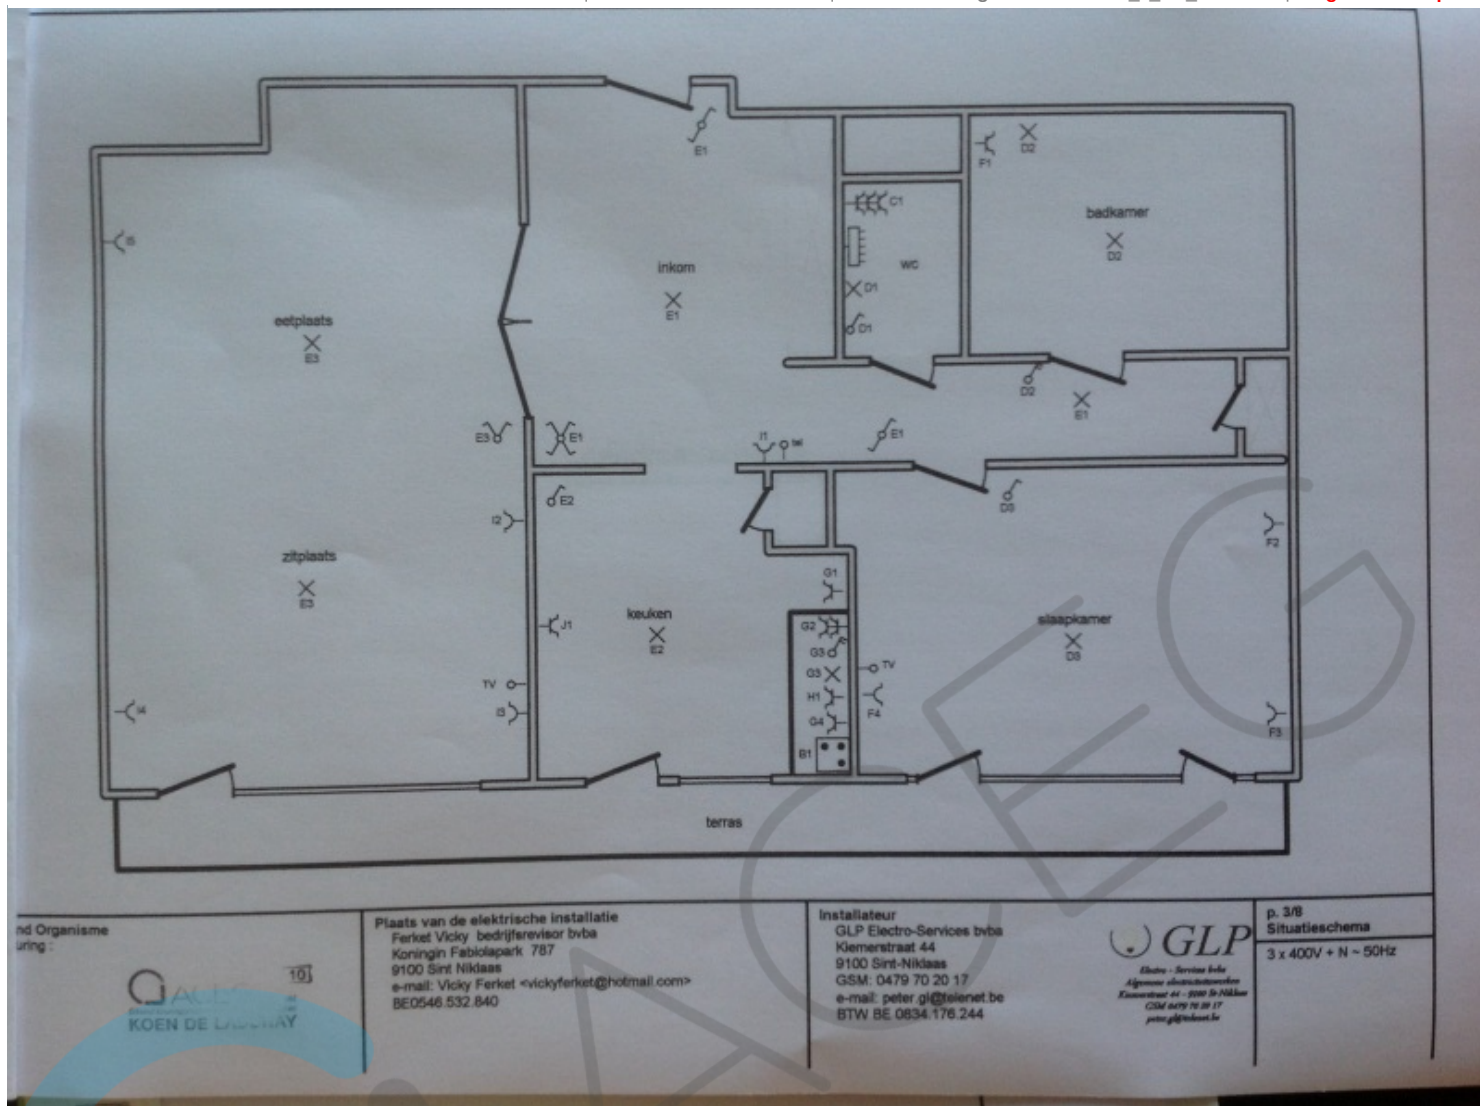

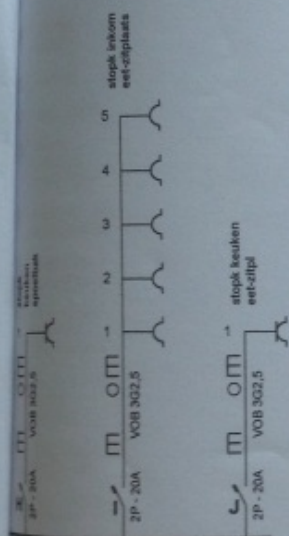

QACEG
KOEEN DE LAUSNAY

Plaats van de elektrische installatie
Ferket Vicky bedrijfsrevisor bvba
Koningin Fabiolapark 797
9100 Sint-Niklaas
e-mail: Vicky Ferket <vickyferket@hotmail.com>
BE0546.532.840

Installateur
GLP Electro-Services bvba
Kiemerstraat 44
9100 Sint-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
e-mail: peter.gl@telenet.be
BTW BE 0834.176.244

GLP
Electro - Services bvba
Algemeen elektricien
Kiemerstraat 44 - 9100 St-Niklaas
GSM: 0479 70 20 17
peter.gl@telenet.be

p. 2/2
Bendraadschema
3 x 400V + N - 50Hz

