

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 30/07/2016 Inspecteur: Yves Pelgrims Mentor: - Installateur: To Do bvba
Datum verslag: 30/07/2016 B.T.W. nr.: BE.0940.737.953 IK. nr.: -
Merk en type meettoestel: Fluke Serie Nr.: 1779013 Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam Liersesteenweg
Huisnummer 135 bus 11
Postcode 2520
Gemeente Emblem
Type appartement

Eigenaar:

Naam Goossens Levi
Straatnaam Liersesteenweg
Huisnummer 135 bus 11
Postcode 2520
Gemeente Emblem

EAN : 541448620047908008

Teller Nr.: : 32660395

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Nelbeheerder: Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 17 Aardelektrode: Pen pen weerstand: 6,3 Ω Isolatie: 5,4 M Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

i Δ	In	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	17	ok	ok
30 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	4	ok	ok
mA	A					

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
zie schema		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²
		mm ²			mm ²

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK Directe aanraking ☒ OK ☐ NOK Indirecte aanraking ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK Correcte schema's ☒ OK ☐ NOK schema in bijlage door Aceg vzw ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK Verlichting / toestellen ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

CONCLUSIE

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 29/07/2041
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 1

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De Inspecteur Yves Pelgrims



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KM/O, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

tel begin
41
deel 1 van 1

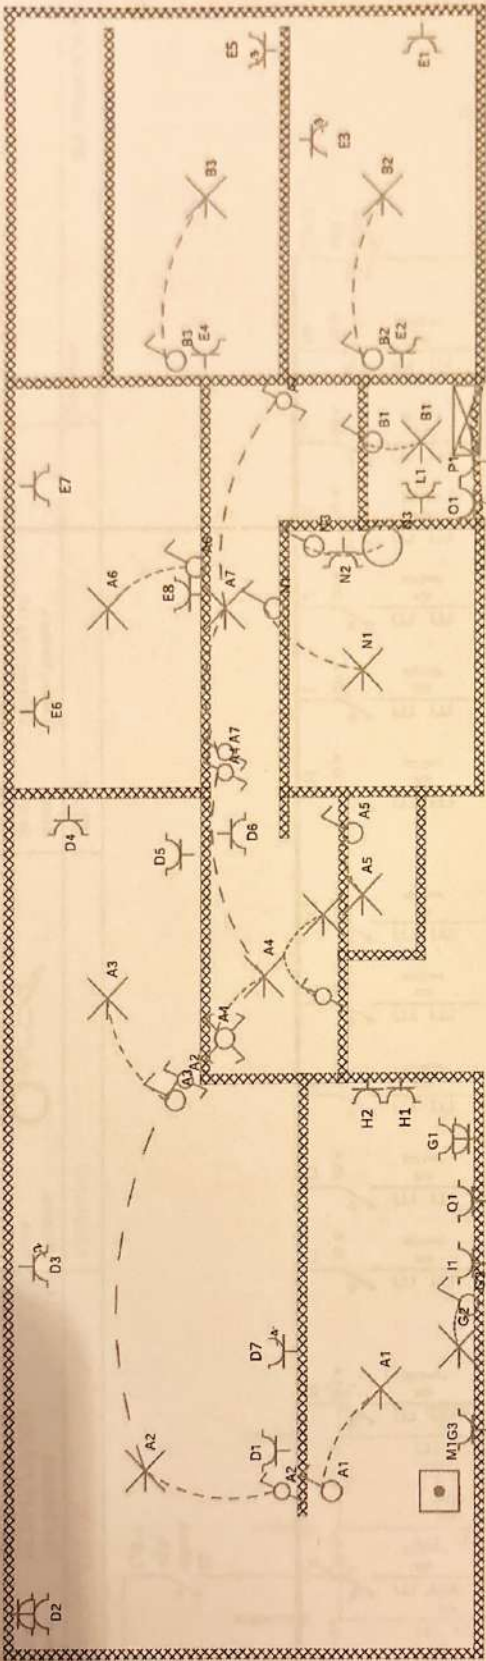


INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Verdeop L	3N, 400V/230V~
Naam	Tim Joosens	ORGANIS.	ACEG	Naam	Emblem Verdeop L		
BTW	BE.0640.737.953	Naam	ACEG	Straat	Liersesteenweg 135		
Datum	28/07/2016	Datum		Gemeent	Ranst		
Handloek		Handloek		Handloek			

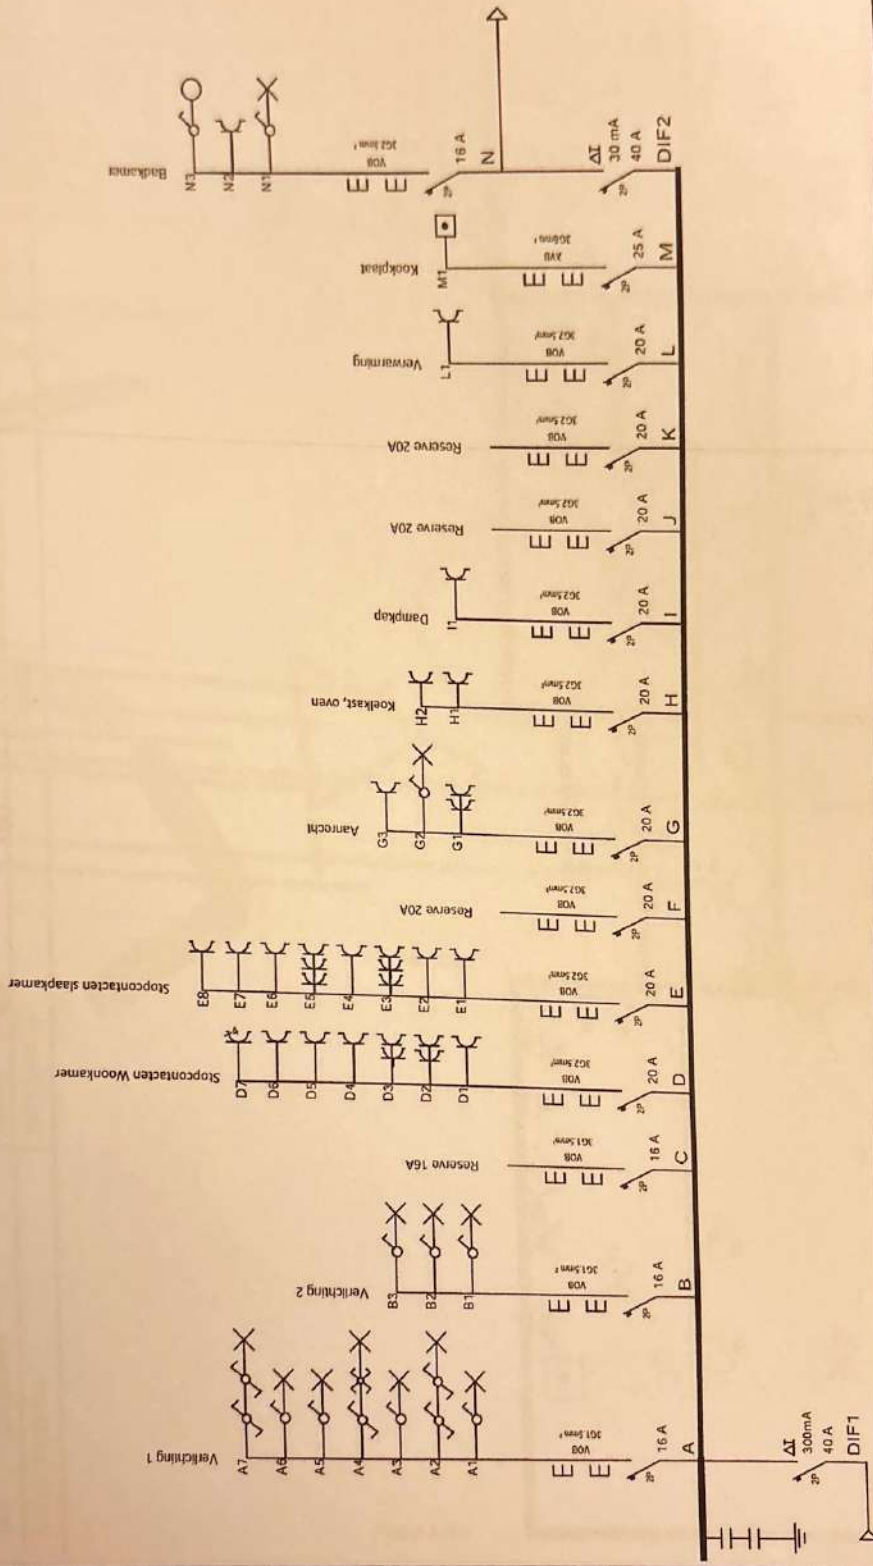

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema 1 A		3 N. 400V/230V-	
Naam	Tim Joosens	ORGANIS.		Naam	Enbelen Verdiep L	Schema 1 A		3 N. 400V/230V-	
BTW	BE 0640.737.953	Naam		Straat	Lierssteenweg 135				
Datum	08/07/2016	Datum		Gemeente	Ranst				
Handtek	<i>Tim Joosens</i>	Handtek		Handtek					



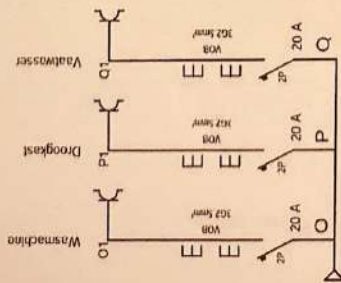

Geplaatst op 10-10-2016

INSTALLATEUR		KEURING	WERF	Schema 1B	3N, 400V/230V-
Naam	Tim Joosens	ORGANIS,	Naam	Emblem Verdep L	
BTW	BE 0640.737.953	Naam	Straat	Lierassienweg 135	
Datum	28/07/2016	Datum	Gemeente	Ranst	
Handtek	<i>[Handwritten Signature]</i>	Handtek	Handtek		



Tim Joosens

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Datum keuring: 14/01/2016

Inspecteur: Alexander Bai

Installateur: To-Do bvba

Datum verslag: 14/01/2016

B.T.W. nr.:-

IK, nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B

Serie Nr.: 2316013

Toestel mag gebruikt worden tot: 04/01/2017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Liersesteenweg

Huisnummer: 135

Postcode: 2520

Gemeente: Emblem

Type: gemeensch. delen

Eigenaar:

Naam: -

Straatnaam: -

Huisnummer: -

Postcode: -

Gemeente: -

EAN : 541448820047907995

Teller Nr.: 31931501

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: EANDIS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 5

Aardelektrode: Lus pen weerstand: 6,3 Ω

Isolatie: 20,1 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

I_{Δ}	I_n	$I_{\Delta t}$	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	ok	ok
mA	A				-	-
mA	A				-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
Curve	IN	P	Curve	IN	P
3	C	16	2	1,5 mm²	mm²
2	C	20	2	2,5 mm²	mm²
				mm²	mm²
				mm²	mm²

Visueel nazicht (algemeen)

☒ OK ☐ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☒ OK ☐ NOKschema in bijlage door Aceg vzw ☐

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK☐ niet van toepassing☐ in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen inbreuken vastgesteld.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 14/01/2041

- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontegenankelijk zijn gemaakt door verzegeeling.
- Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 1

VOOR DE TECHNISCH DIRECTEUR ELEKTRICITEIT

Alexander Bal

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en/of wijzen, rechtsredes of onrechtzaks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk ingedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteti

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.
