

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 02/03/2026

Inspecteur: Jetske Augustijnen

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102 BT

Serienummer: 23021936

Datum verslag: 03/03/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kapellestraat
Huisnummer 3
Busnummer +
Postcode 9570
Gemeente LIERDE
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Kapellestraat
Huisnummer 3
Busnummer +
Postcode 9570
Gemeente LIERDE
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : non-domestic installation (shop premises, office, restaurant) _ 63A

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr.: : 34758669

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 8.3.2 en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 22

Aardelektrode:

Ri algemeen: 0,3 MΩ

RE: - Ω

NOK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	A	22	OK	OK
30	40		-	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	1,5
9	C	20		2	1,5
10	C	16		2	2,5
1	C	16		3	4
1	C	20		3	4

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	NOK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	NOK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		
Uitwendige invloeden	NOK				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Ééndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	Kringen met andere waarde automatisch, kringen niet op plannen,...
I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	
I12.01 De externe invloedsfactoren werden ons niet schriftelijk meegedeeld en konden ter plaatse niet worden vastgesteld in het bijzijn van de beheerder of zijn afgevaardigde.(Boek 1 Afdeling 5.1.4. & 9.1.6.)	
I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)	Kring K en L
I3.07 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) dient aangebracht te worden in de aardgeleider teneinde de meting van de aardweerstand mogelijk te maken. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.3.5.)	
I8.13 Het gebruik van kabels van het type VTLmb, LMVVR, COAX, VVT is verboden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.1.2.)	
I8.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren. (Boek 1 Onderafdeling 4.2.3.3.b)	
I9.02 Loshangende schakelaars, contactdozen en/of aftakdozen dienen degelijk bevestigd te worden. (Boek 1 Afdeling 1.4.1. & 1.4.2)	
N17 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30ohm.	
N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.	
nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.	

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:44 tot 12:55
De inspecteur Jetske Augustijnen

Jetske

Jetske Augustijnen
ACEG VZW - #255


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte strek of onrecht strek, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481




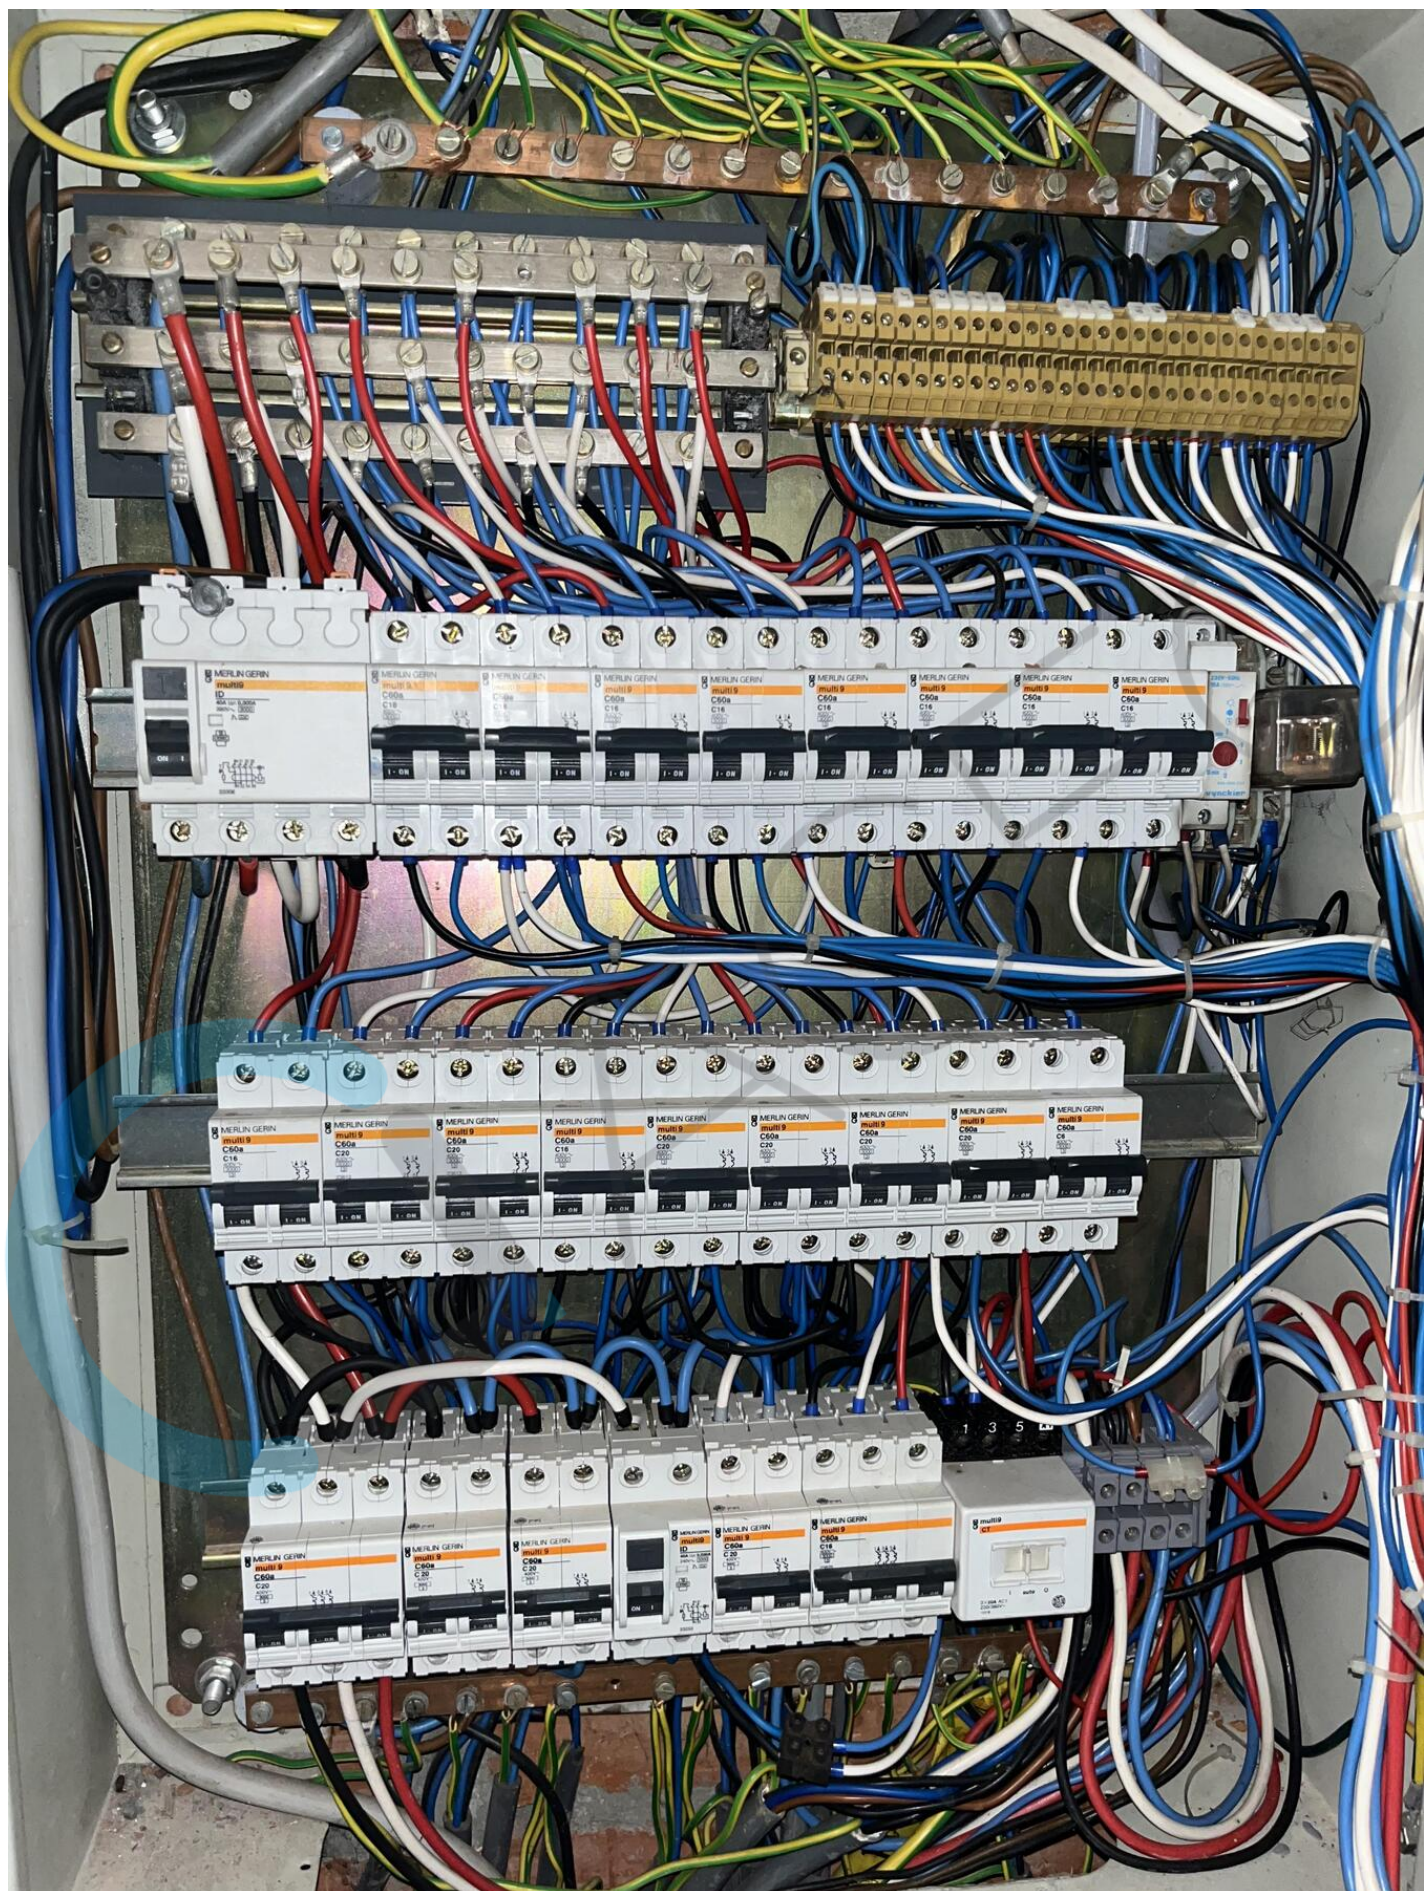



BENAMING STOPHONT.	BEVEILING	DRIND
ZAAL VOORAANT	J	W
ZAAL ACHTER + B	K	R
VERWARMING ZAAL	L	Z.
MUURK. BAR+BERG PL.	M	W
BAR WERKBLAD	N	R.
KUUKEN DOORSTEF.	O	ZW
ZAAL B	P	W
WARM WATER	R ¹	ZWART WIT ROOD
EL. VUUR	S	
KUUKEN MIDDEN	T	ZW
KUUKEN RECHTS	U	W
DIFF. Δ 30 MA		
KOFFIE AUTOMAAT	V	W

BENAMING - LICHT		BEVEILIGING	DRAND	KLEMMEN
ZAAL VOOR		A	ZW	1-2
ZAAL MIDDELEN		B	W	3-4
ZAAL ACHTER		C	R	5-6
INKOM		B	W	7-8
SPOTS		D	ZW	9-10
WAND		E	W	11-12
LICHT WC		F	R	13-14
AFZUIG WC		F	R	15-16
BERGING		G	ZW	17-18
KEUKEN		H	W	19-20
BAR		G	ZW	21-22
ZAAL B		E	W	23-24
VERWARMING ZAAL B		P	W	25-26
WARM WATER		R	ZW	27-28
NOOD LICHT		I	R	

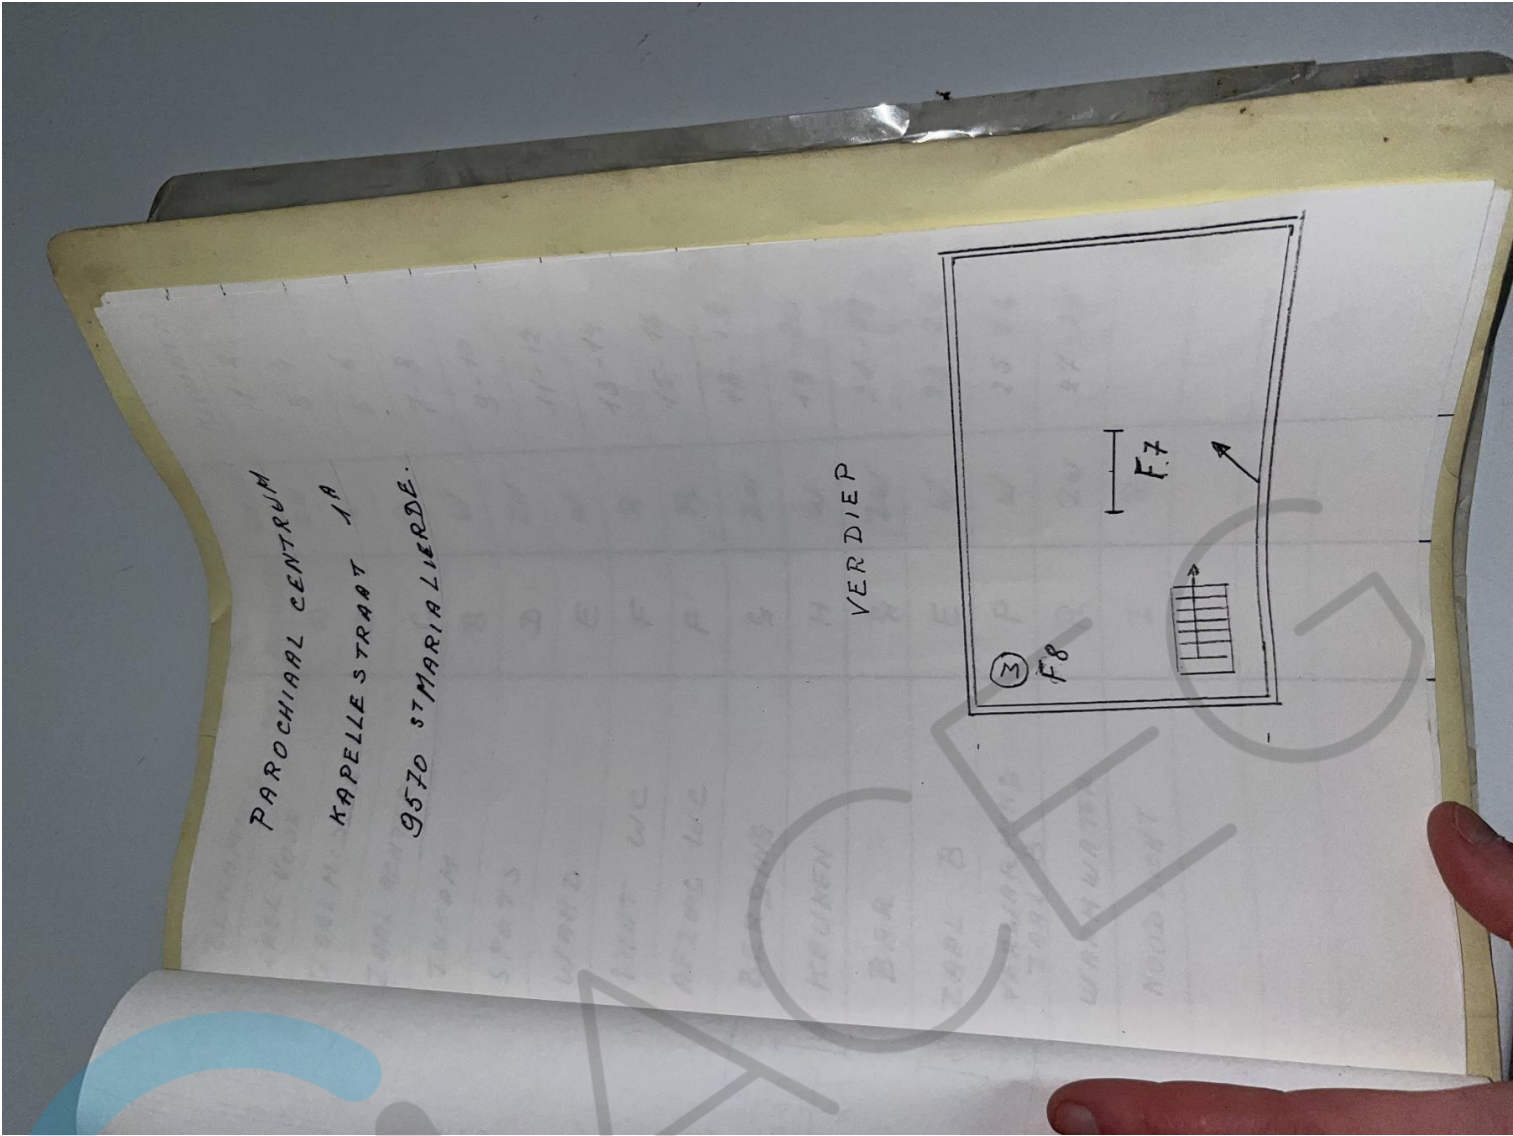

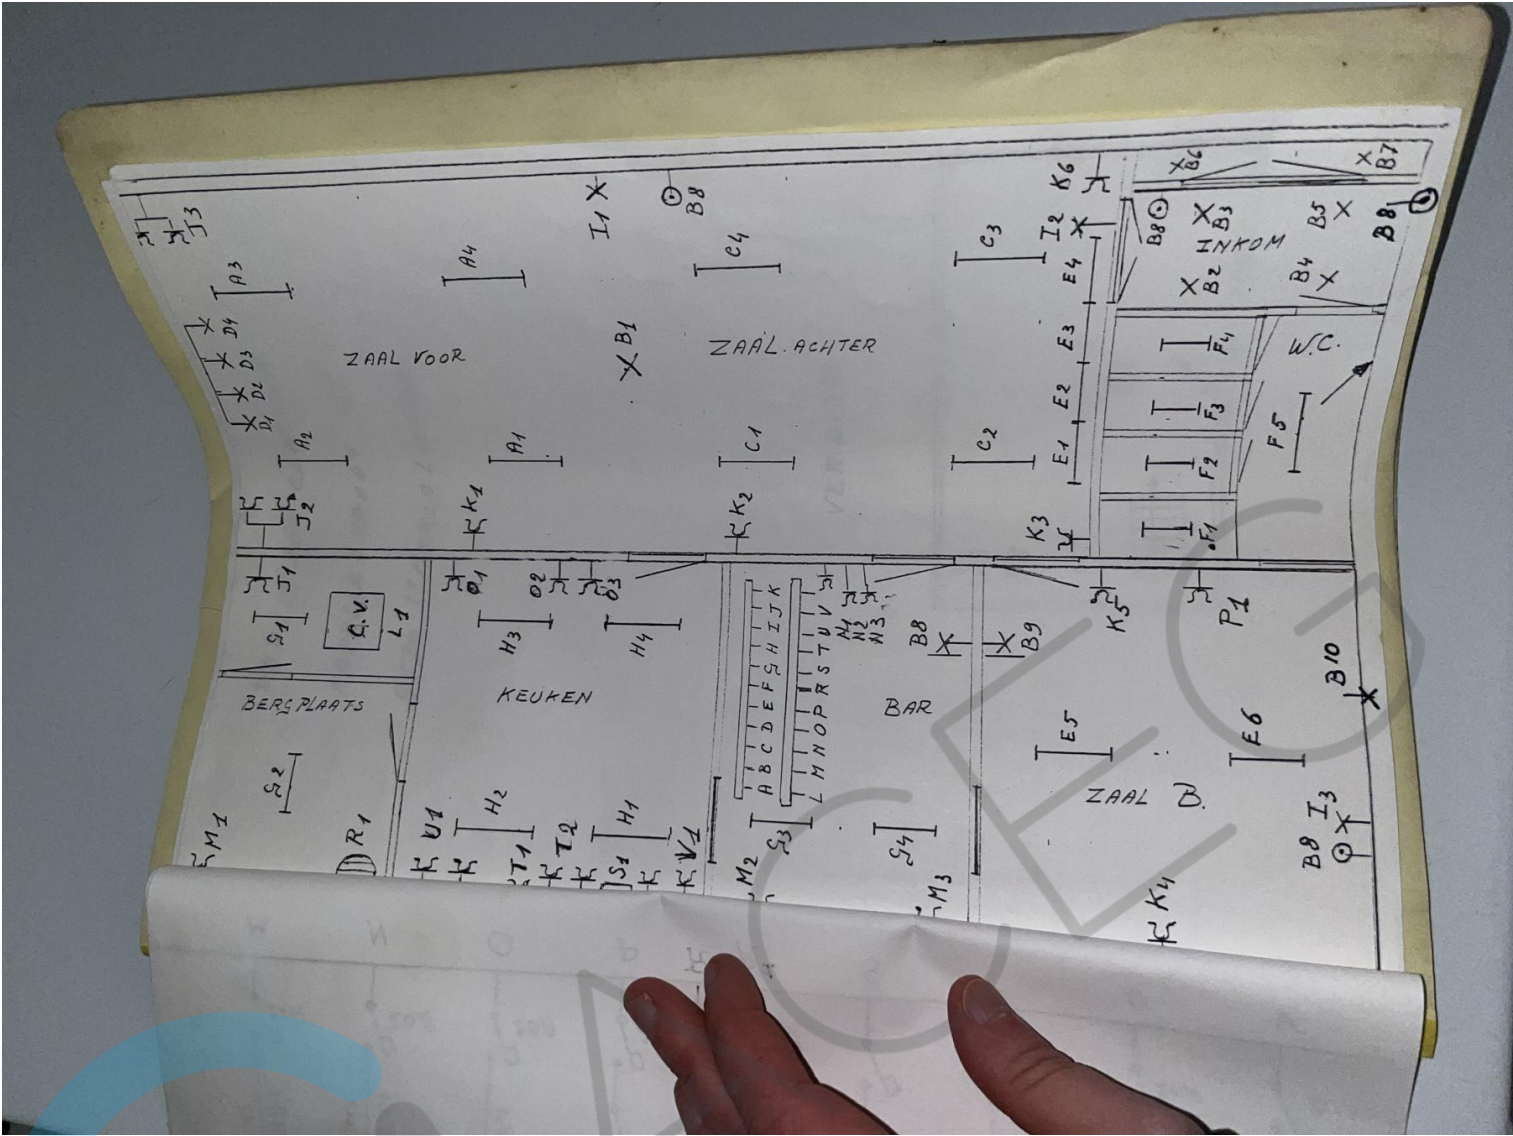

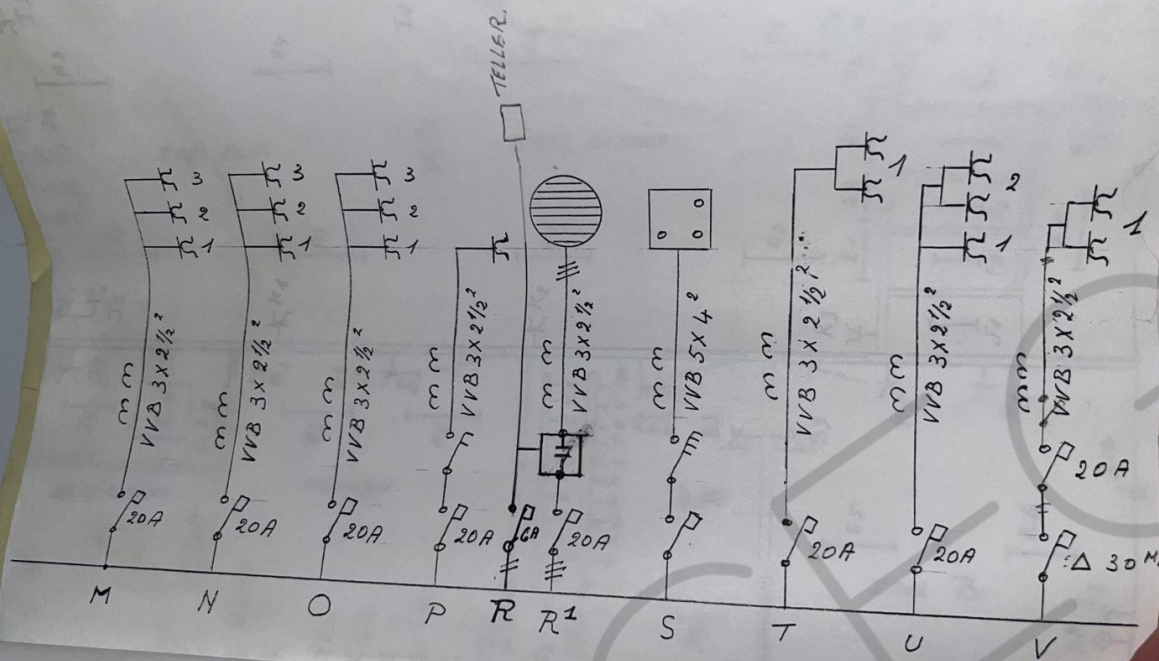

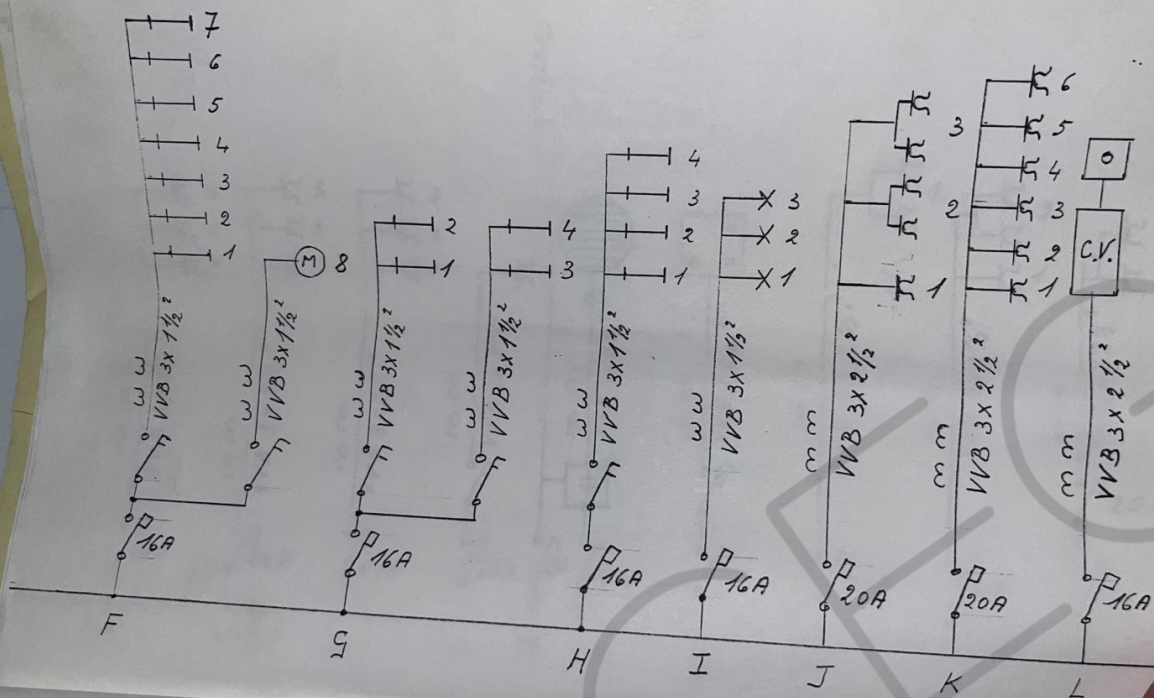

PAROCHIAAL CENTRUM 5^e MARIA LIEDE

