

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 11/12/2023

Inspecteur: Michel Mergan

Mentor:

Installateur: Axent projects

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0834 415 774

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481242

Datum verslag: 12/12/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Buizemontstraat
Huisnummer 24
Busnummer
Postcode 9500
Gemeente Geraardsbergen
Land België

Eigenaar

Naam Hugo Jelke
Straatnaam Diepeweg
Huisnummer 42
Busnummer 1
Postcode 9450
Gemeente Haaltert
Land België

Installateur


Naam Axent projects
BTW nr. BE 0834 415 774
Telefoonnummer +32 475 82 84 00
E-mail info@axentprojects.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820063656754

Teller Nr.: :-

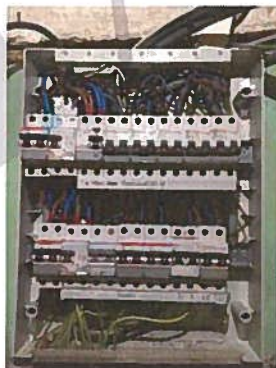

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 8

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 4.07 MΩ

RE: 19.68 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	25		4	4
1	C	16		2	2,5
4	C	20		2	2,5
1	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen OK

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 38 Dèlen van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2. ook van toepassing.

nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 11/12/2048
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 12

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.48

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 11/12/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



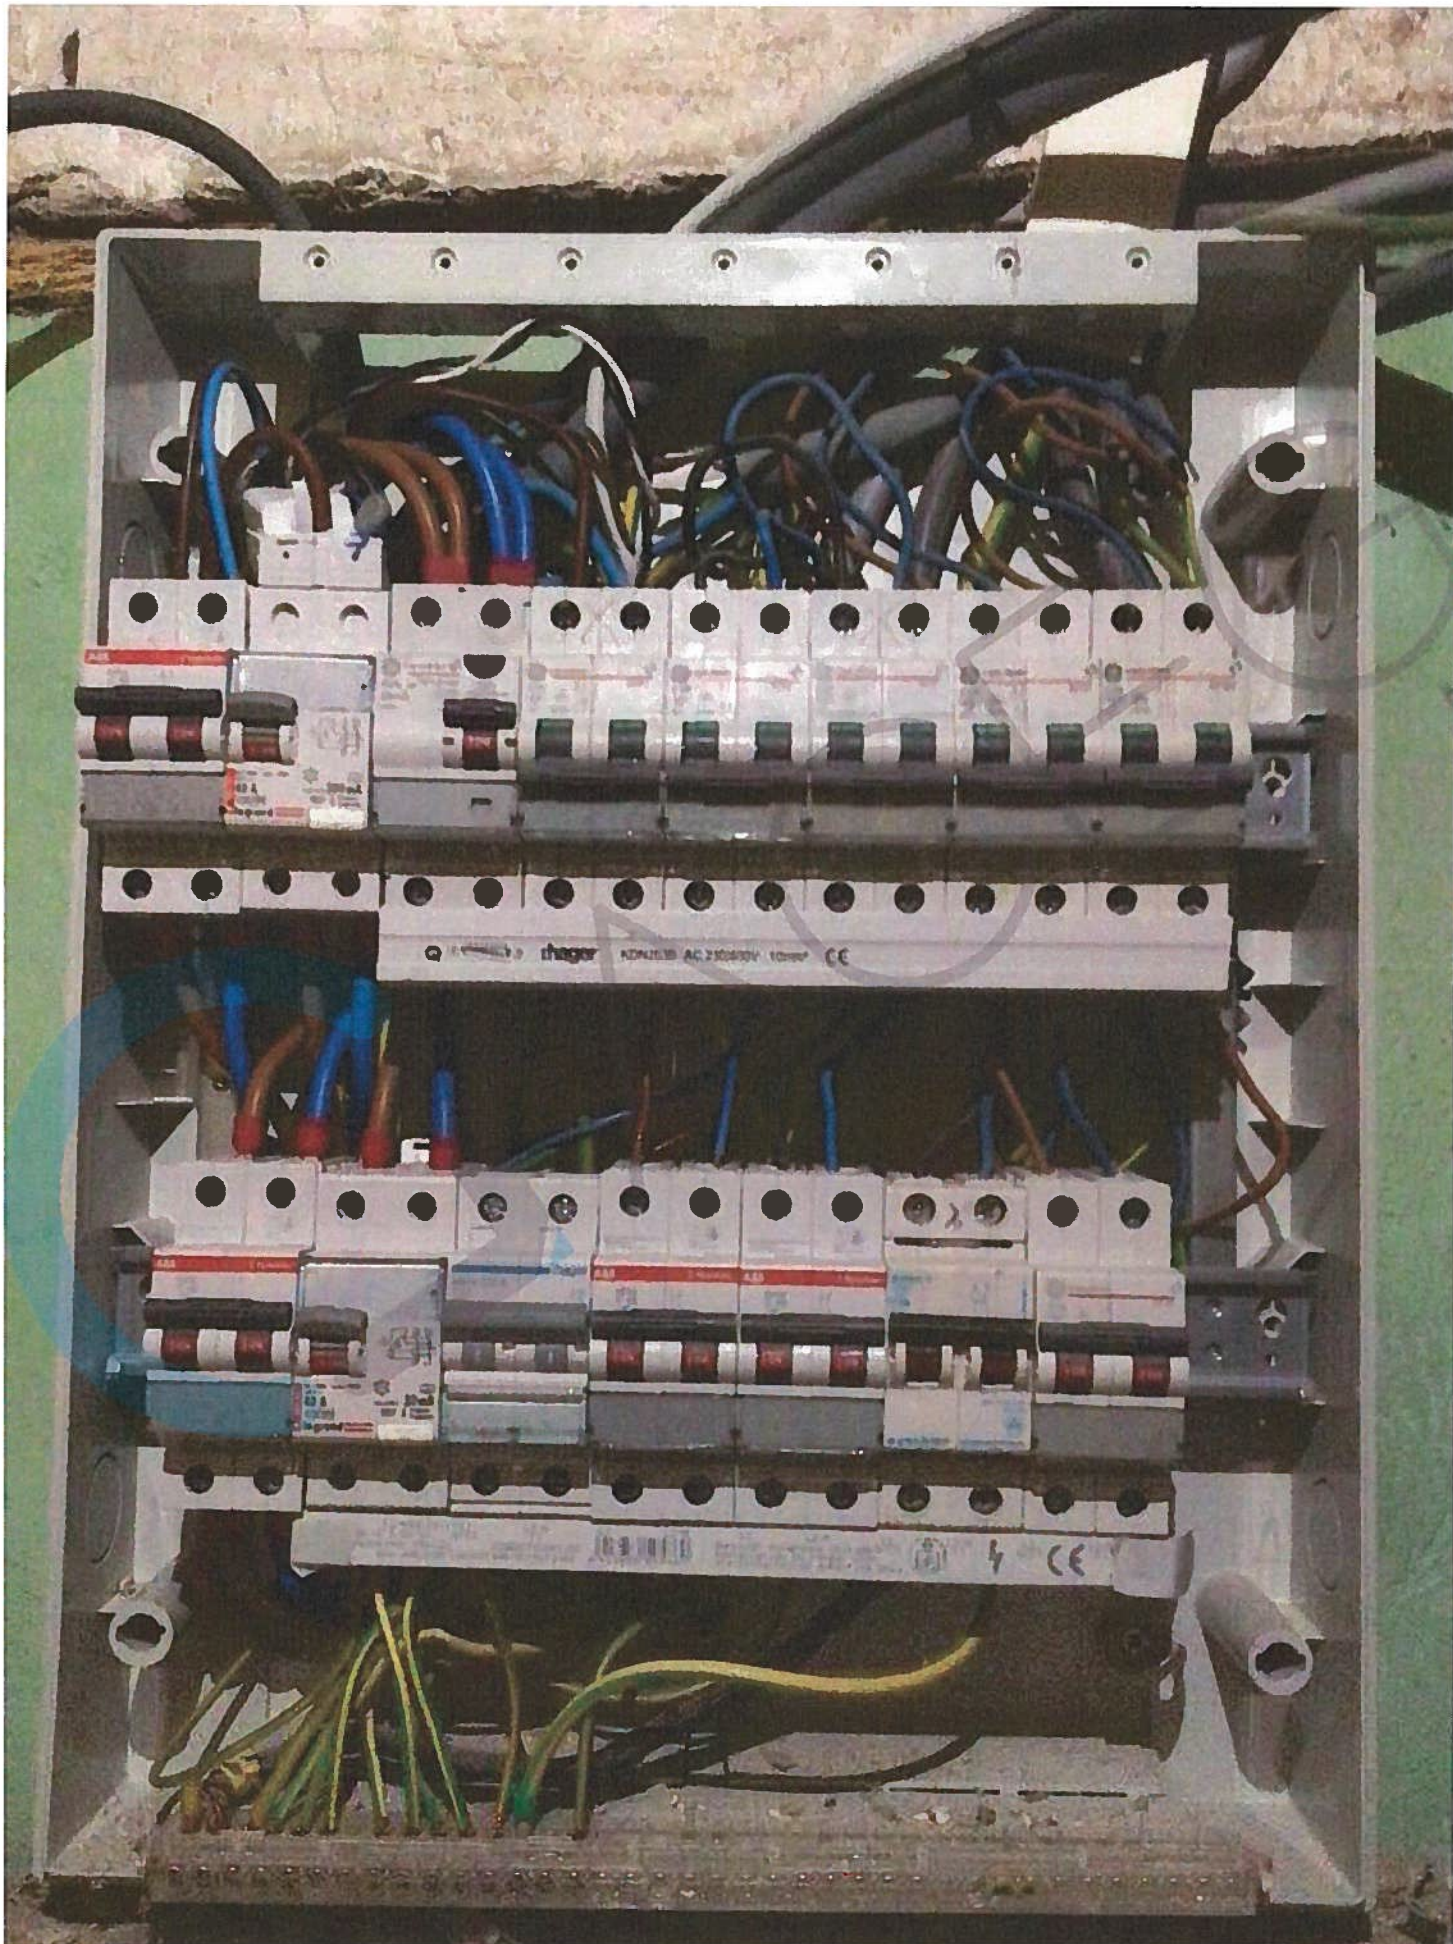

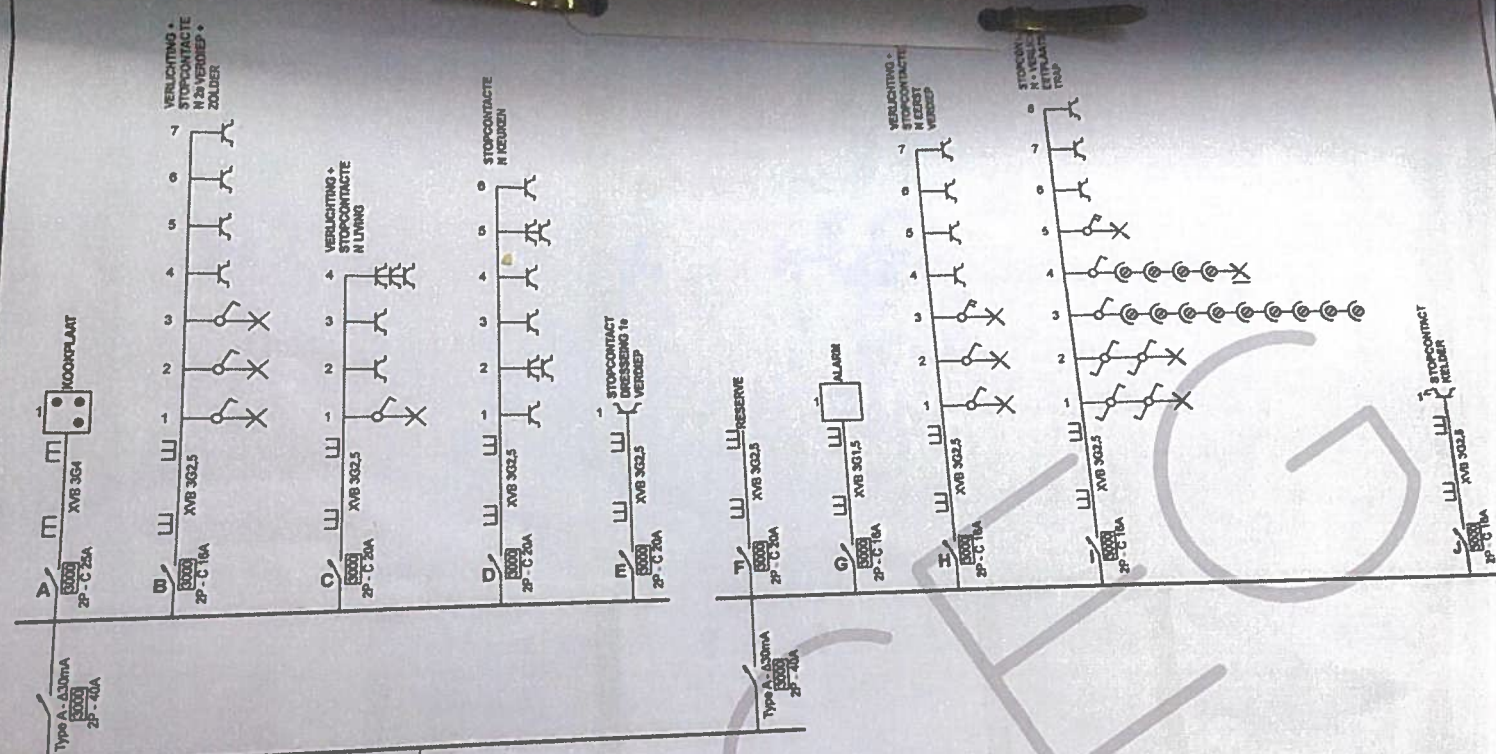


Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Meyan
 ACEG
 11/12/2023

Plaats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820083656754

Installateur
 Axent' Projects comm. v.
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@axentprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

p. 1/7
 Eind
 2 x 2

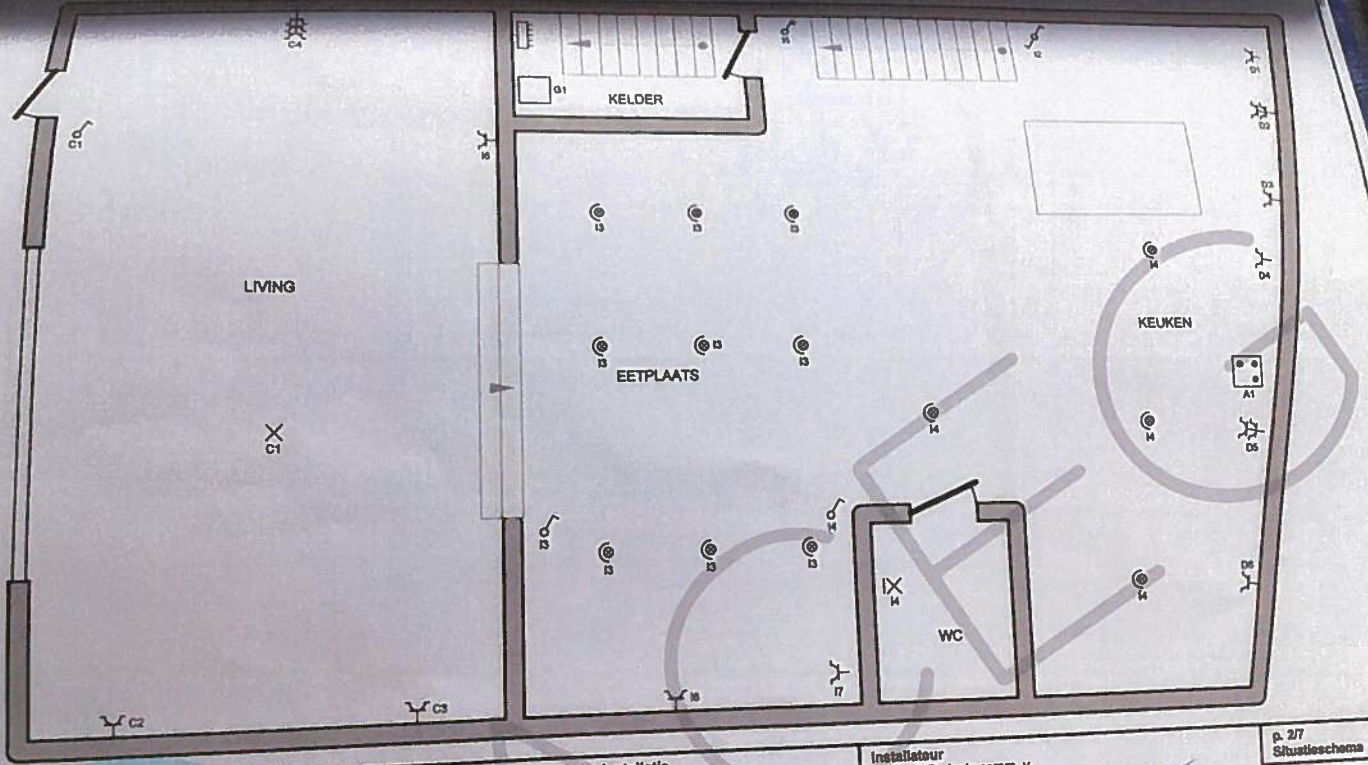


Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

Amerynch
M1/12/2013
ALB

Plaats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820063656754

Installateur
 Axent' Projects comm. v.
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@axentprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

p. 27
 Situatieschema
 2 x 230V - 50Hz

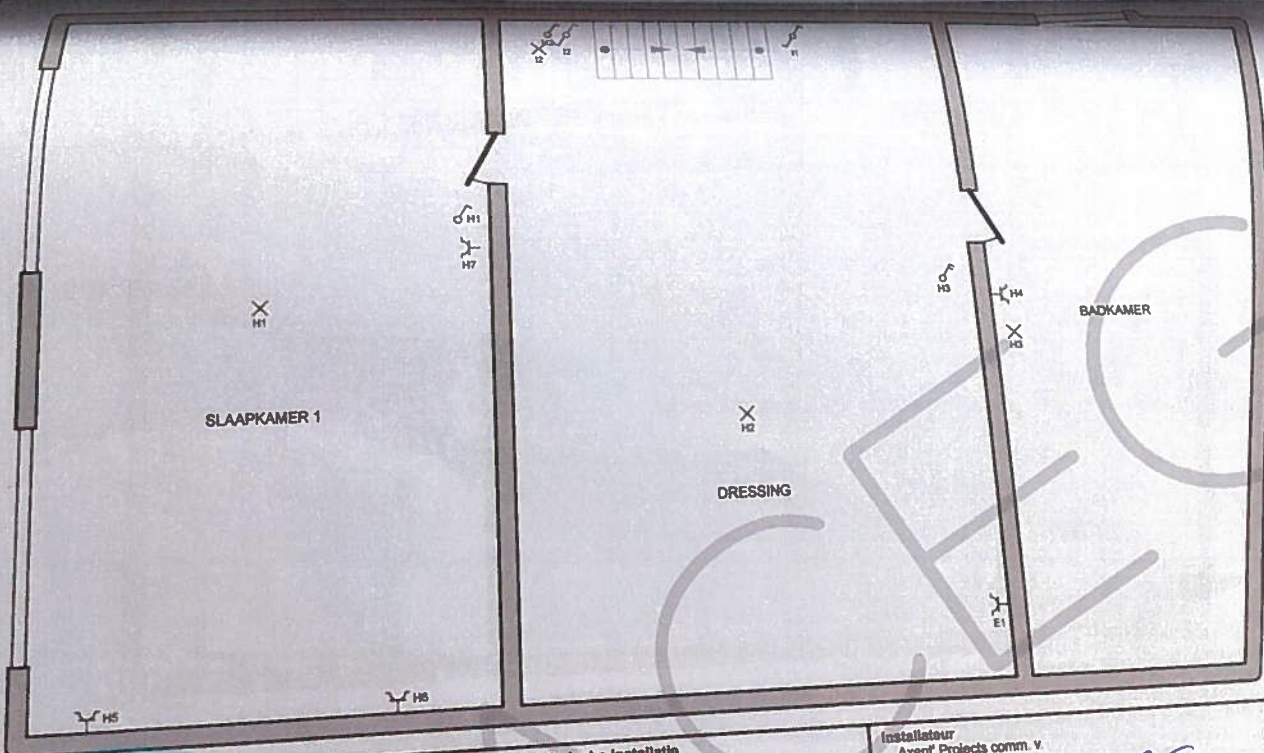

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 80
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481

*ACEG
 Torgersen
 20/1/24 2023
 [Signature]*


Plaats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820063656754

Installateur
 Axent Projects comm. v.
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@axentprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

[Signature]

p. 3/7
 Situatieschema

2 x 230V - 50Hz

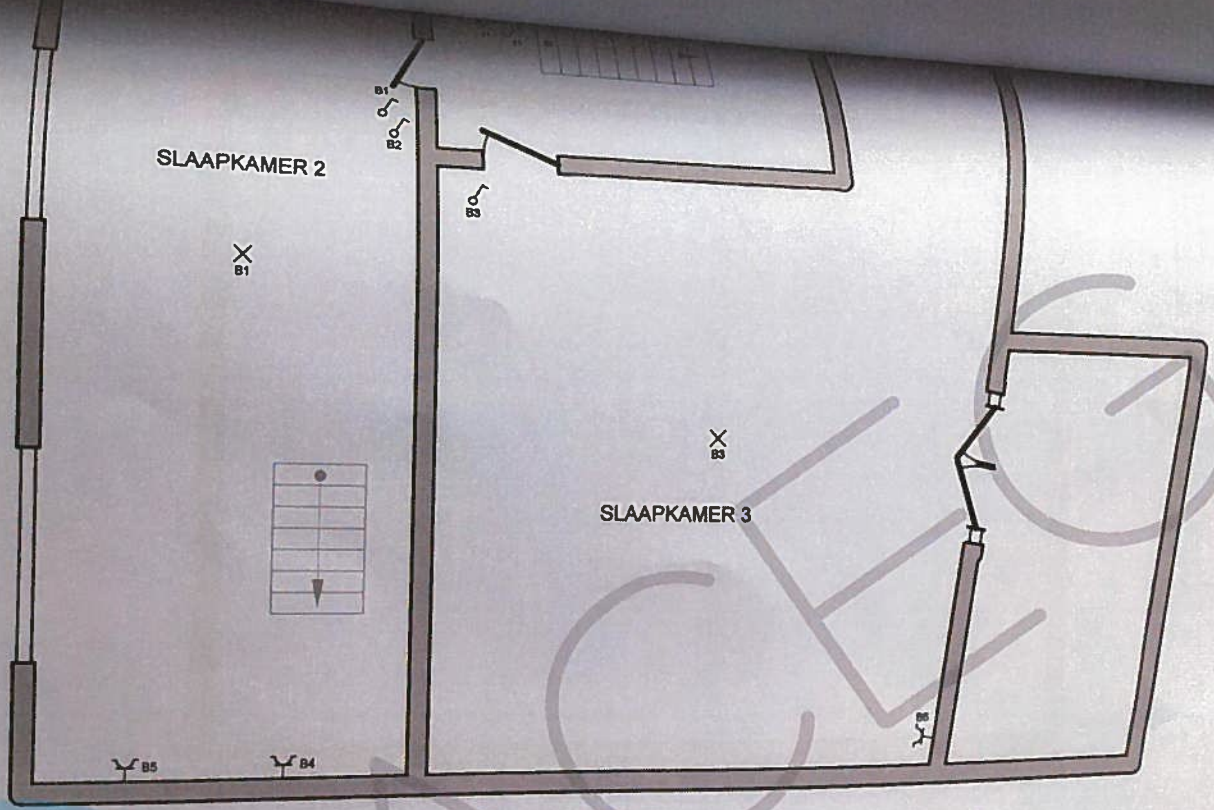

TWEDE VERDIEP

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel.: 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.886.481

Mergu
 11/12/2013


Plaats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820063656754

Installeur
 Avenit' Projects comm. v.
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@avenitprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

[Signature]

p. 4/7
 Situatieschema
 2 x 230V - 50Hz

ZOLDER

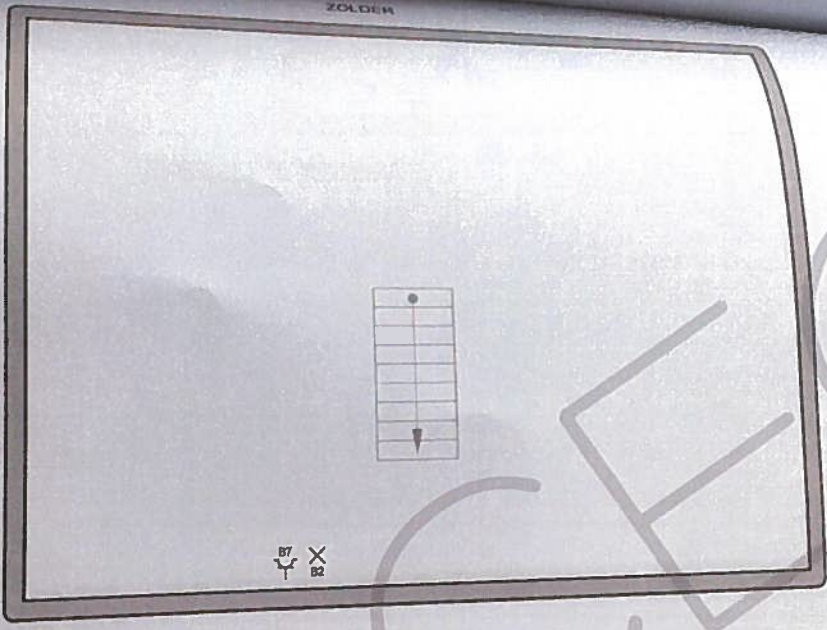

Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel. 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.866.481


Bergeran
 11/12/2023
 POCEG

Plaats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820063656754

Installateur
 Avenit Projects comm. v.
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@avenitprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

p. 57
 Situatieschema
 2 x 230V - 50Hz

KELDER

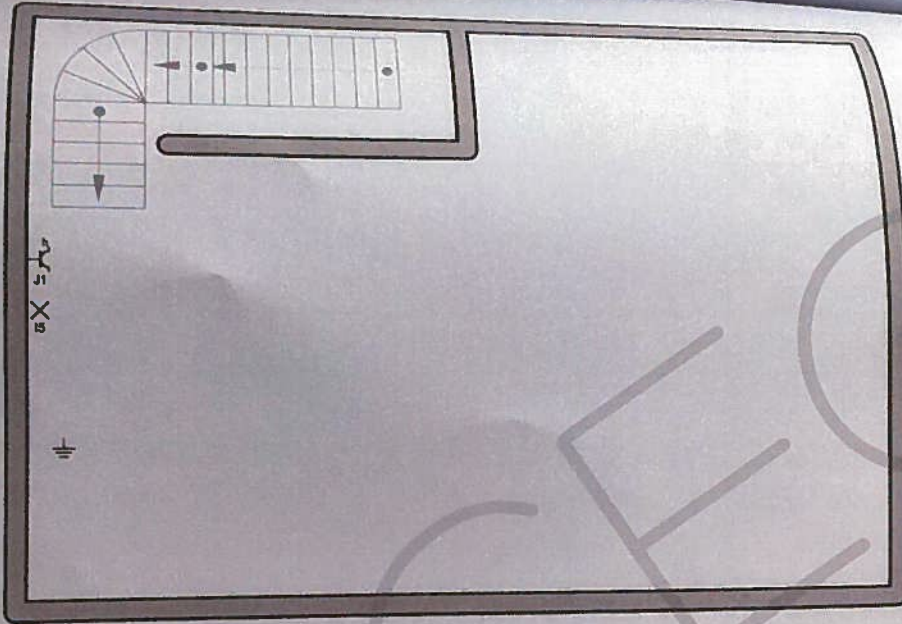

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

Meyna-7
11/11/2022
J. ALLEG

Plaats van de elektrische installatie
HUGO JELKE
BUIZEMONT 24
9500 GERAARDBERGEN
EAN 5414448820063656754

Installateur
Axent' Projects comm. v.
Diepeweg 42
9450 Haaltert
GSM: 0475 82 84 82
e-mail: info@axentprojects.be
BTW BE 0834.415.774

p. 6/7
Situatieschema
2 x 230V - 50Hz

- A
- B VERLICHTING + STOPCONTACTEN 2e VERDIEP + ZOLDER
- C VERLICHTING + STOPCONTACTEN LIVING
- D STOPCONTACTEN KEUKEN
- E STOPCONTACT DRESSEING 1e VERDIEP
- F RESERVE
- G ALARM
- H VERLICHTING + STOPCONTACTEN EERST VERDIEP
- I STOPCONTACTEN + VERLICHTING EETPLAATS + TRAP
- J STOPCONTACT KELDER


Erkend Organisme
 ACEG vzw - Brussel HQ
 Ringlaan 39
 1853 Strombeek-Bever
 Tel. 02 880 88 90
 e-mail: info@aceg.be
 BE 0839.886.481

Pleats van de elektrische installatie
 HUGO JELKE
 BUIZEMONT 24
 9500 GERAARDBERGEN
 EAN 5414448820063656754

Installateur
 Axent Projects comm v
 Diepeweg 42
 9450 Haaltert
 GSM: 0475 82 84 82
 e-mail: info@axentprojects.be
 BTW BE 0834.415.774

p. 777
 Lijst Kringen
 2 x 230V - 50Hz

5 35 34
ingen
aansel
ng
5 0 65
5 35 00
7 70 80
35 35
en.be
00 01

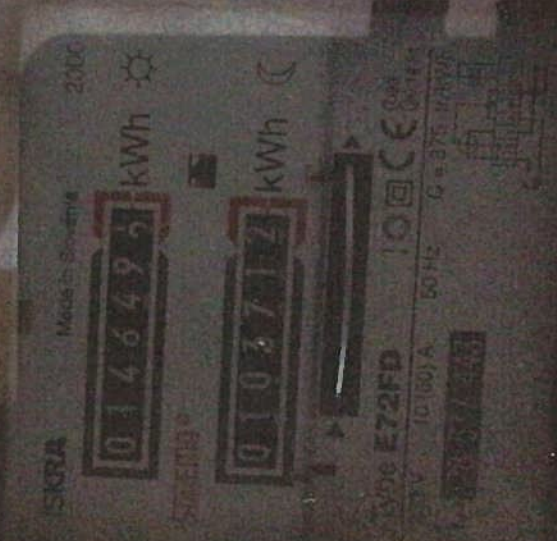



Eurotest 61557



METREL

19.68g

F1

F2

F3

F4

