



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

1. De controle werd uitgevoerd door:

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw
Externe Dienst voor Technische Controles
Agent-bezoeker: Alain De Brabanter

Engelse Wandeling 2F8L
8500 Kortrijk
Tel: 056/357676

Email: info@vanhemelen.org
BTW: BE 0422.507.353

2. Identificatie van derden:

Opdrachtgever: HABILS Dennis
Groenstraat 3
1670 Pepingen
E-mail: dennishabils@gmail.com
Tel: 0497/201.806
BTW-nr: BE0649669673

Eigenaar: Kestens Sven
Botermelkstraat 60
9500 ONKERZELE (Geraardsbergen)

Installateur: HABILS Dennis
Groenstraat 3
1670 Pepingen
BE0649669673

3. Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats: Kestens Sven
Botermelkstraat 60, 9500 ONKERZELE (Geraardsbergen)

Type installatie: wooneenheid

Extra gegevens:

EAN code: 541448860017468187

Nr. teller:

Nr. nachtteller:

Private HS-cabine: Nee

4. Gegevens van de controle:

Type controle: Gelijkvormigheidscontrole na de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)

Datum uitvoering van de installatie: na 31/05/2020

Opmerkingen: Ander wettelijk kader: NVT
Afwijkingen:

5. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3N400Vac

Type van de aardelektrode: Aardingspen

Aardverbindingssysteem: TT

Voedingsleiding type: XVB

Voedingsleiding diameter (mm²): 10

Aantal borden: 2


Aantal eindstroombanen: 17 + 7

Nominale waarde bescherming(A): 40

Type van de alg. schakelaar: ALG DIFF

Algemene differentieelstroominrichting: 4P DIFF 40A 300mA

Bijkomende differentieelstroominrichting: 4P DIFF 40A 30mA



Schema's en plannen van de installatie

Eendraadschema's:	OK	Document van de veiligheidsinstallaties:	NVT
Situatieplan(nen):	OK	Document van de kritische installaties:	NVT
Summiere schets:	NVT	Document van de evacuatiewegen:	NVT
Document met uitwendige invloeden:	NVT		

Gedecentraliseerde productie-installaties: Nee

Beschrijving van de stroombanen:

Bord 1

- 2 x 2P AUT 16A 1,5mm²
- 7 x 2P AUT 20A 2,5mm² waarvan 1 reserve
- 2 x 4P AUT 25A 6mm²
- via diff 30mA
- 1 x 2P AUT 16A 1,5mm²
- 1 x 2P AUT 16A 2,5mm²
- 5 x 2P AUT 20A 2,5mm² waarvan 1 reserve

Bord 2

- via diff 30mA
- 2 x 2P AUT 16A 1,5mm² waarvan 1 reserve
- 5 x 2P AUT 20A 2,5mm²

6. Resultaten van de controle:

6.1 Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	19,00 Ω	Continuïteit van de beschermingsgeleiders(PE geleider):	OK
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	1,00 MΩ	Continuïteit van de beschermingsgeleider(hoofd eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (testknop):	OK	Continuïteit van de beschermingsgeleider(bijkomende eq):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus):	OK	Test autom. uitschakeling gedec. productie-installatie(s):	NVT

6.2 Inbreuken

Geen inbreuken

6.3 Bemerkingen

- De verlichtingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
opm: Deels nog in uitvoering

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

6.3 Bemerkingen

- De plannen zijn manueel aangepast.
opm:

7. Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 24/08/2046. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of) waren verzegeld.

Agent-bezoeker: Alain De Brabanter

8. Reglementaire voorschriften:

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek (6.5.), het controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.):

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.):

De verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;

De koper is ertoe gehouden:


- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

9. Bijlagen




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

ADB20210824-HH3

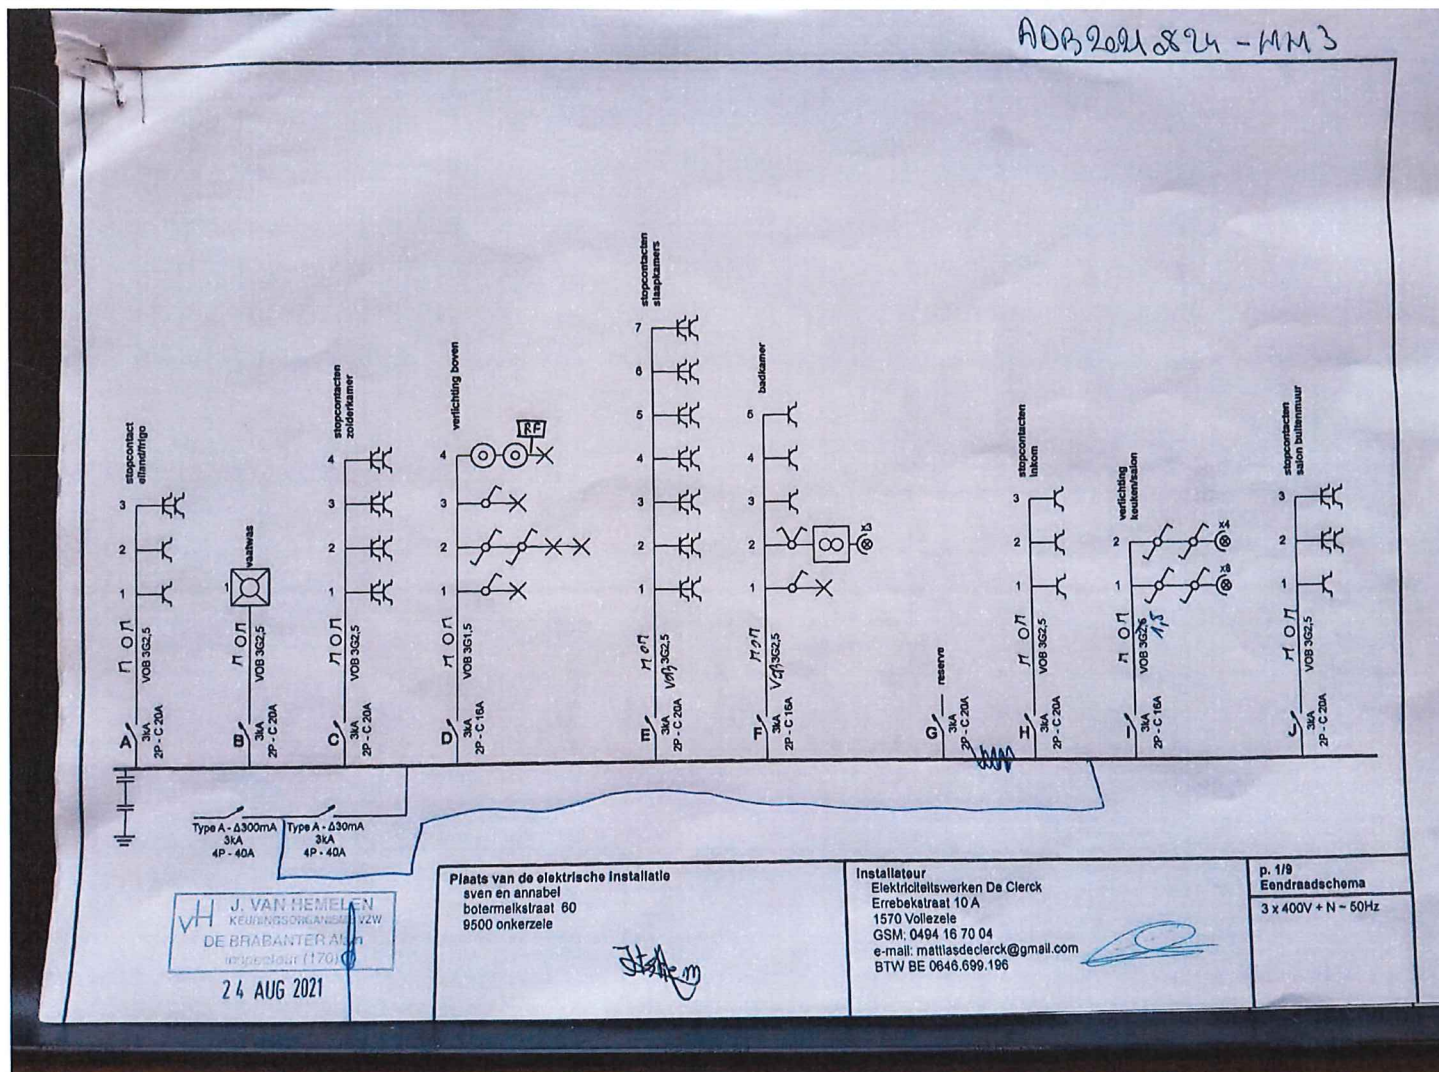




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

		
24 AUG 2021 J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW DE BRABANTER inspecteur (174)		
Plaats van de elektrische installatie sven en annabel botermeekstraat 60 9500 onkerzele	Installateur Elektrifiteitswerken De Clerck Errebekstraat 10 A 1570 Vollezele GSM: 0494 16 70 04 e-mail: mallasdeclerck@gmail.com BTW BE 0646 699 196	p. 3/9 Eendraadschema 3 x 400V + N - 50Hz



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

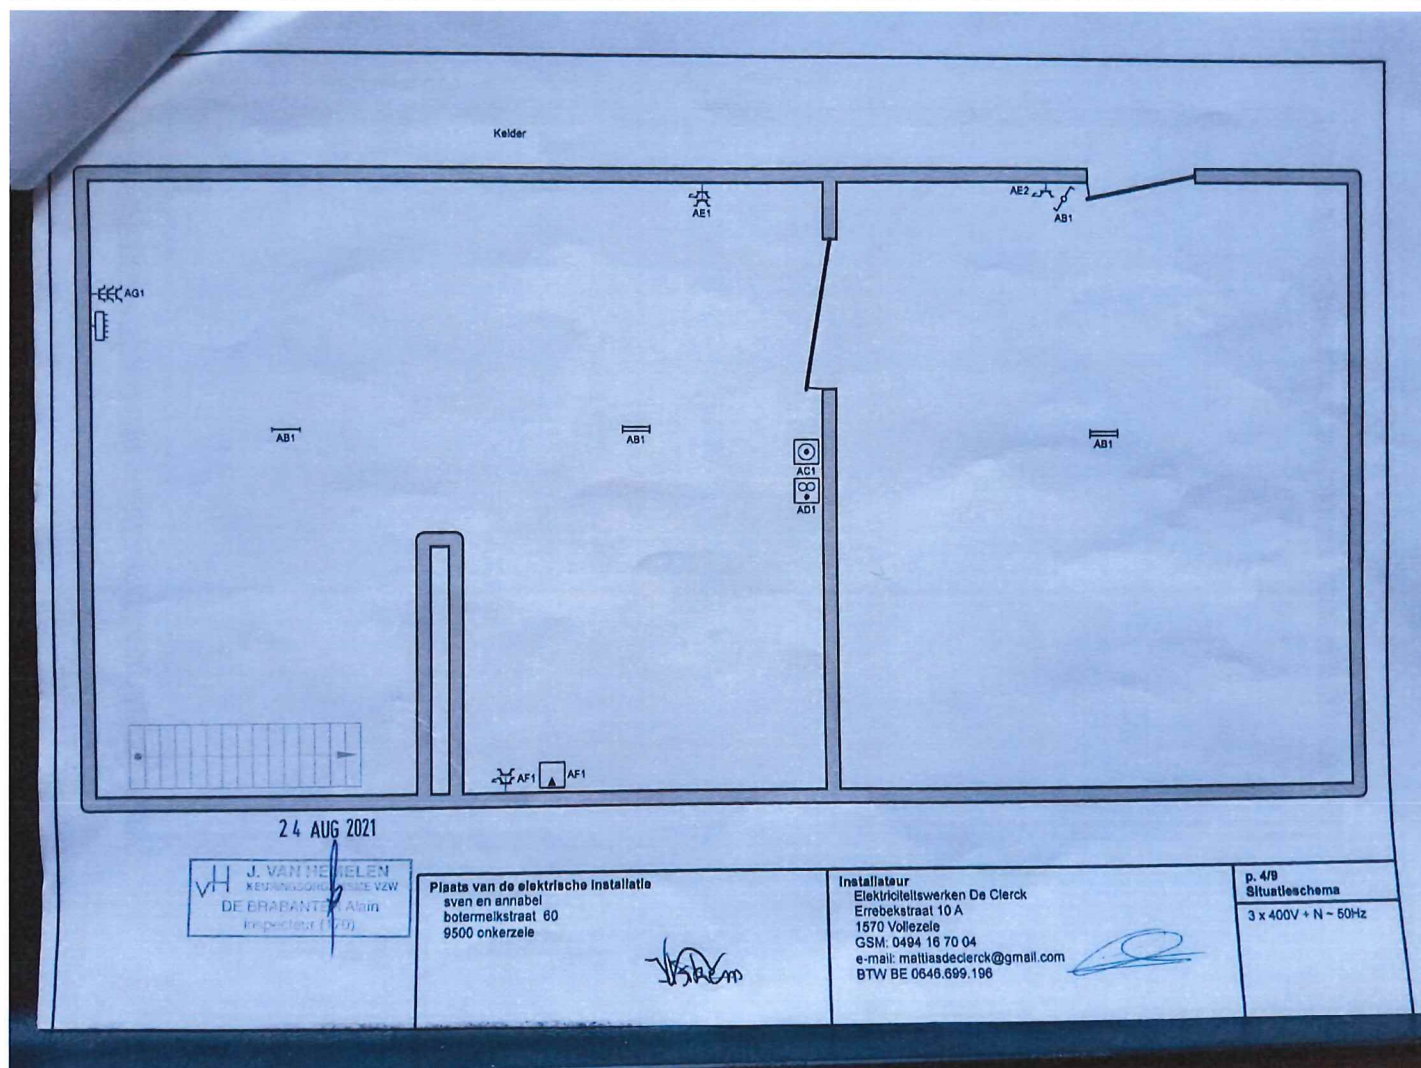




J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW
ORGANISME DE CONTROLE ASBL




Datum controle: 24/08/2021
Aanvraagnr: 392900
Ref. RAP: ADB20210824-HH3
Besluit: De installatie voldoet

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

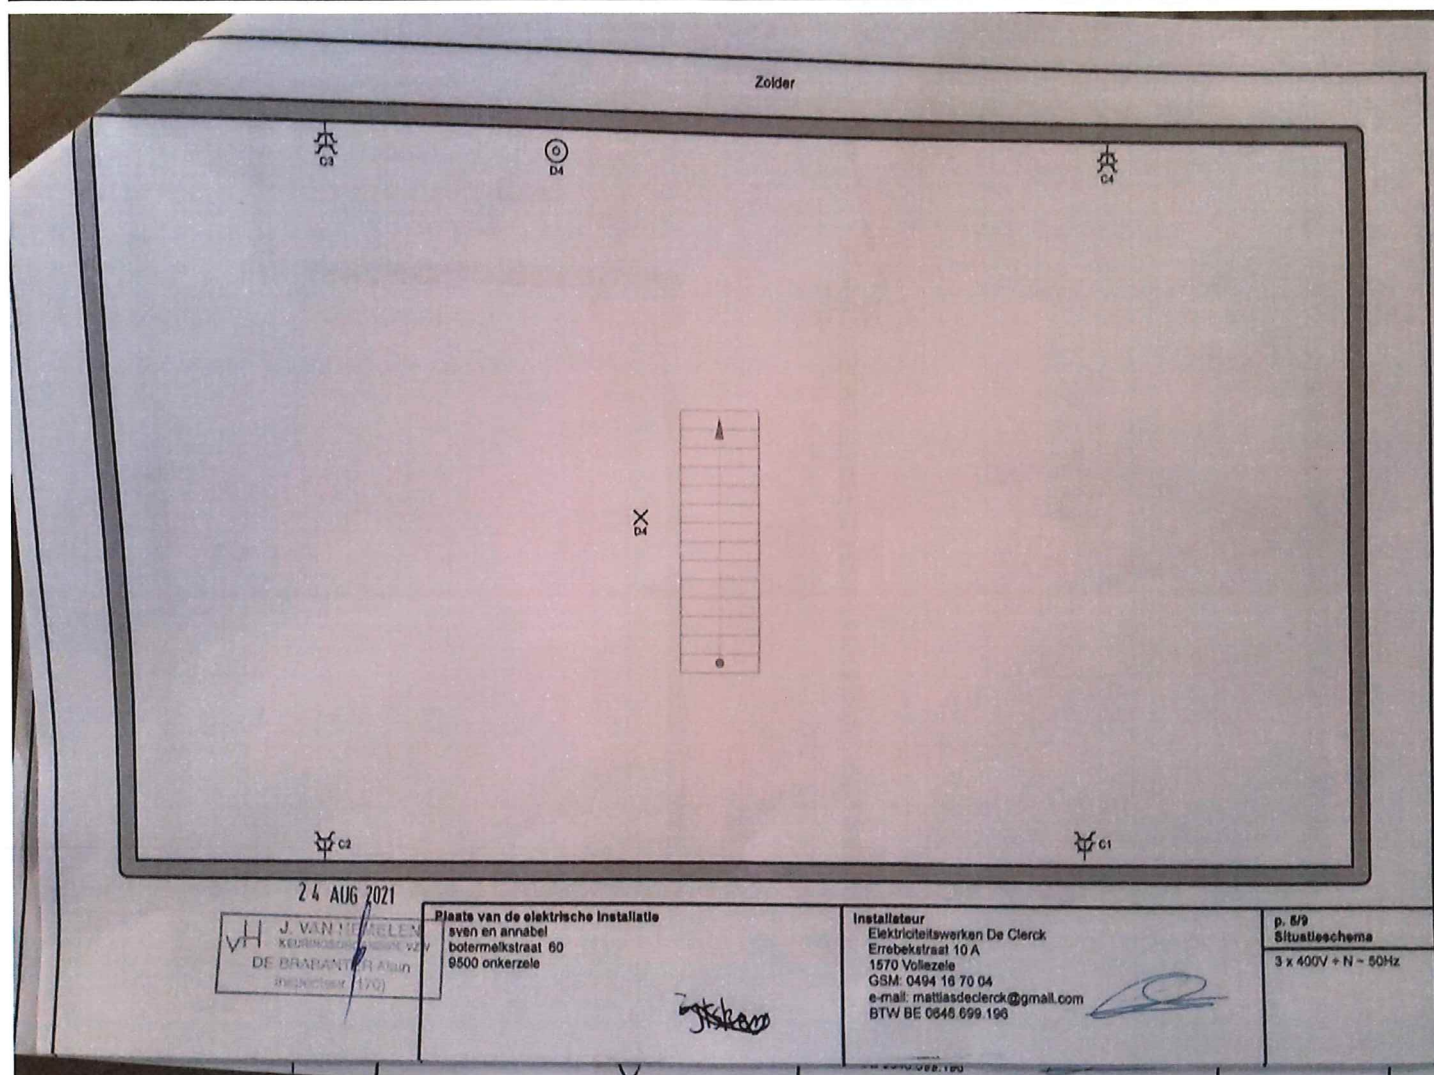



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

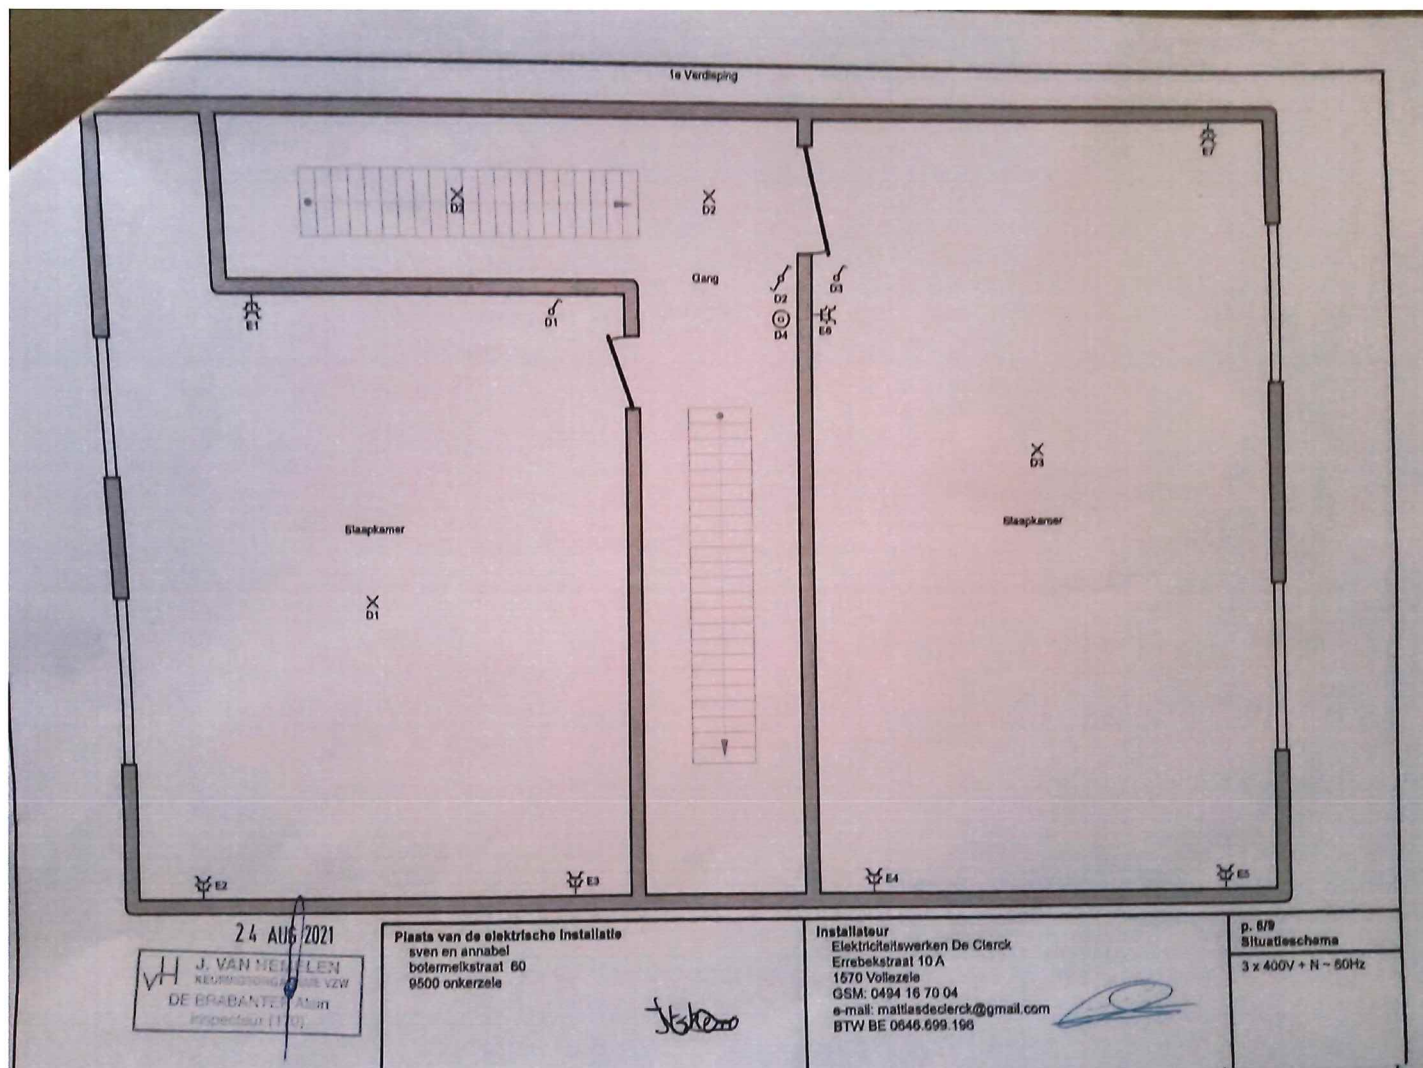



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

