



VINÇOTTE asbl

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA: BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rapport n° :



F 63453

Rési code :

- ☐ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 gent@vincotte.be
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 brussels@vincotte.be
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 antwerpen@vincotte.be
☒ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 gembloux@vincotte.be

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Nom, Prénom : SPAL G.D. ELEC
Nom, Prénom : idem
Adresse : 5000 NAMUR
N° carte d'identité :
CP + Commune :
N°TVA : BE 0506 787 683
Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☐ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Unité de travail domestique
☐ Art 271	☐ périodique	☐ contrôle		☐ Art 88	☐ Art	☒ Parties communes
☐ Art 276 : renforcement		☒ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		☐ Art	☐ Art	☒ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN		☒ EAN non communiqué	☐ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n°	8126060	Index jour	59678,1
Données installation	Protection branchement (A) :	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☒ 50 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	n° :	Index nuit :
	Conçue pour U _N :	☐ 230 V ☒ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type de prise de terre :	
	Courant nominal maximum (A) :	☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☒ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ boucle de terre ☐ barres / piquets	
Description installation	Câble d'alimentation tableau principal :	4 X 16 mm ² - Type : V03S.F		
	Dispositif diff. gén. :	63 A / 300 mA	Nombre de tableaux :	Nombre de circuits terminaux
	☒ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☒ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : 2 Ω		☒ Isolement général : 10 MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☒ Néant	
Infractions Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant	

Conclusion(s) :

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

- ☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.


Agent visiteur :

Pour le Directeur Général : Signature

Nom : MAHEMAL en Agent n° 0707 Date 27.09.2016

Annexe(s) : ☒ Schéma(s) de position : 3 ☒ Schéma(s) unifilaire(s) : 2

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.
- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

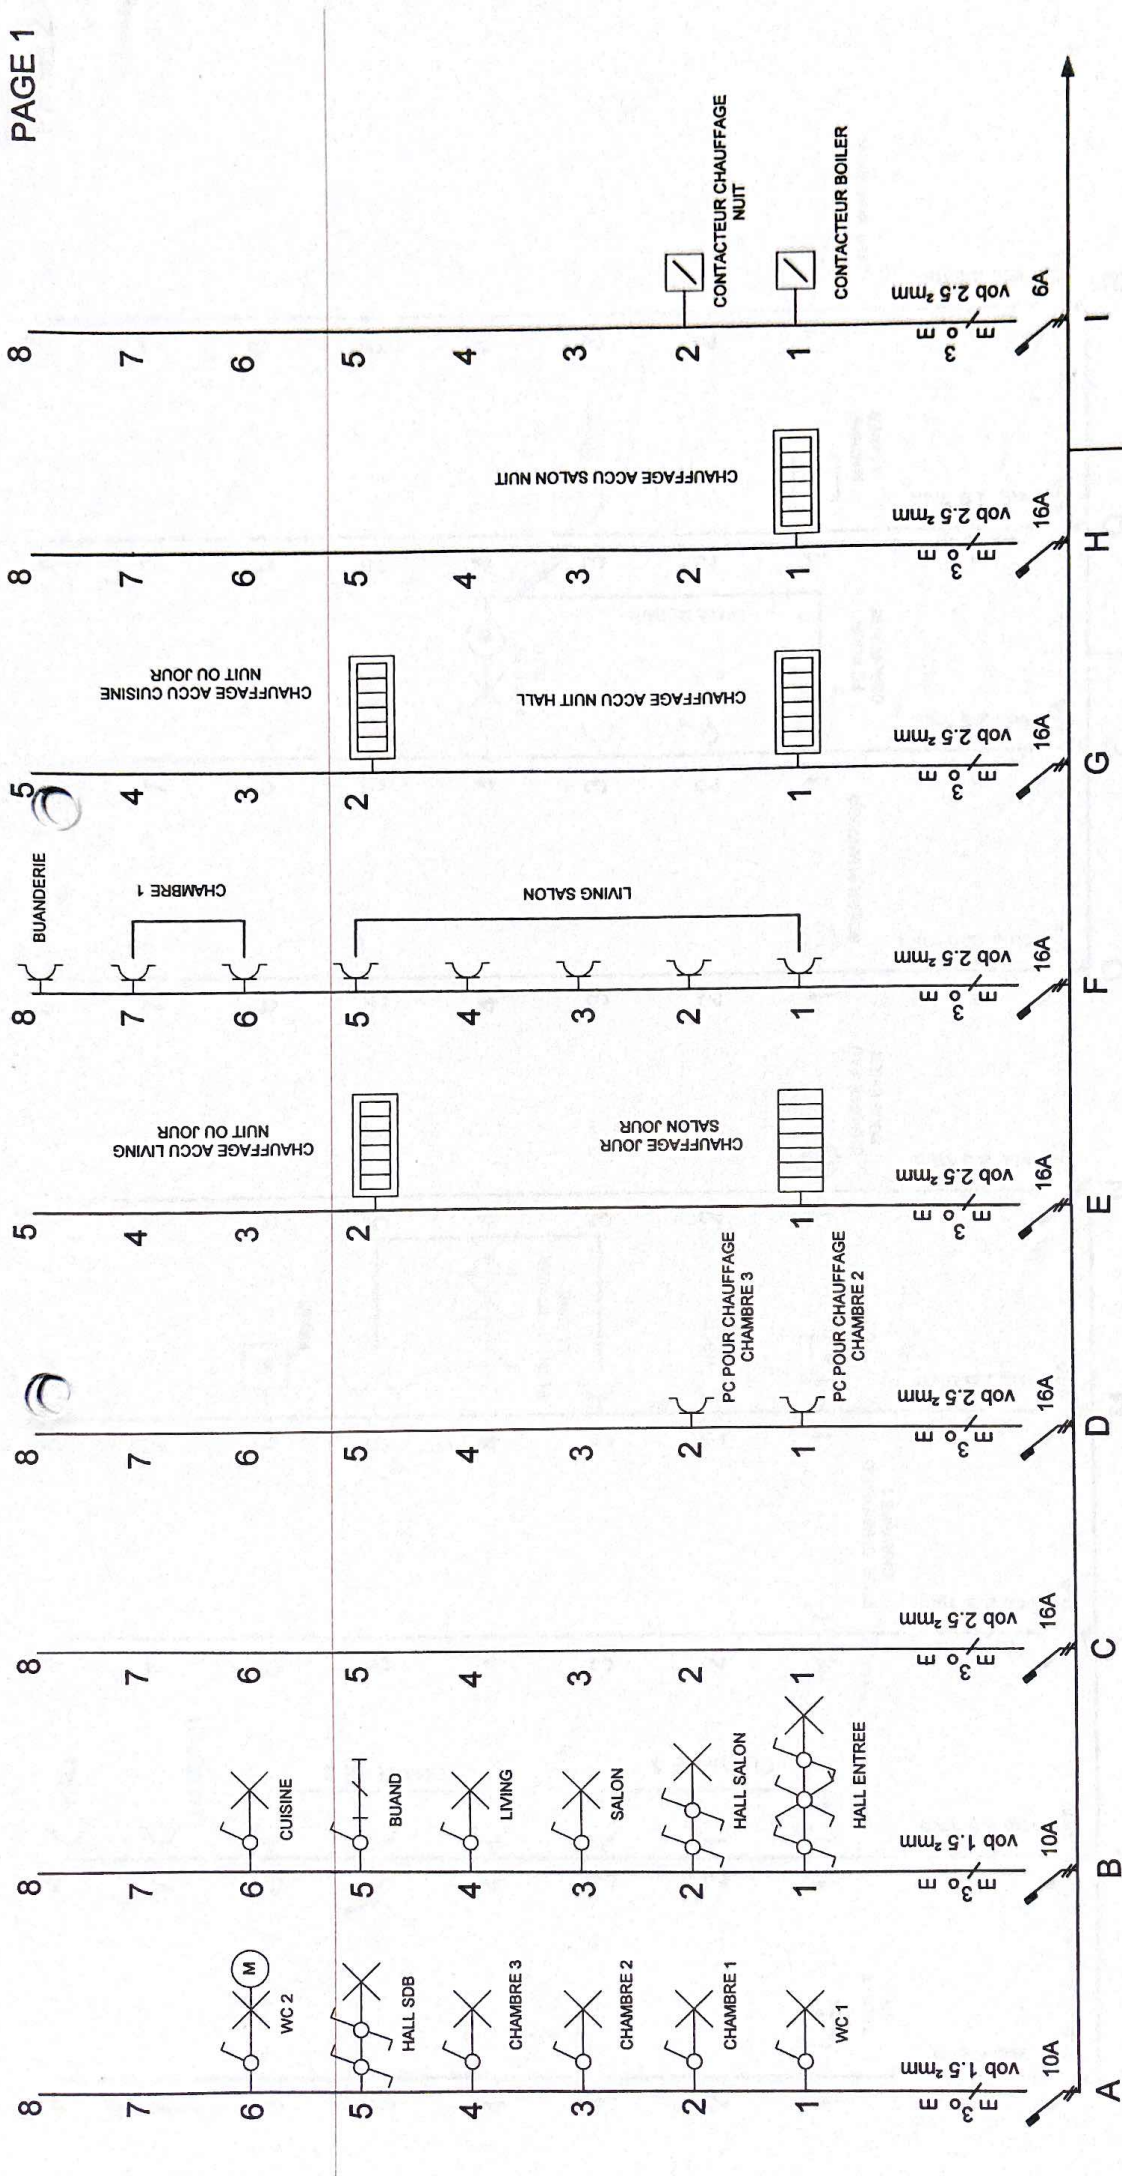

LE RESPONSABLE DE
L'EXECUTION DU TRAVAIL

(signature)


GDELEC SPRL
15 RUE ST ROCH
5070 FOSSES LA VILLE
TVA BE 0508 787 683

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGRE,


(signature)

(date) 27/09/2016

Tension de service 3x220 v



VINCOTTE asbl
Christian Marchal
VINCOTTE 0707

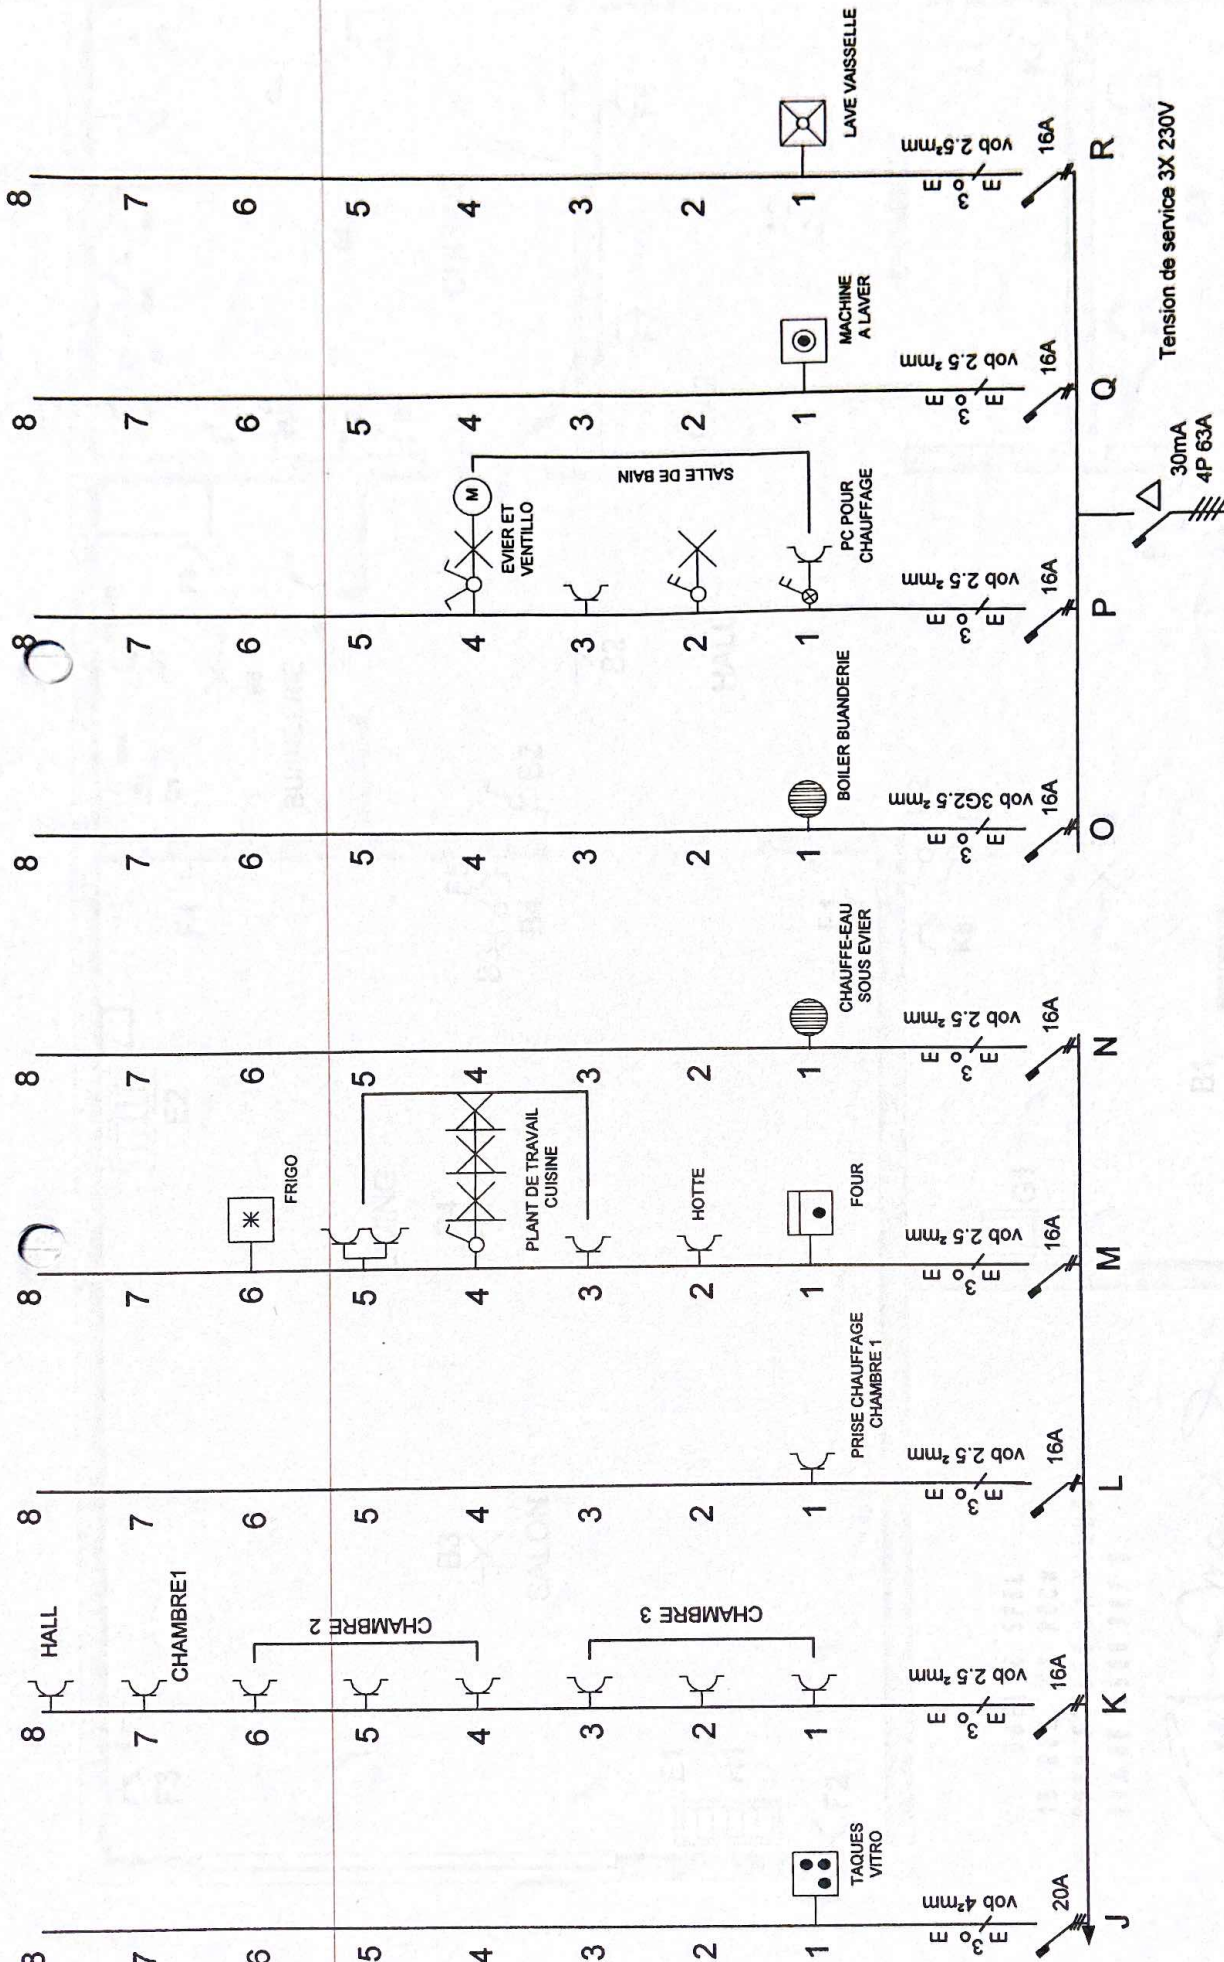

LE DELEGUE DE
L'ORGANISME AGREE,

(signature)

(date) 27/09/2016

LE RESPONSABLE DE
L'EXECUTION DU TRAVAIL

(signature)

6DELEC SPRL

15 RUE ST ROCH
5070 FOSSES LA VILLE
TVA BE 0506 787 683

TERRASSE

CUISINE

CHAMBRE 1

CHAMBRE 2

HALL

BUANDERIE

LIVING

SALON


ENTREE


GDELEC SPRL
15 RUE ST ROCH
5070 FOSSES LA VILLE
TVA BE 0506 787 6

VINÇOTTE asbl
Christian Marchal
0707



Christian Marchal

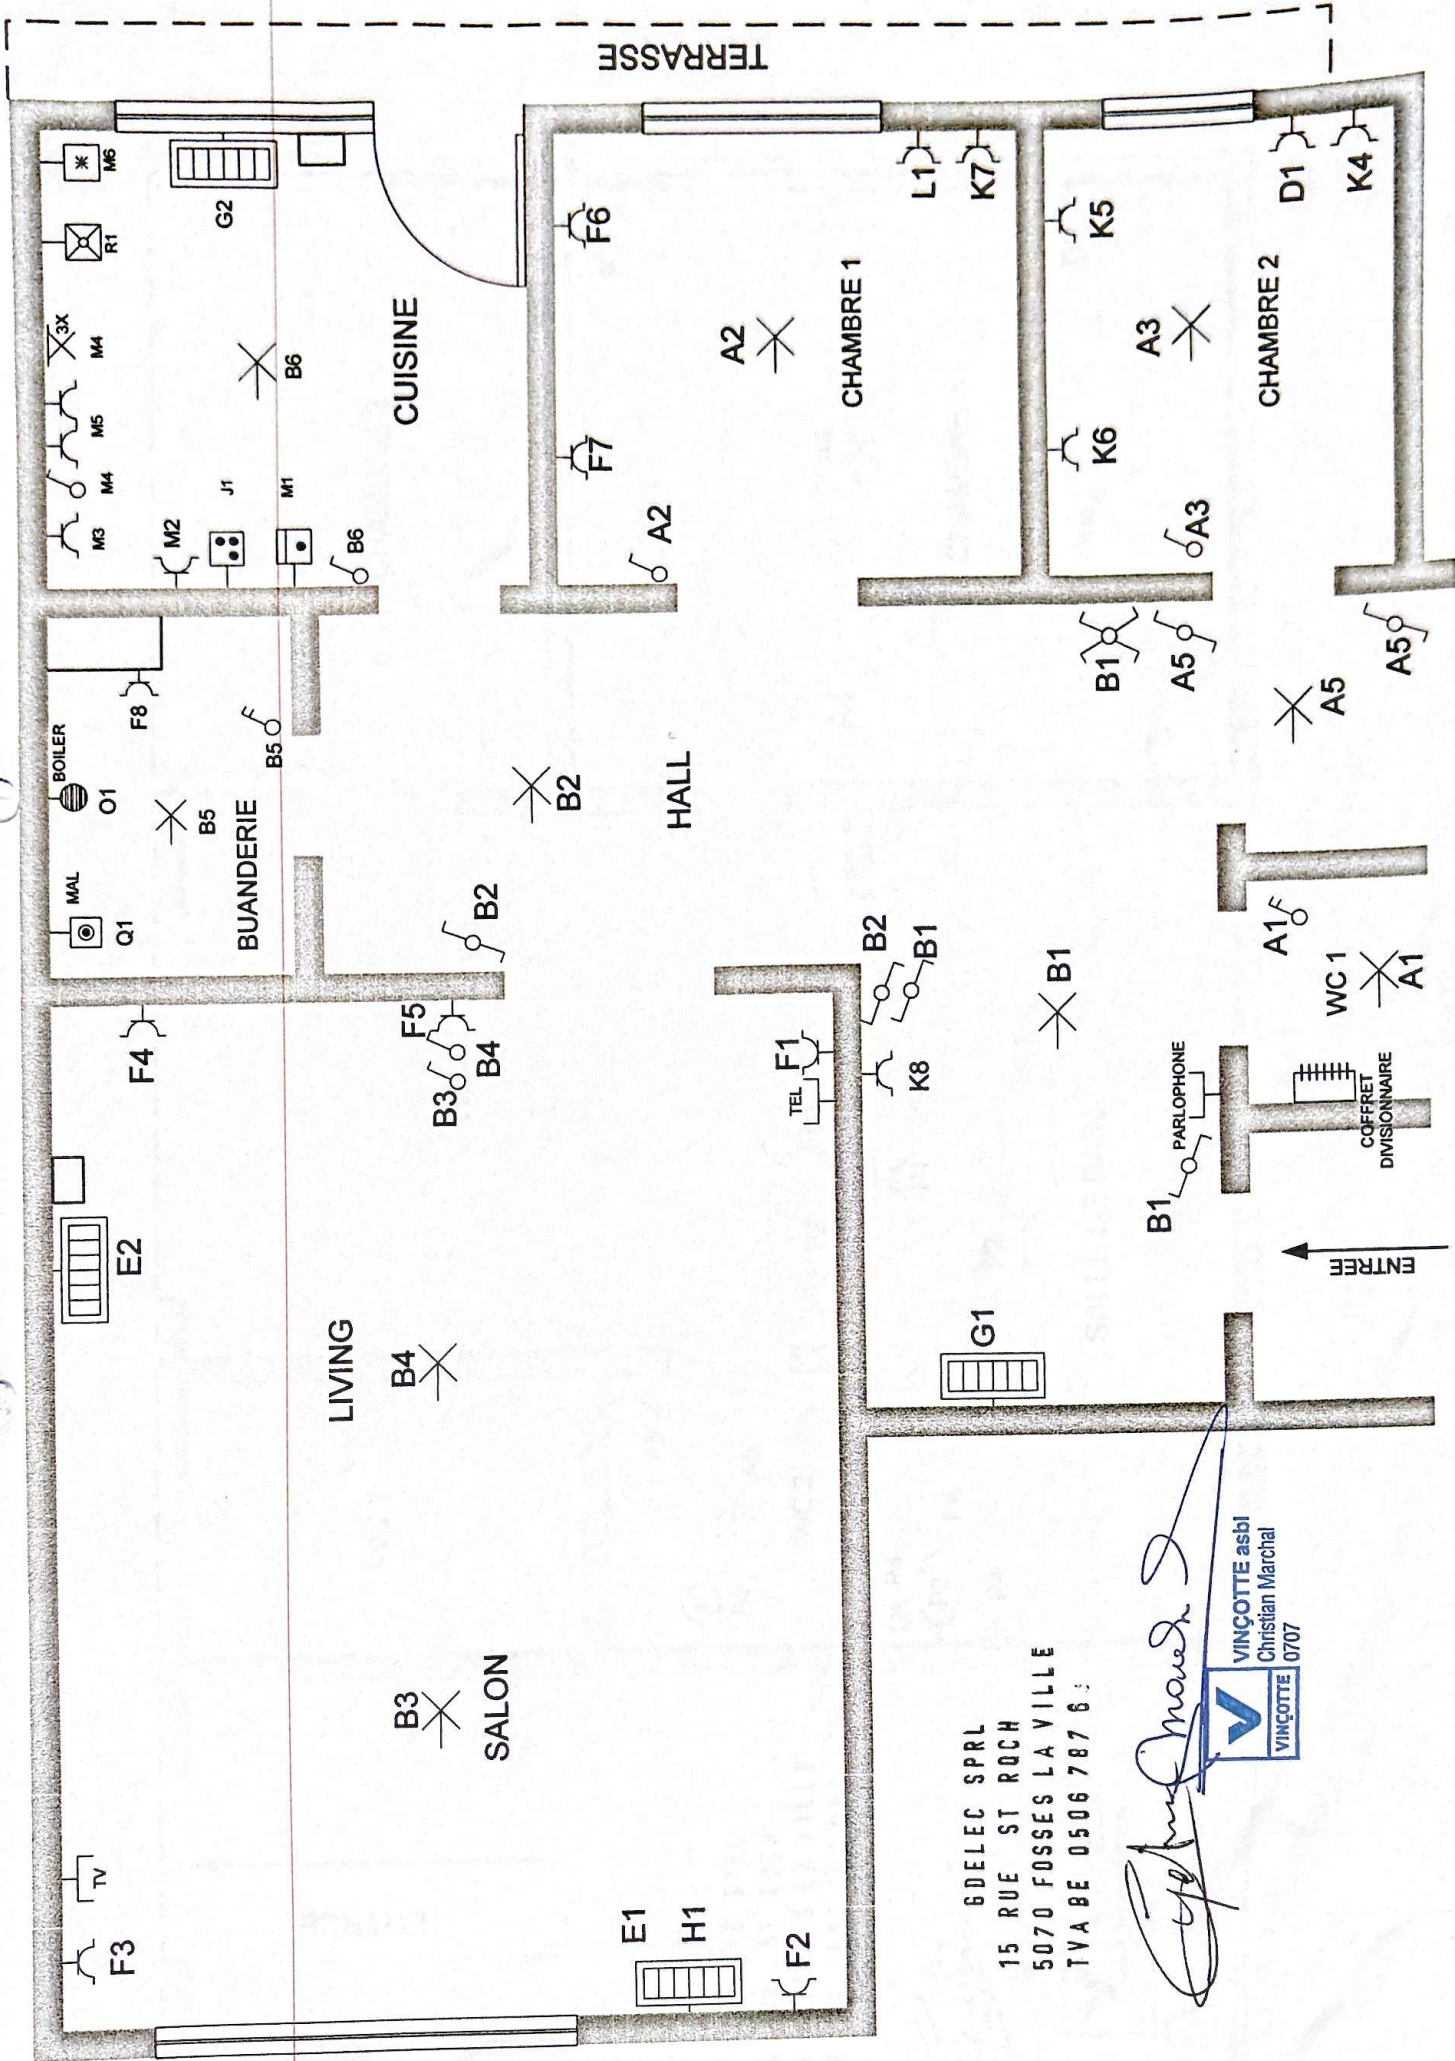

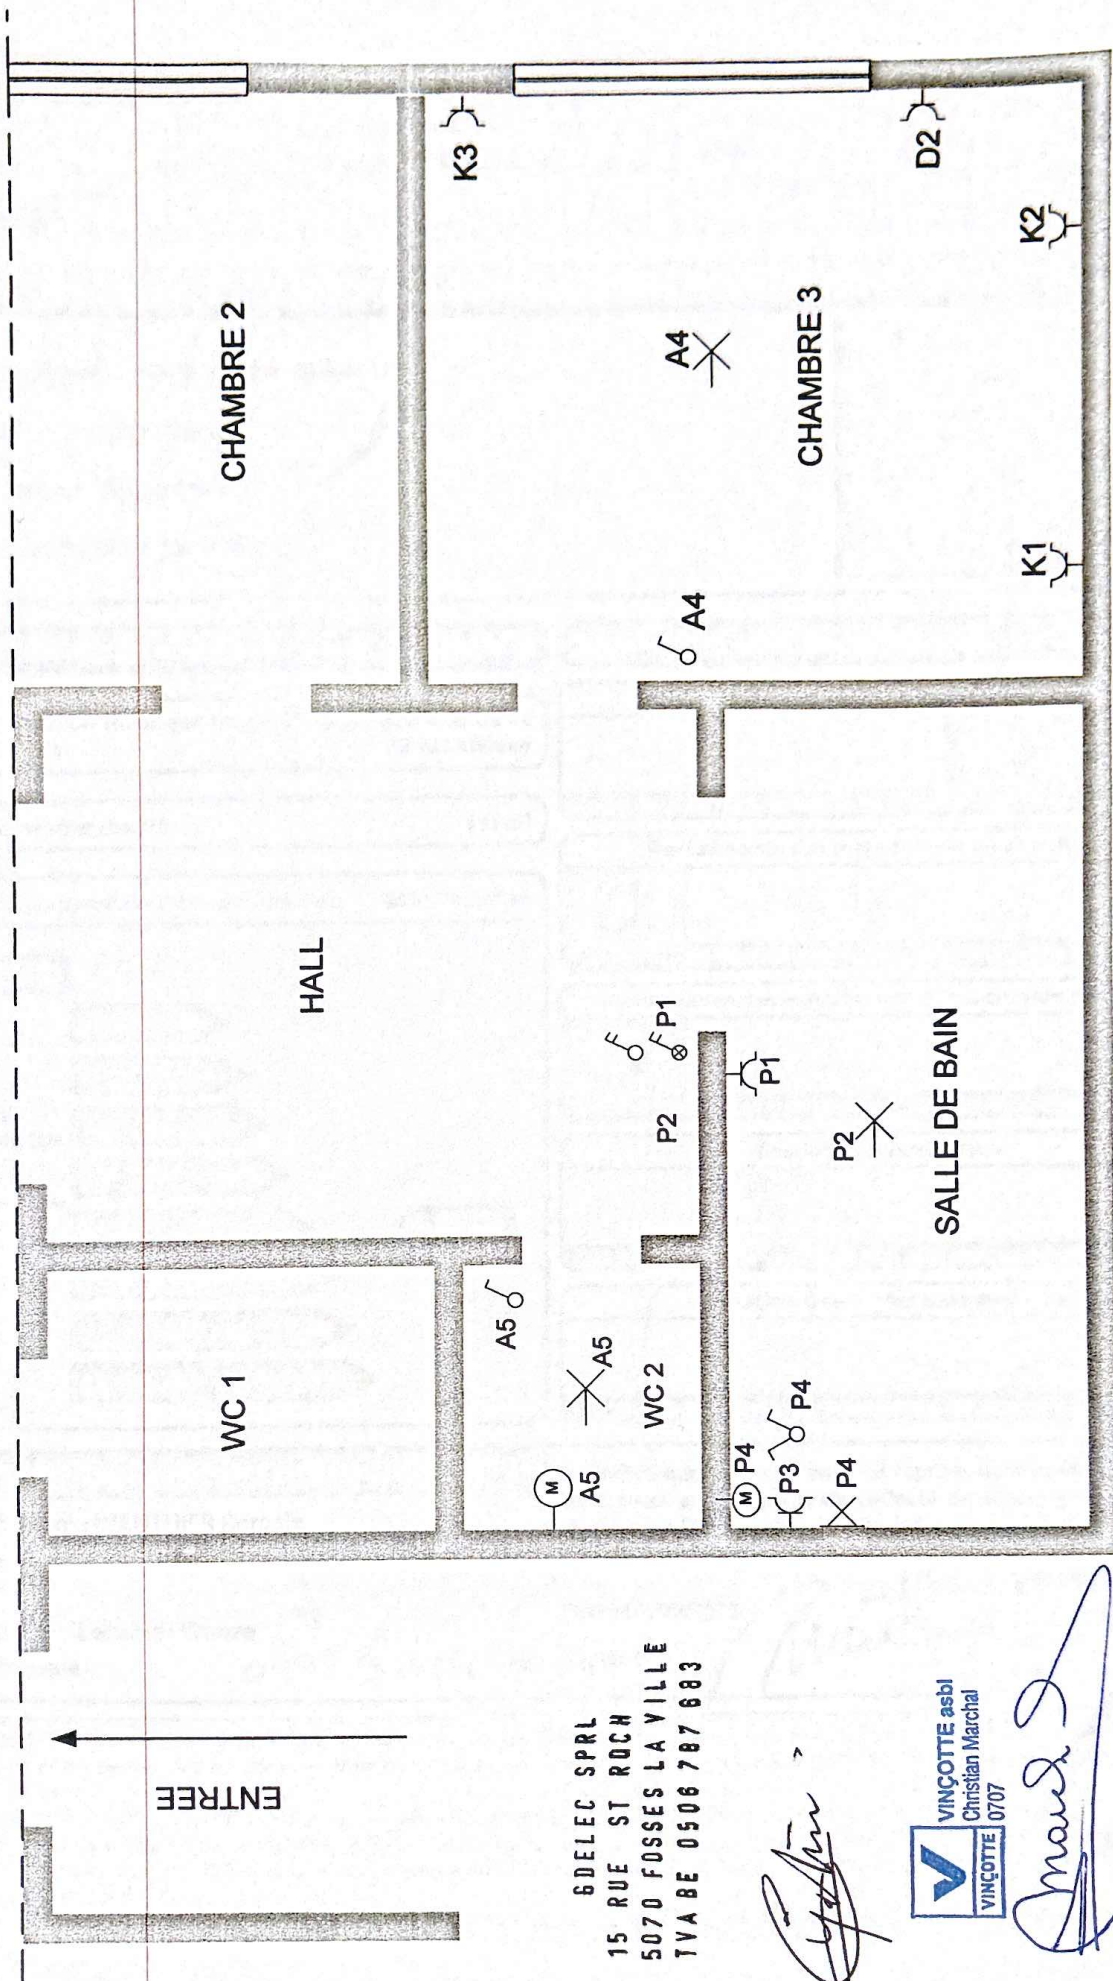

BDELEC SPRL
 15 RUE ST ROCH
 5070 FOSSES LA VILLE
 TVA BE 0506 787 683

Signature



Signature
