



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :



N 107138

040-INSP

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>P. E. R. / Mr. P. R.</u>	Naam, voornaam : <u>Mr. L. L. L. L. L.</u>
Ident. Kaart nr. : <u>0541 877 710</u>	Adres : <u>Van der ... 175 ...</u>
BTW nr. : BE <u>0541 877 710</u>	Post nr. + Stad : <u>1030 Brussel</u>
	Tel. : <u>...</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☒ wijziging ☐ uitbreiding	☐ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☒ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle <u>na controle ...</u>	☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art ... ☐ Art ...	☐ Werkeenheid
☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541449500000813897</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>40320137</u> meterstand dag : <u>81815</u> nacht : <u>...</u> ☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : <u>...</u> meterstand : <u>...</u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Type aardelektrode : <u>...</u>
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ aardingslus pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>...</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>...</u> <u>...</u>
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>8</u>
☐ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☐ Montage	☐ Toestellen	☐ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>3</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>50</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	<u>Nihil</u> <u>Herding na controle ... ACA vzw</u> <u>11.12.15 57 Ref 1013120094</u> <u>del 03/01/2014</u>
	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Verwout Dier Agent nr. : 1346 Datum : 11.12.15Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 1 ☒ Eindraadsschema(s) : 1 ☐ ...

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

..... (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

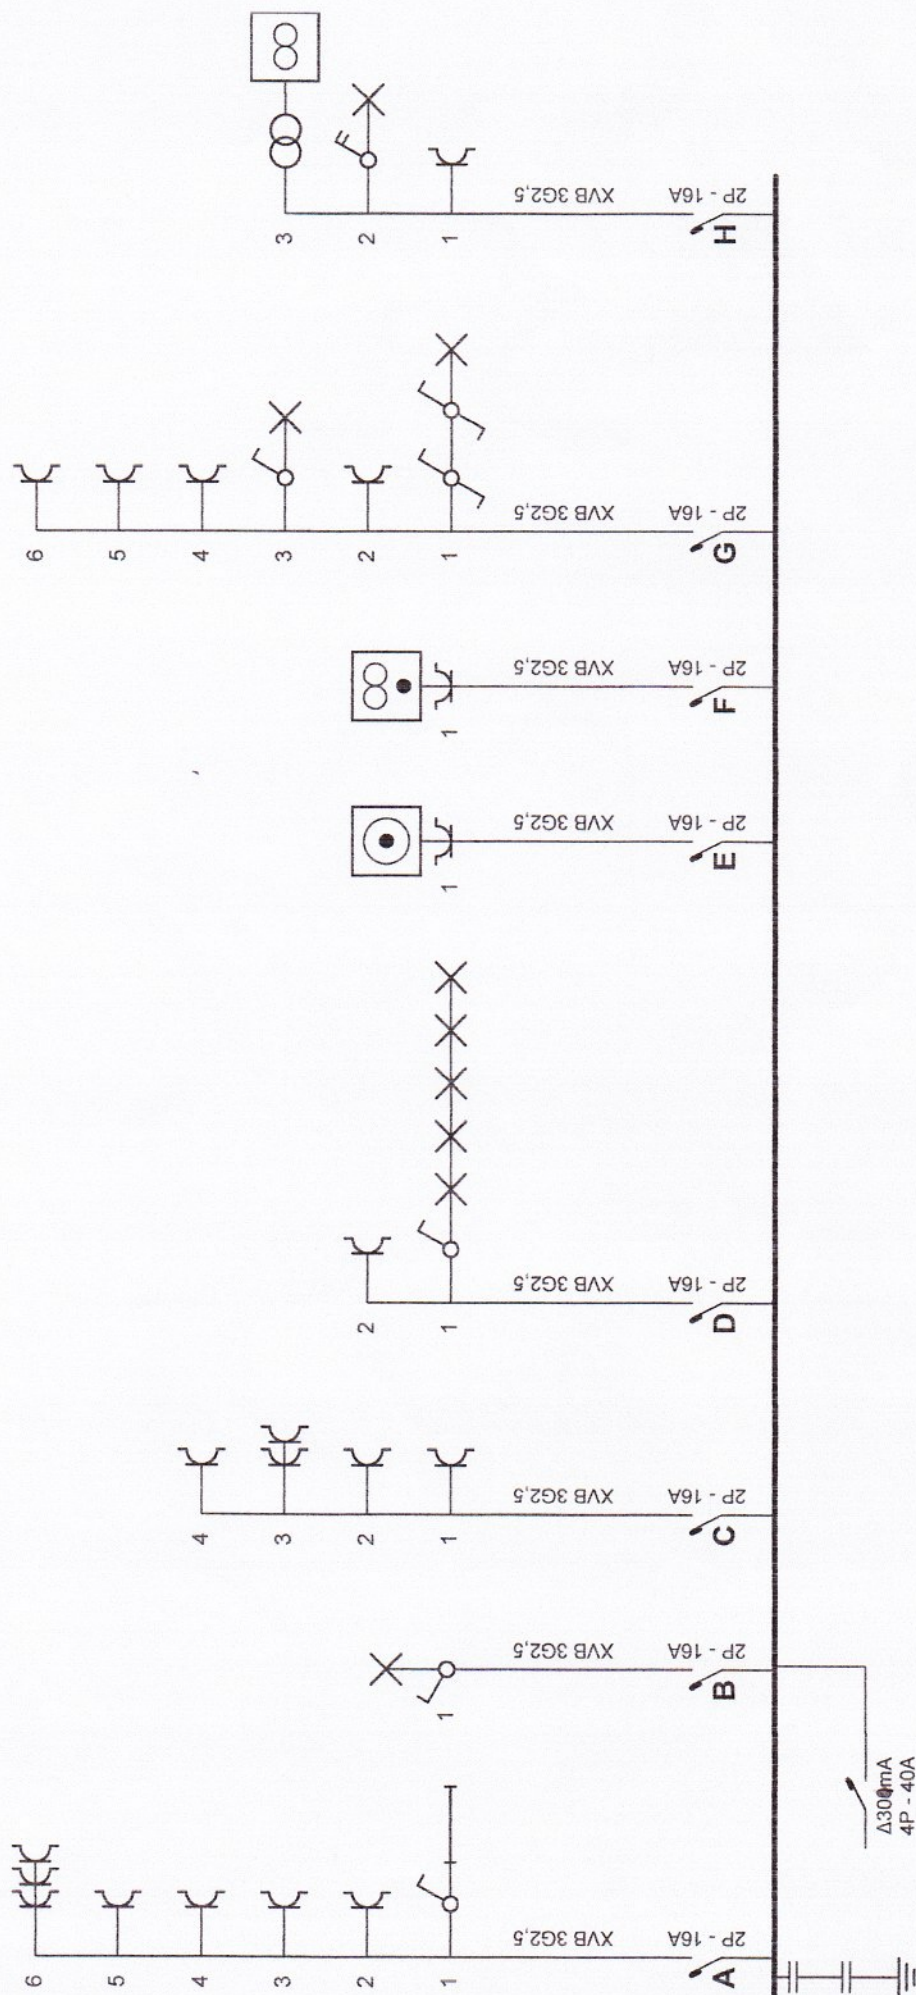


Plaats van de elektrische installatie
 Legarcon Laura
 Jan Van Rijswijklaan 275 Bus 24
 2018 Antwerpen

Installateur
 P.I.R.
 Baggenstraat 22
 2140 Borgerhout
 GSM: 0495/20.15.82
 e-mail: luc.pauwels@skynet.be
 BTW BE 0511.877.710

p. 1/2
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz



Handwritten signature

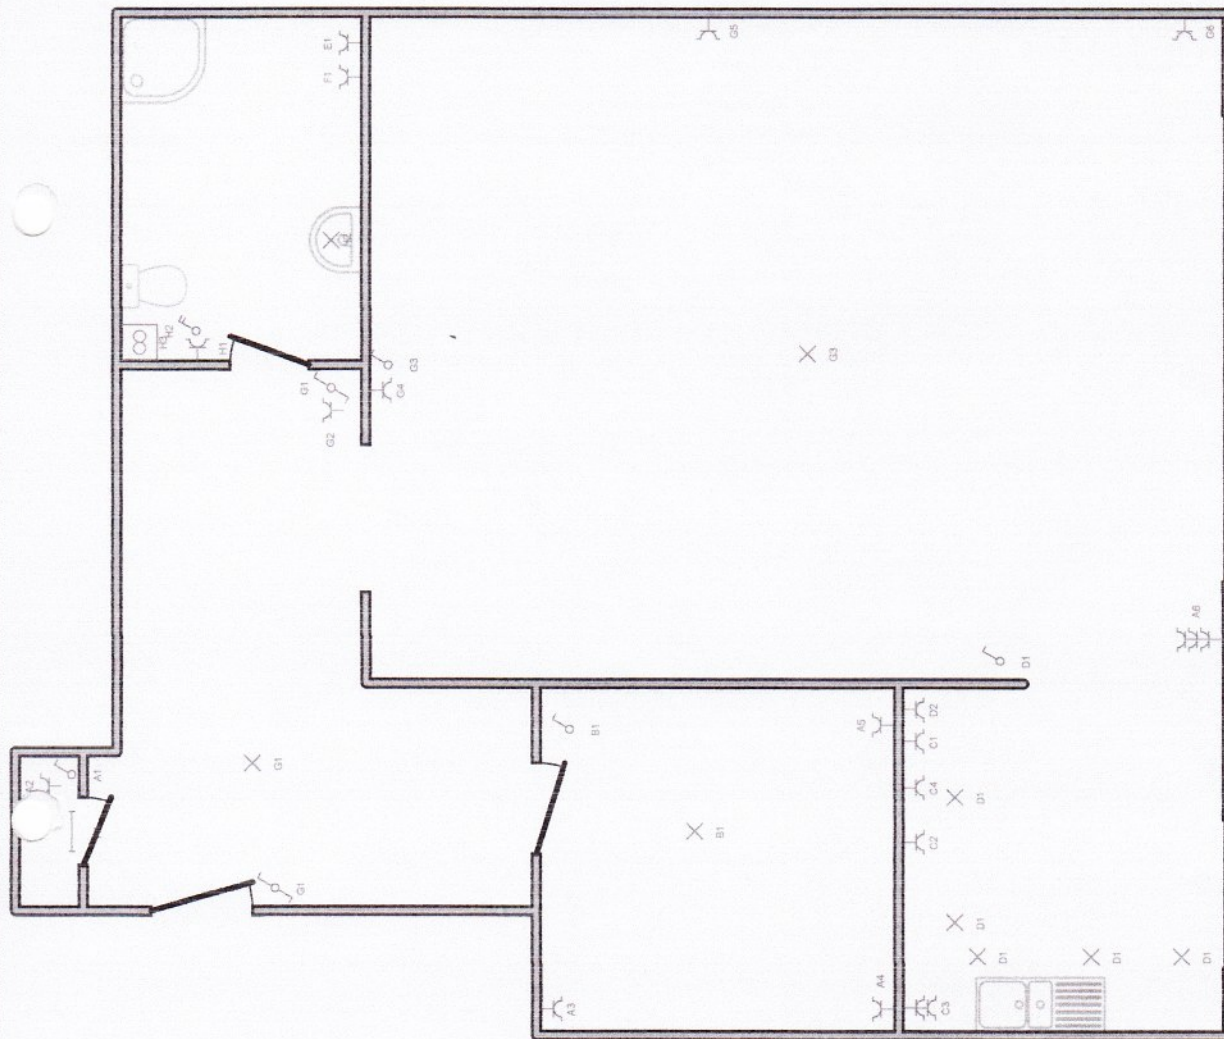

Plaats van de elektrische installatie
 Legarcon Laura
 Jan Van Rijswijcklaan 275 Bus 24
 2018 Antwerpen

p. 2/2
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

Installateur
 P.I.R.
 Baggenstraat 22
 2140 Borgerhout
 GSM: 0495/20.15.82
 e-mail: luc.pauwels@skynet.be
 BTW BE 0511.877.710

DIRK VERVOORT
 Installateur
 0479/11.11.11



1.12.15
