

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: 118207  
Cont.pers.: PIETER BECKX  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: pieter@pbdomotics.be



ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5451880  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 30/10/2020

Klant / Opdrachtgever:

PB DOMOTICS  
HOUWSTAAT 155  
2580 BEERZEL

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 499 DERWEDUWEN JONATAN  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres:  
Installateur/verantw. werk: Naam: Adres: B.T.W.:  
Adres installatie: LEUVENSESTEENWEG 138 AARSCHOT 3200 Private HS-cabine: NEE  
Type installatie: wooneenheid Toestel/Install. ID: LS01 Leuvensesteenweg 138  
Aarschot  
EAN nr.: Leverancier: Teller nr.: 620758 Nachtteller nr.:

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 \*: toegepast  
(\* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
Datum: 30/10/2020 Installatiedatum: vóór 01/10/1981

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Ads 2p40A Alg. scheidingschak.: aut.maatschappij  
300mA  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA  
Eéndraadschema en situatieplan:  zie bijlage  referentie:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 22

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 17,69 MOhm Spreidingsweerstand: 14,6 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

1/2

controle organisme  
vereniging zonder winstoogmerk  
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:  
Koningin Astridlaan 60  
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00  
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
Bank KBC BE97 4053 0205 0149


**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, berekbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit. 3. Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
I	geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.  
De volgende **controle** moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.  
De éénraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.





Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)

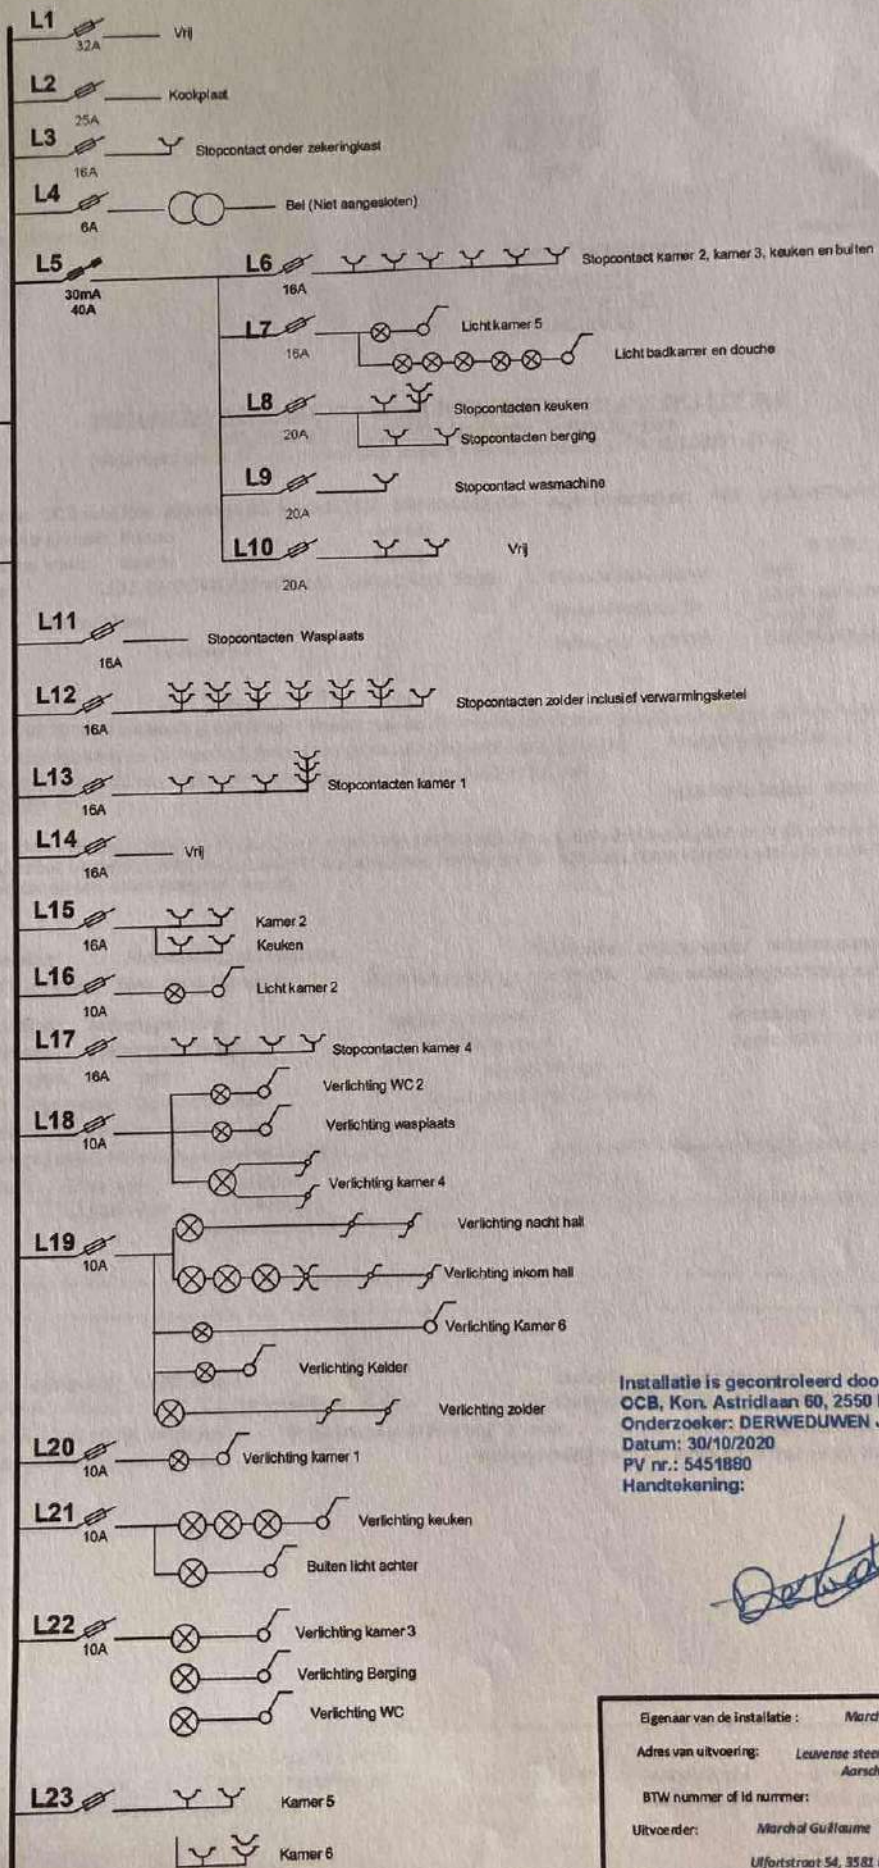

Installatie is gecontroleerd door:  
**OCB, Kon. Astridlaan 60, 2550 Kontich**  
 Onderzoeker: **DERWEDUWEN Jonatan**  
 Datum: 30/10/2020  
 PV nr.: 5451890  
 Handtekening:

*Jonatan Derweduwen*

Eigenaar van de installatie:	Marchal Philippe	
Adres van uitvoering:	Leuvense steenweg 138, Aarschot	Handtekening
BTW nummer of id nummer:		
Uitvoerder:	Marchal Guillaume	Handtekening
	Uilfortstraat 54, 3581 Beverlo	
