

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Quai St Leonard 22/911  
4000 Liège.

PROPRIETAIRE : \_\_\_\_\_  
Adresse : 59 Quai St Leonard 4000 Liège

DEMANDEUR : \_\_\_\_\_  
Adresse : Liège

INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_  
Adresse : Existante.

TVA ou CI : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n°: 5407519  
Index : \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:**

Date du contrôle : 22-03-2016 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:  
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 412.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : ~~Notre~~ - ~~Extension~~ - ~~Modification~~ - ~~Temporaire~~ - ~~Renforcement~~ - ~~Vente d'habitation~~ ; Type locaux : Appart

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension II 230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau. princ. : 2x2 X 6 mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type 300mA/40A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 6 ; RA : 15 Ohm; RI tot 0,5 MOhm

Facteurs d'influences externes: \_\_\_\_\_

DESCRIPTION: \_\_\_\_\_

*voir schémas en annexe*

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : \_\_\_\_\_

*rien*

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le :	
le responsable du distributeur	
nom :	
signature :	

- CONCLUSION**  1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 22-03-2016 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est **pas conforme**
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : \_\_\_\_\_

VOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.


L'agent visiteur,  
(N°, nom, signature)  
*188 Padebrood*

pour Le Directeur,



Siège social: Rue Neerveld 109, boîte 6, B-1200 Bruxelles

72 DeRaybe  
 Sai St Leonard 22/011  
 4000 liège

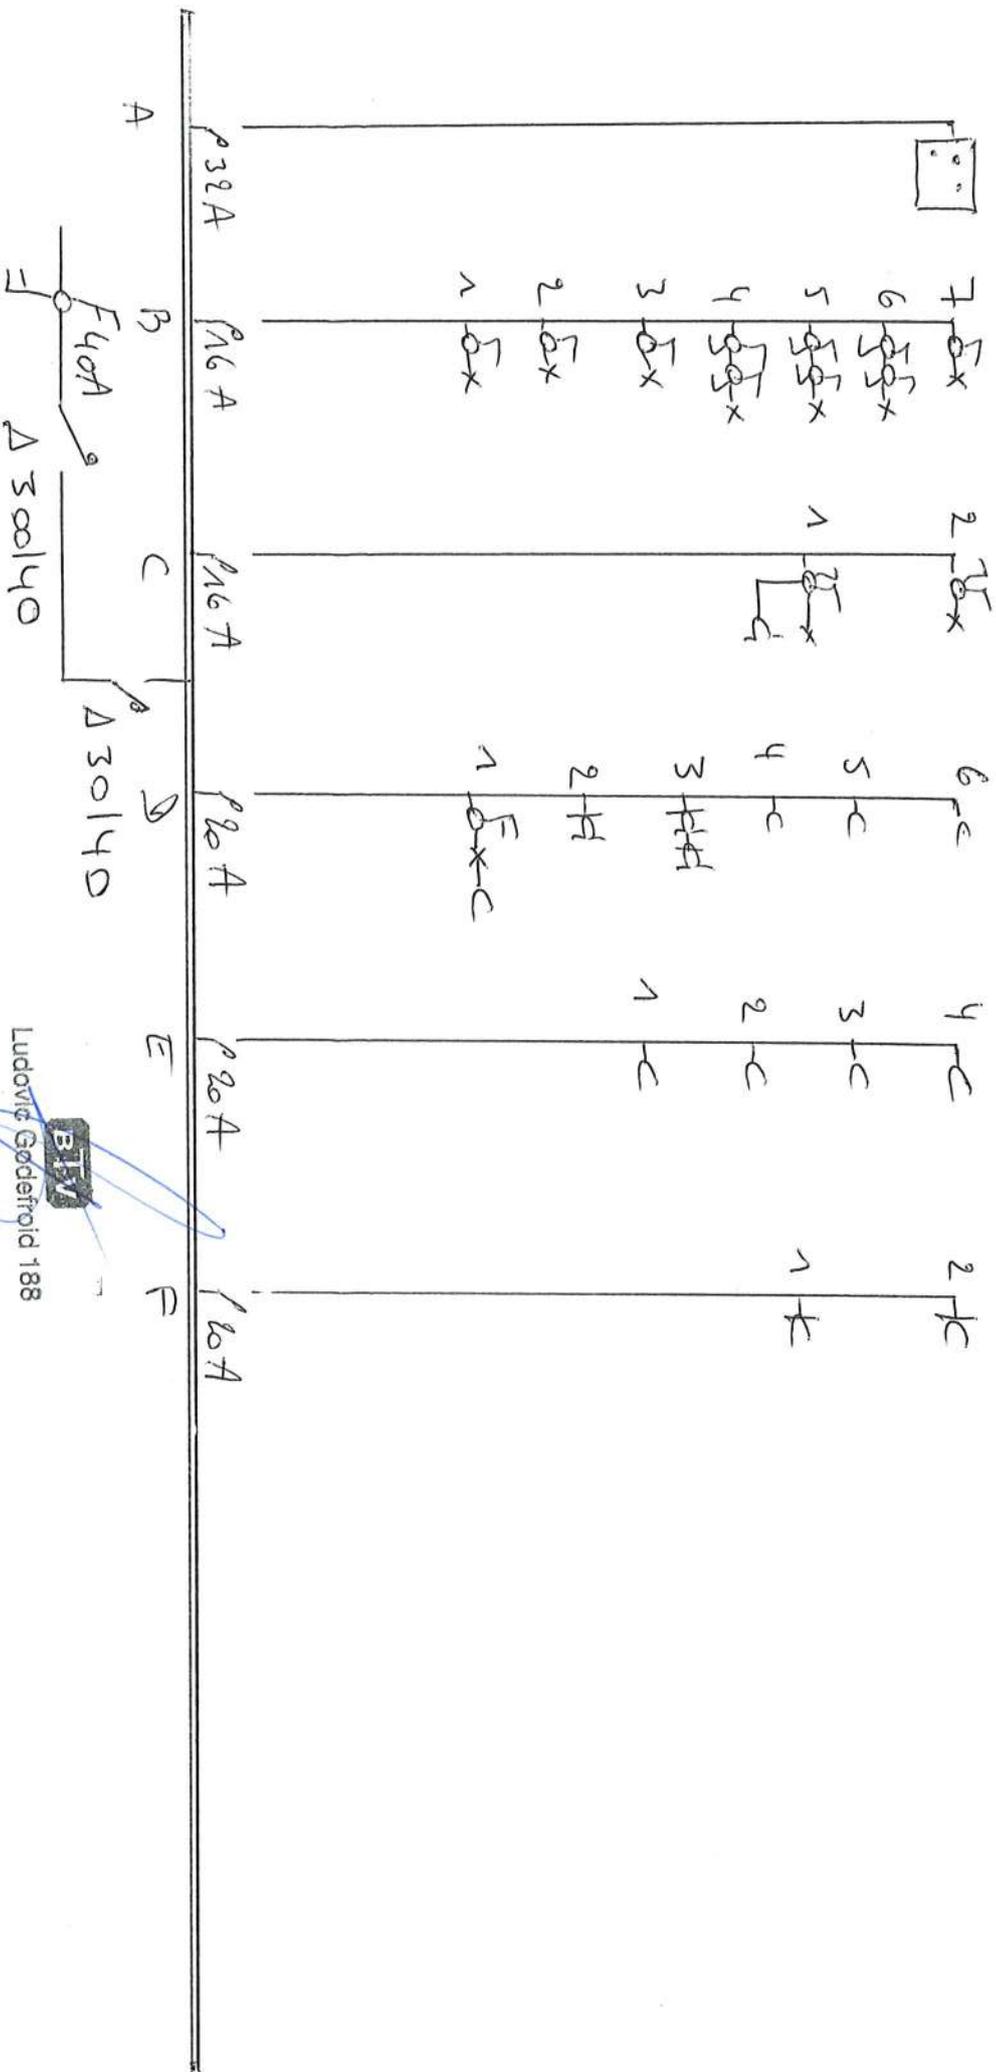

**BIV**  
 Ludovic Goderfroid 188

7<sup>te</sup> Pokybe  
 5+ liņvad e2/011  
 4000 liņģe

  
 Ludavs Godofroid 188

