



KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK  
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

# Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning



overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270) *Ren.*
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	DE VORNEZ		Voornaam		Postnr	1102
Adres	STEENENDEEF STRAAT 11		Gemeente	LEIRIBEEK		
Installateur	JAK ELECTRI TE GAEI.		Gemeente	LEIRIBEEK		
BTW-nummer	BE 0998708346					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	DE VORNEZ		Postnr.	1102		
Adres	STEENENDEEF STRAAT 11		Gemeente	LEIRIBEEK		
EAN-code	5126		Elektriciteitsverdelers	1 VERLEK.		
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	3 X 400V / 4 X 2p AUT 20A-2,5mm <sup>2</sup>
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	10mm <sup>2</sup> / 1 X 2p AUT 16A - Ren
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	MAX 40A / VIA 4p DIFF 40A / 30A
Type alg. schakelaar	ALC DIFF / 2 X 2p AUT 20A-2,5mm <sup>2</sup>
Aantal borden	1 / 1 X 4p AUT 20A - 4mm <sup>2</sup>
Aantal eindstroombanen	3
Type aardelektrode	BEWAARD
Algemene diff.stroom.inr.	4p 40A / 0,3A
Bijkomende diff.stroom.inr.	4p 10A / 0,03A
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW):	

Metingen	Meetapparaat: apparaat waarvan de Inspecteur titulaires is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig: procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand:	14,02 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V): > 1 MΩ
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.):		Werking differentieelstroominrichting: OK / NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.):

Geen

Opn. - VERLICHT. RANAT; KEUKEN, DADK. NOG NIET GEPLAATST / AANGESLOTEN

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.): RAP / -

**Besluit**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór: / /

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	10/09/2013	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN DER VLIET KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (129) S. VALENS BAK	Datum onderzoek:	10/09/2013
--------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde


87876

RAP-E-901 (05.05.2017)

DIFF. 4P 40A 300mA	A	B	C	D	E	TRANSFO
	20A	20A	20A	20A	16A	

DIFF. 4P 40A 30mA	F	G	H
	20A	20A	4P/25A

**overzicht verdeelbord**

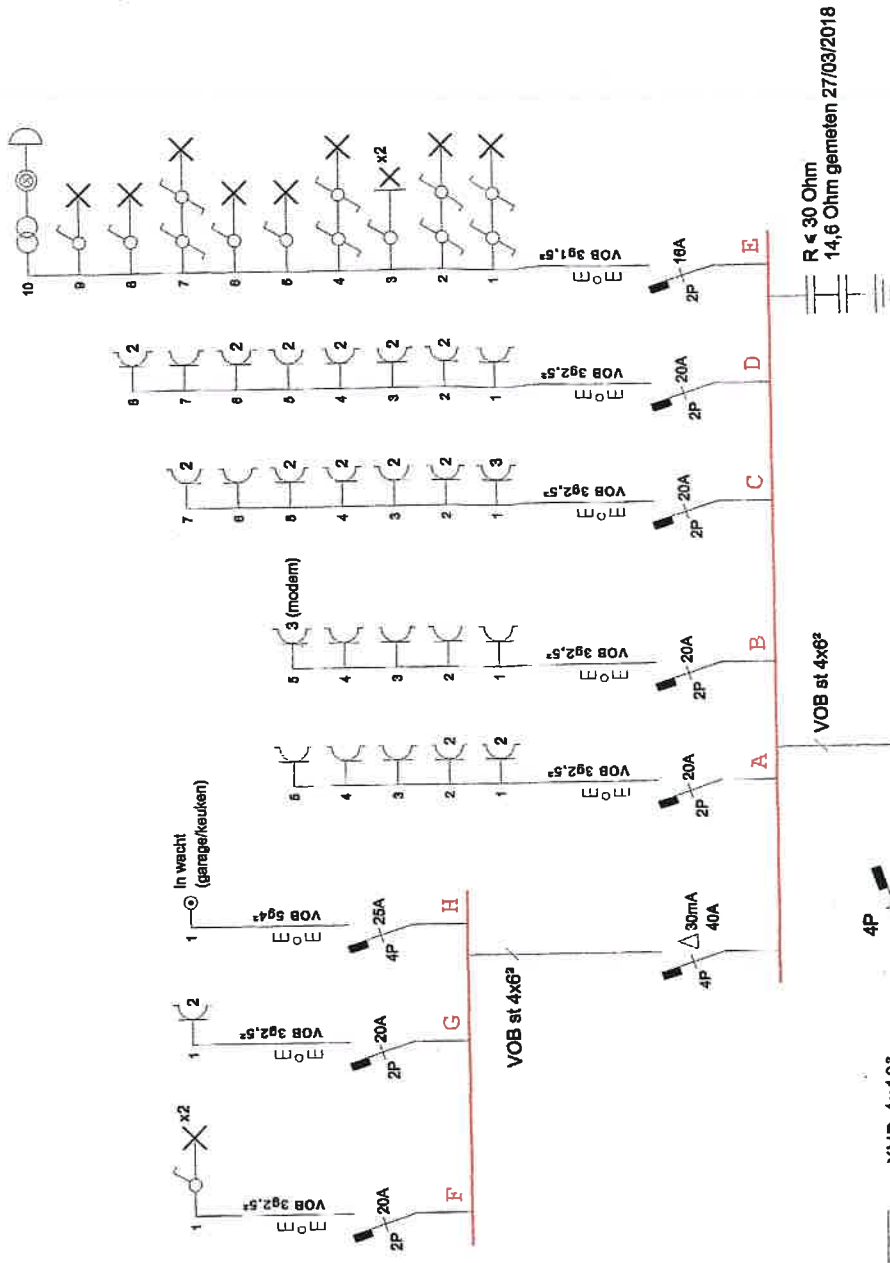

R ≤ 30 Ohm  
14,6 Ohm gemeten 27/09/2018

BESTAANDE INLEIDINGSKABEL

XVB 4x10<sup>2</sup>  
3x2x6V+N  
380

ELEKTRICITEIT **S&K** bvba

sven & kris hollevoet

trompstraat 41  
B-1502 Lembeek (halle)  
fax : (02) 361.31.88  
BE 0448.708.340


bestaande ééngezinswoning

Bart DESCORNEZ  
Steengroefstraat 18


B-1502 Lembeek (Halle)

**ÉÉNDRAADSSCHEMA**

afgevaardigde erkend organisme  
VH KEUR VERBODEN ANGOEME VZW  
Inhoud: 109  
NS-DUK  
datum: 19/04/18

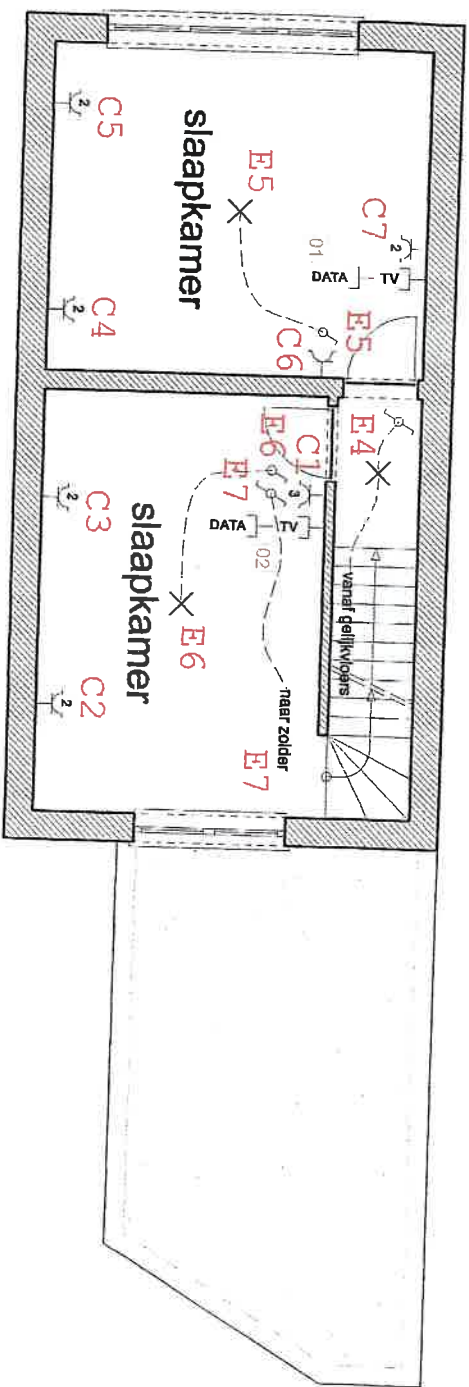

1° VERDIEPING

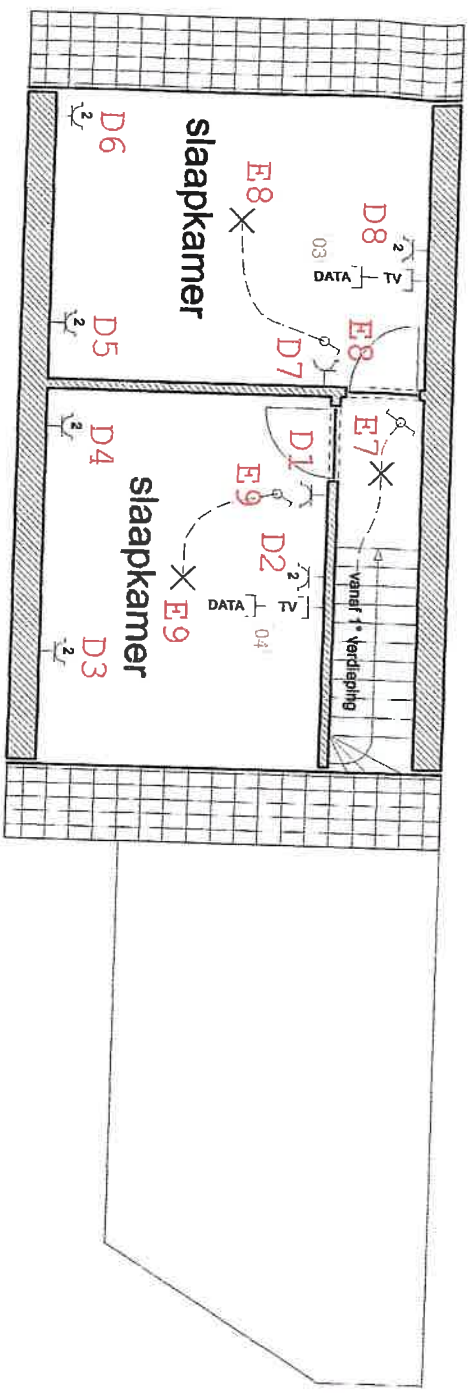

ZOLDERVERDIEPING

TRICITEIT **S&K** bvba


& Kris hollevoet

straat 41  
2 Lembeek (halie)  
(02) 361.31.88  
48.708.340

bestaande ééngesinswoning  
Bart DESCORNEZ  
Steenroefstraat 18  
B-1502 Lembeek (Halie)

afgevaardigde erkend organisatie  
VH KEURBESCHIKKER  
inspecteur (129)  
SYDLENS Vliet

1004.11

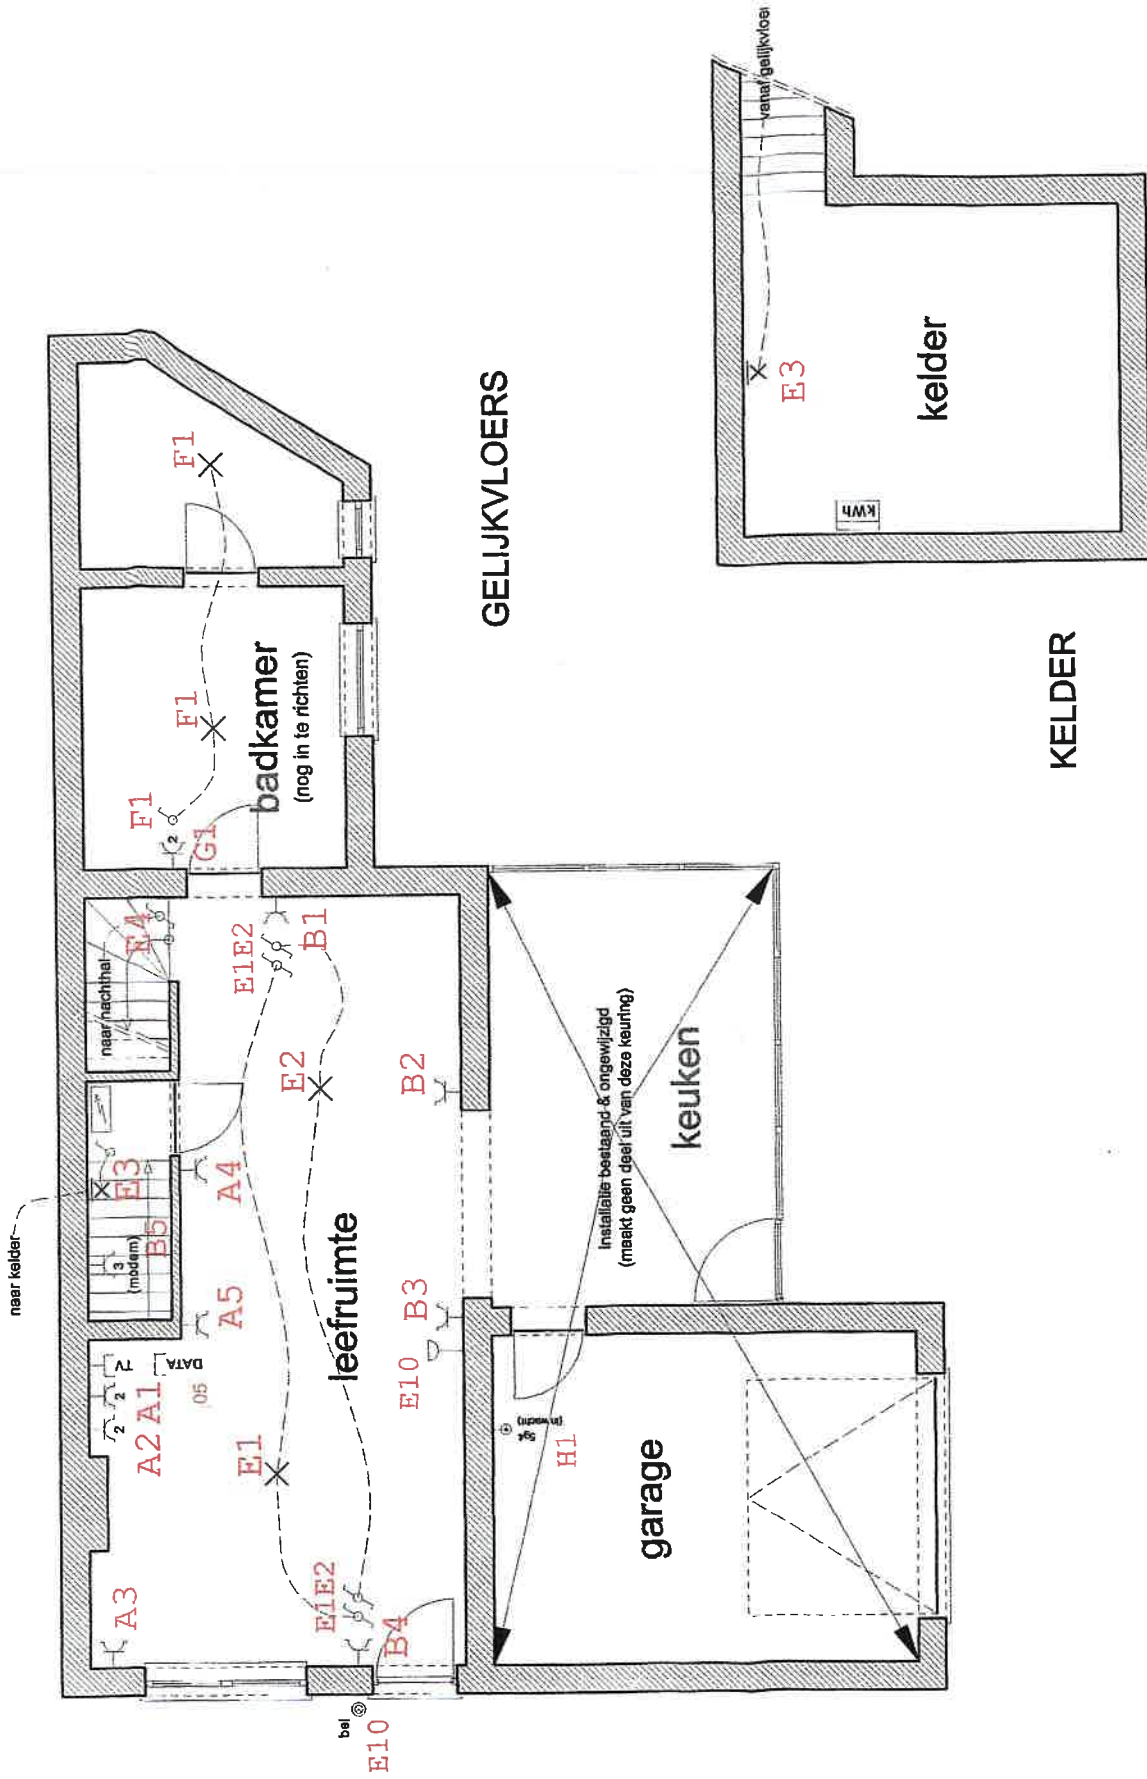

ELEKTRICITEIT **S&K** bvba

sven & kris hollevoet

trompstraat 41  
 B-1502 lembeek (halle)  
 fax : (02) 361.31.88  
 BE 0446.708.340

bestaande ééngesinswoning  
 Bart DESCORNEZ  
 Steengroefstraat 18  
 B-1502 Lembeek (Halle)

SITUATIESHEMA KELDER / GELIJKVLOERS

afgevaardigde erkend organisme

VH  
 KESLINGSON WISSE VZW  
 inspecteur (129)  
 STAVELIER S. DIJK  
 datum: 10.01
