

PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 03/2018/40676/01:1

DATE DU CONTRÔLE 09/07/2018 AGENT VISITEUR Nicolas Dumont de Chassart
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue d'ans 38 - 4000 Rocourt TYPE DE CONTRÔLE visite périodique (Art. 271)



ALGEMENE GEGEVENS

Adresse de l'installation Rue d'ans 38 - 4000 Rocourt
Type de locaux unité d'habitation (maison)
Propriétaire
Responsable des travaux non communiqué

GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB) NETHYS
EAN code non communiqué
Nummer teller 38173
Meterstand dag/nacht 07732/
Type verbinding aérien
Voedingskabel hoofdbord VVB 6mm²
Nominale spanning 3x230V - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting) 32A

CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieschema's	OK	Aantal verdeelborden	1	Aantal stroombanen	10
Kringen					
Bescherming					
Sectie (mm²)					
Conclusie					
De funderingen dateren van	d'avant le 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 40A - 300mA - type A - test OK		
Aarding	piquets	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 30mA - type A - test OK		
Aardingsweerstand (Ω)	25.5	Aansluiting	OK		
Gelijkvormigheid v/d equipotentiaal en de PE	OK	Verlichting/toestellen	OK		
Aardingscontinuïteit	concluant	Visuele inspectie v/ vaste &/ mobiele apparaten	OK		
Foutlus controle	concluant	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK		
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Minimum gemeten isolatieweerstand (MΩ)	4.2		

BESLUIT : CONFORM

Op de datum 09/07/2018, elektrische installatie Rue d'ans 38 - 4000 Rocourt is conform bij het algemene reglement op Elektrische installaties.
De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.
Een verloding stroomopwaarts en stroomafwaarts de differentieelstroominrichting werd geplaatst zodat de klemmen onbereikbaar zijn.
Eén of meerdere eendraadschema's / situatieschema's zijn gecontroleerd geweest en zijn conform met de installatie.
Zonder belangrijke wijzigingen van de elektrische installatie moet de volgende controle voor 09/07/2043 gebeuren.

Handtekening agent

Signature du propriétaire

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 03/2018/40676/01:1

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER VAN HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES :

Het is verplicht het conformiteits- of keuringsverslag te bewaren in het dossier van elektrische installatie, de wijzigingen aan de elektrische installatie in het dossier aan te brengen, in geval van personenongeval te wijten aan elektriciteit moet de Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid worden ingelicht, het nodige onderhoud te doen of laten doen van de installatie het te voorzien dat de installatie ten allen tijde conform blijft, een herkeuring te laten uitvoeren in geval van inbreuk(en) binnen het jaar en door hetzelfde organisme bij een controlebezoek, en in geval van verkoop van de elektrische installatie daterende van vóór 1 oktober 1981 dit te laten doen binnen de 18 maanden door een organisme naar keuze. In het geval dat na een tweede bezoek de inbreuken of een deel ervan standhouden moet het erkend organisme een afschrift van het keuringsverslag sturen de Algemene Directie van Energie die toezicht houdt op de huishoudelijke installaties. De Federale Overheidsdienst Energie in zijn hoedanigheid wordt door het erkend organisme ingelicht als blijkt dat er geen gevolg werd gegeven aan de vastgestelde inbreuken om de installatie in orde te brengen.

Samengevat, welke acties dienen er genomen te worden indien de elektrische installatie conform is?

1

Lees nadrukkelijk
dit proces-
verbaal

2

In het geval van
uitbreidingen,
belangrijke
veranderingen aan
de installatie, laat
de installatie
opnieuw
controleren

3

Als het
geldigheidstermijn
van het rapport is
verstrekken, laat de
installatie opnieuw
controleren

4

Certinergie is tot
uw dienst
0800 82 171



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 03/2018/40676/01:1

BIJLAGEN

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

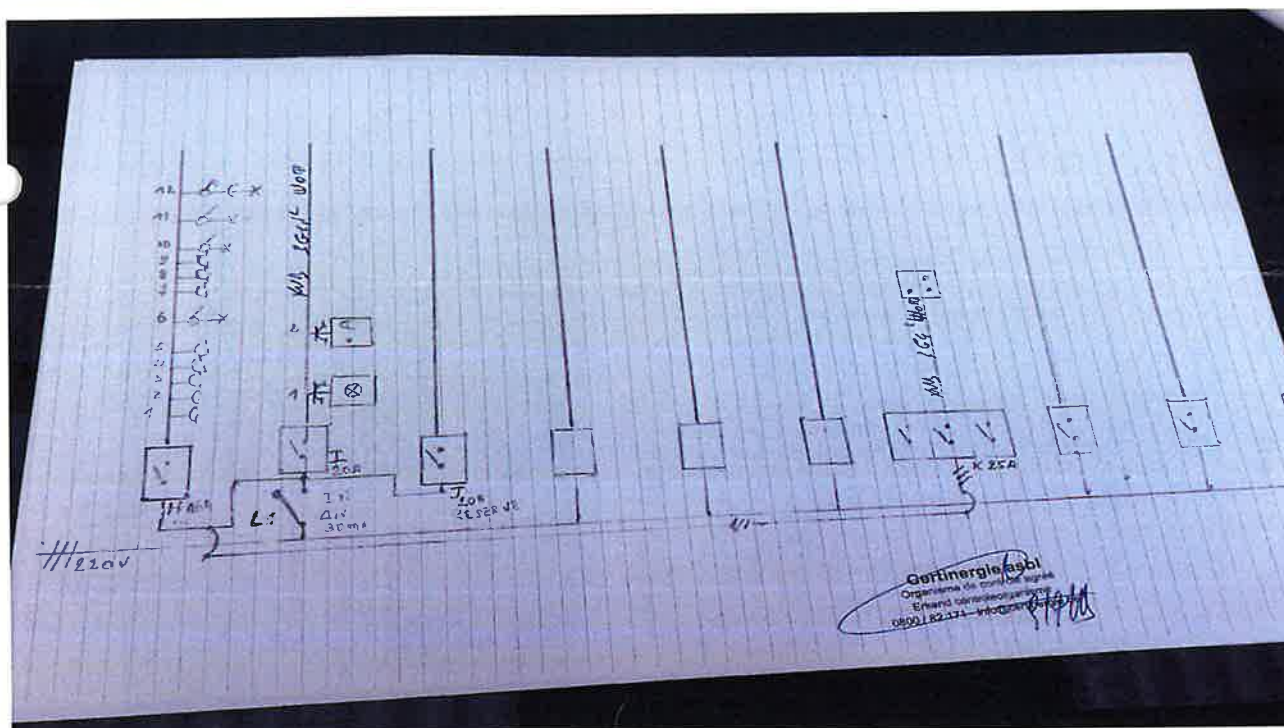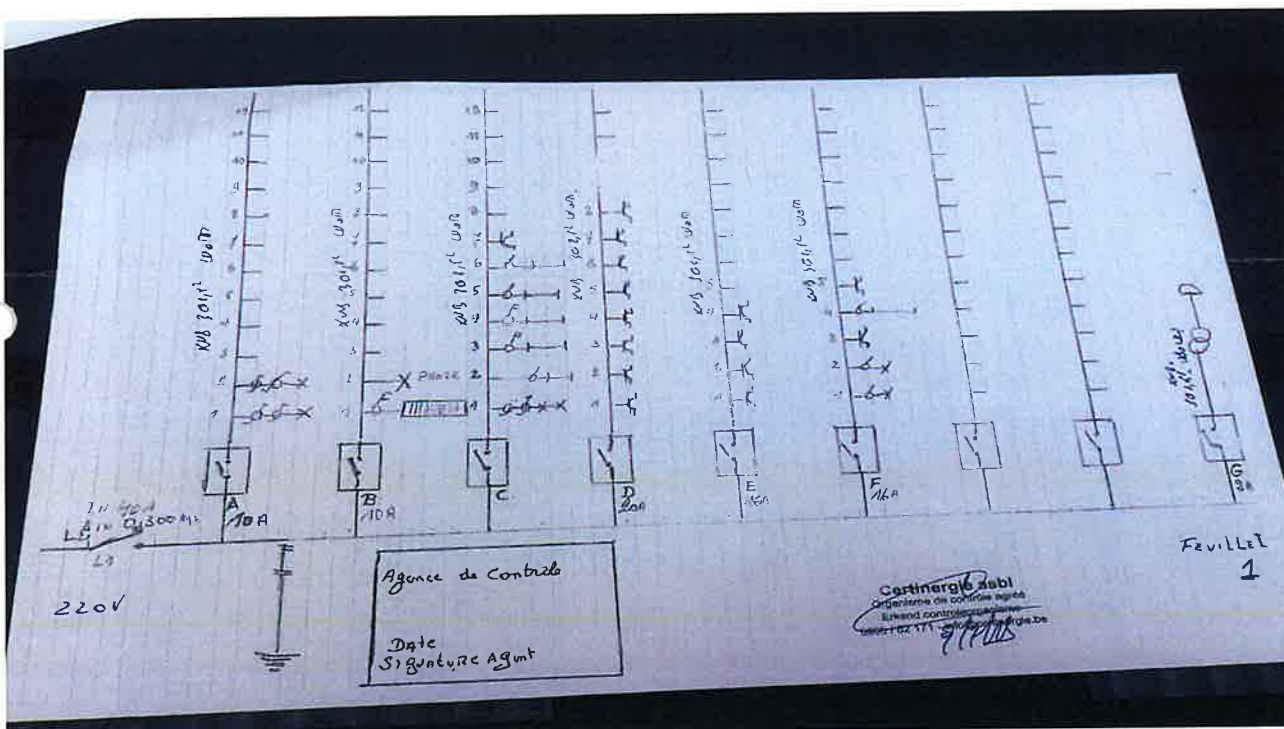



PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 03/2018/40676/01:1

> BIJLAGEN

Plan(s) de position de l'installation

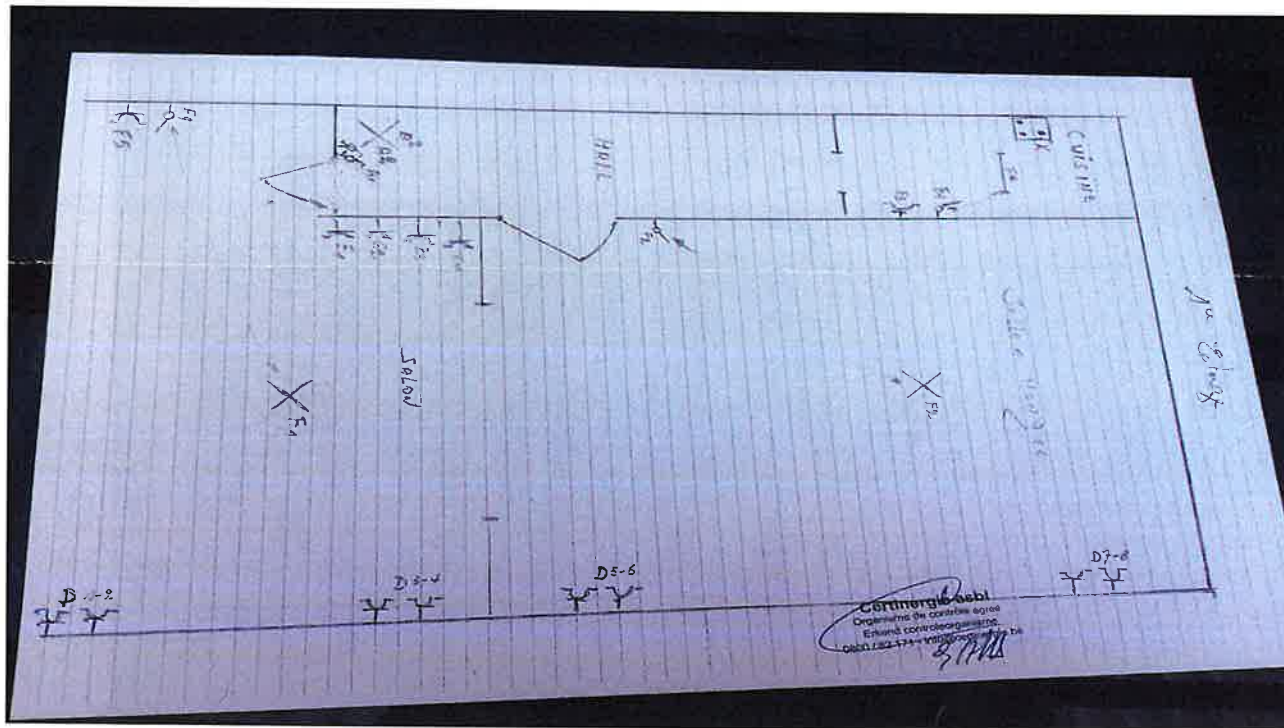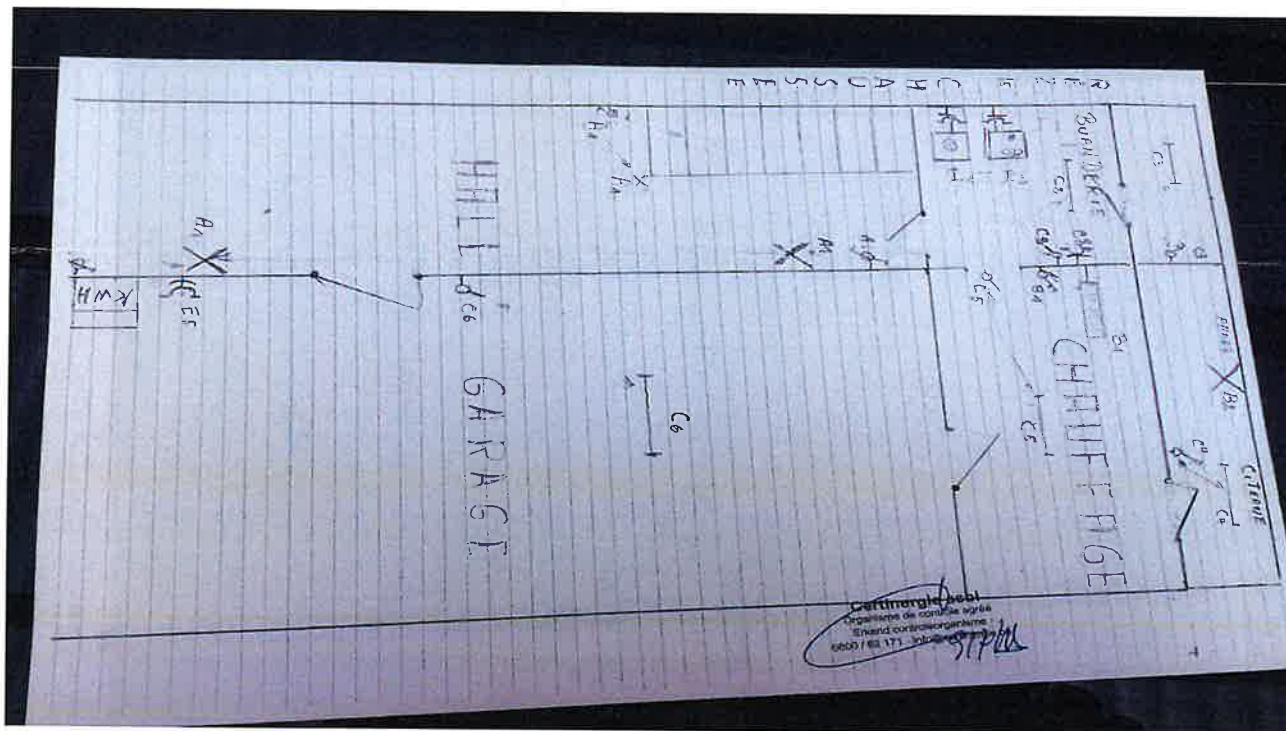

PROCES-VERBAAL BEZOEK VAN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 03/2018/40676/01:1

BIJLAGEN

Plan(s) de position de l'installation

