



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 28/12/2023

Inspecteur: Amaud Comet

Mentor: -

Installateur: ISO FULL

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0641 934 221

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel MI 3102 BT

Numéro de serie: 23120921

Date rapport: 29/12/2023

Adresse de l'installation

Rue Vichaurue
Numéro 34
Boîte
Postcode 6762
Commune Saint-Mard
Pays Belgique

Propriétaire

Nom

Rue

Numéro

Boîte

Postcode

Commune

Pays

Installateur

Nom

N° TVA

Numéro de téléphone

E-mail

ISO FULL

BE 0641 934 221

0477075593

iso.full@outlook.be


Type : Installation PV et/ou une batterie domestique

EAN : 54

N° compteur : 33712960

☒ Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023? Non

Distributeur: ORES

Tension: 1-230V

Liaison comp / tableau: 10 mm

Protection Max: 50 A

Nombres tableaux: 2

Nombre de circuits: 2

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 13,07 MΩ

RE: 13,80 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL


IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK
DESCRIPTION INSTALLATION							
Nombres circuits		Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)	
1		C	25	Pv	2	4	
1		C	63	Limiteur	2	10	
Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct		OK	Contact indirect		
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl		NA			
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs		OK			
Continuité	OK	Éclairage / machines		NVT	Fonctionnement en ilotage		
					OK		


FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur magnétique


MAGNETIC METER

Jour: Index: 38777,4

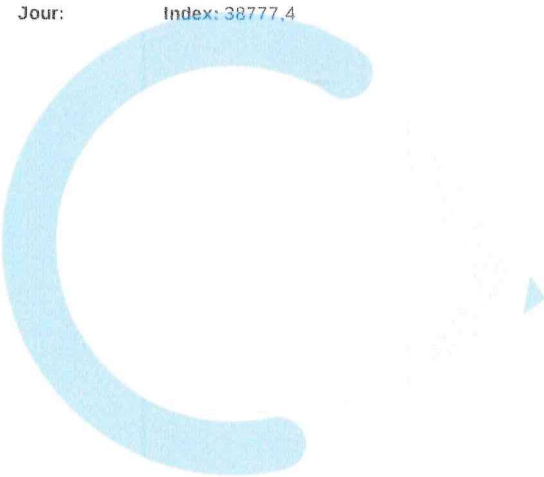

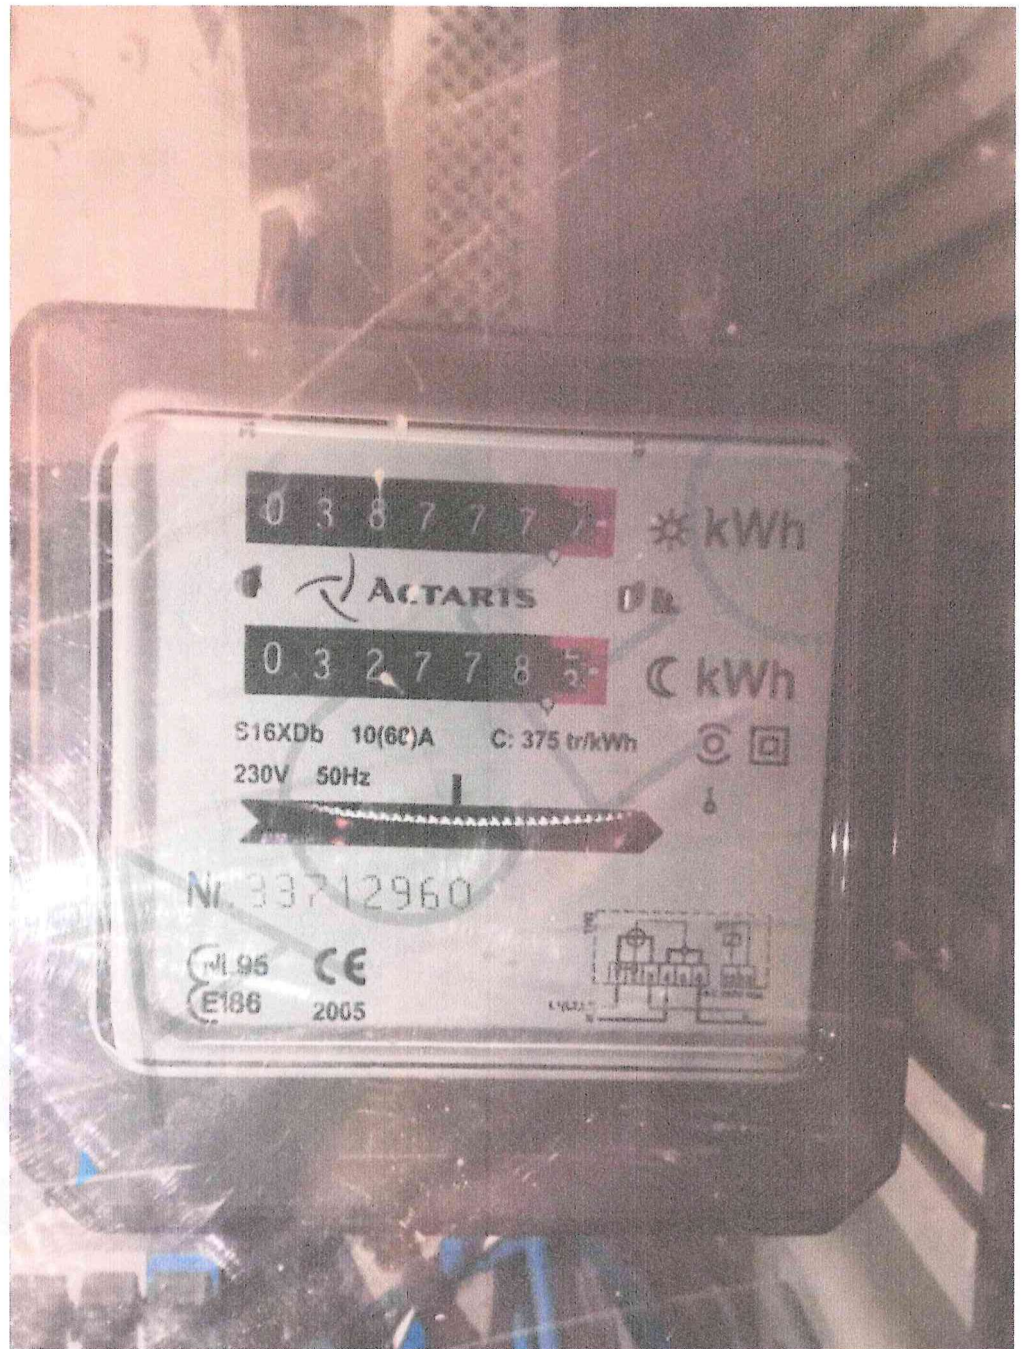

Nuit: Index: 32778,3

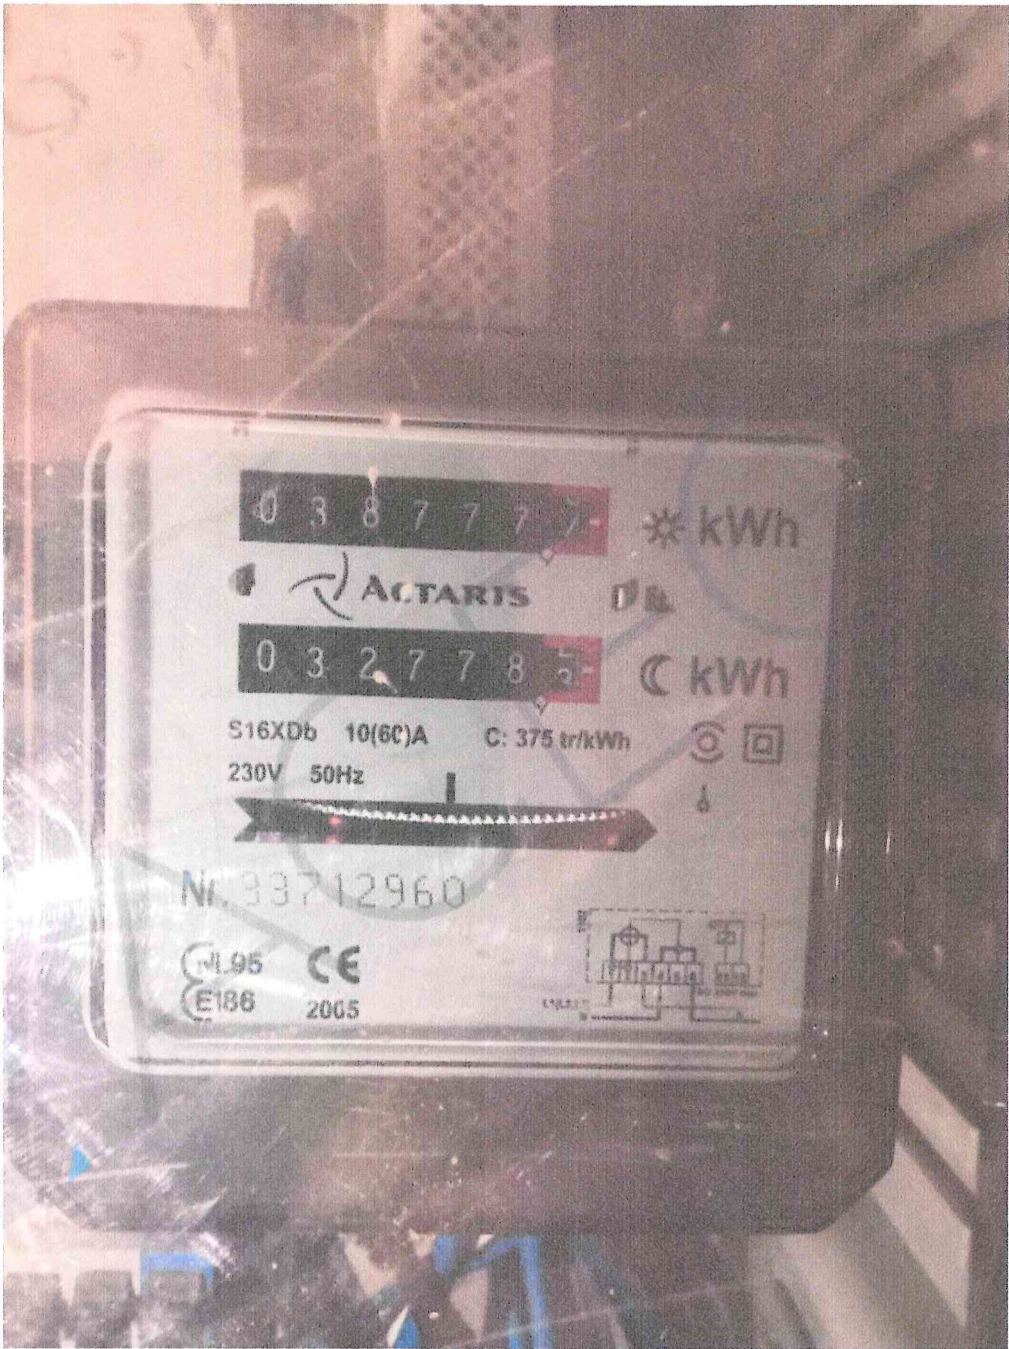

Excl. Nuit: Index: -

COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
-------	----------	-----------------------	-------------	--------------

ONDULEUR

Nombre: 1			
Marque: HUAWEI	Series: SUN2000	Type: 4KTL-L1	Raccordement: 1-phase
Numéro de serie: HV22B0132978	Smax (VA): 4400	I AC - nom (A): 19.13	Convient pour le stockage de la batterie: Oui
Courbe: C	IN (A): 25	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: BON

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
10	Trina	Full black	425	4250

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.
nota/note 6 Cette inspection ne comprend que le système PV .

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 28/12/2048
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bomes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Amaud Cornet


Amaud Cornet
ACEGVZW-8371


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 28/12/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

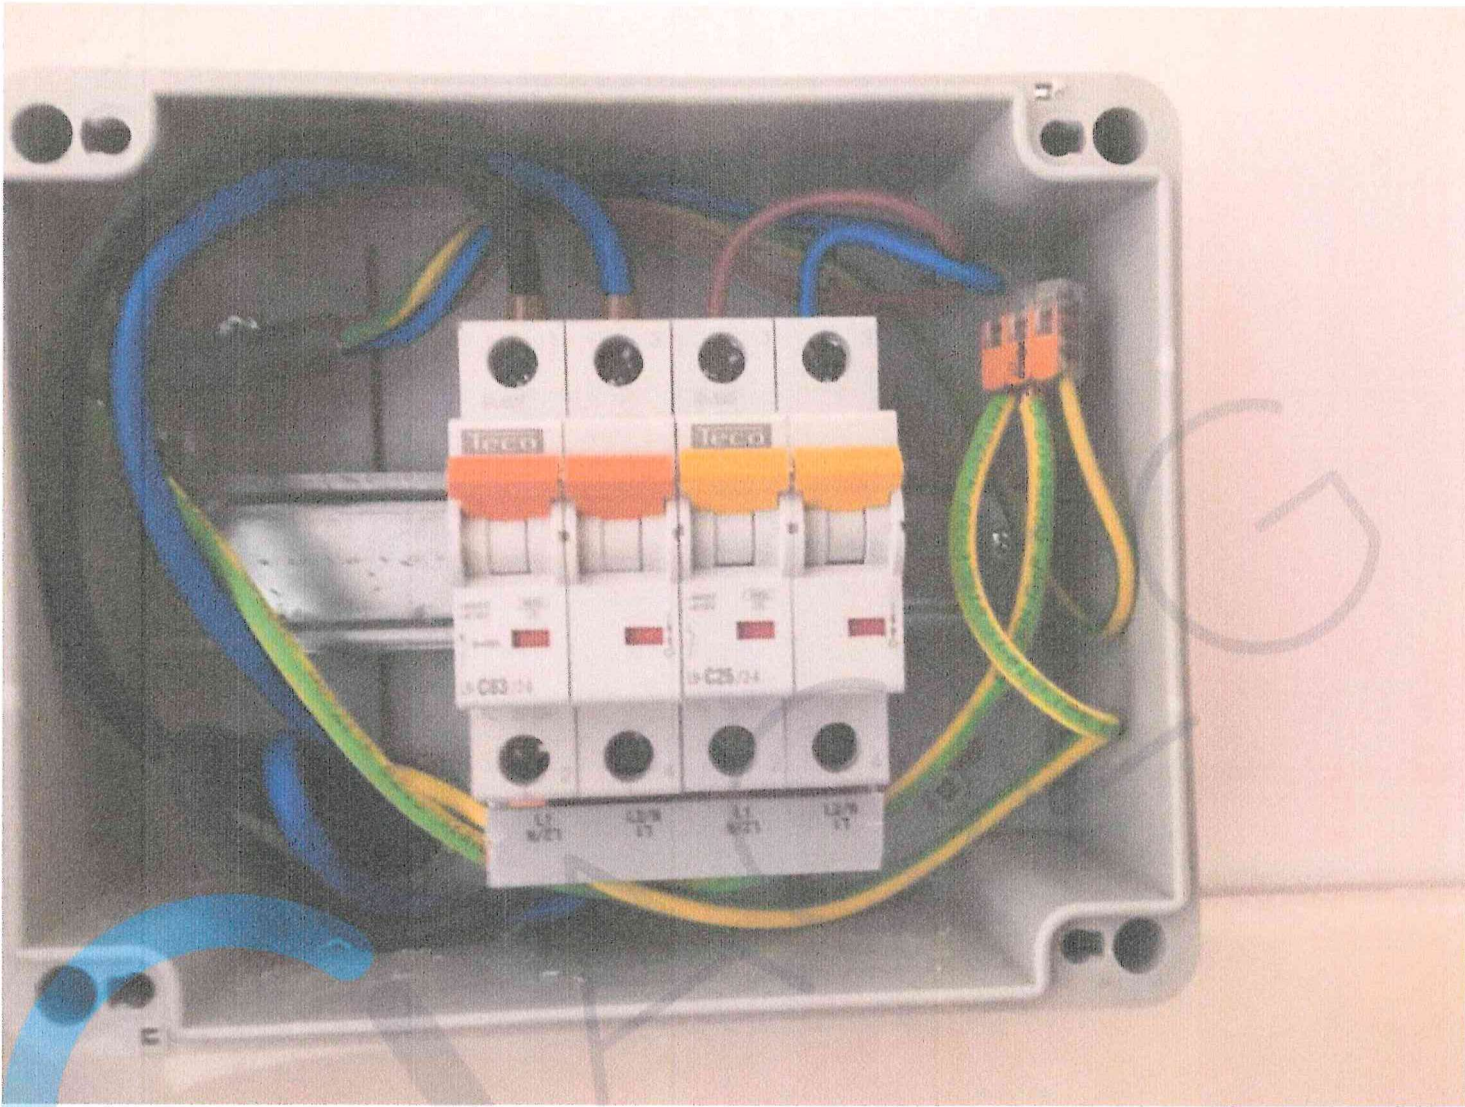

Terminé

Tota 4250Vc Pneu 2125V6

AS2

AS2

AS2

AS2

AS2

AS1

AS1

AS1

AS1


AS1

Tota 4250Vc Pneu 2125V6


Organisme agréé ACEG asbl - Brabant Wallon Rue de Fond Châtelain, 2/2.2 1435 Mont-Saint-Guibert Tél. 065 96 03 11 e-mail: brabantwallon@aceg.be BE 0839 666.481 Pour aceg 28/12/23 Adresse de l'installation électrique Installateur Iso Full S P R L Rue de Fontenelle 1 6240 Farcennes Tél. 071/11-66-05 e-mail: iso.full@outlook.be 0641.934.221 p. 2/2 Schéma de position Date 07-12-23 2 x 230V ~ 50Hz			
Schéma dessiné par: Ecower srl - TVA BE 0770.536.931			



Terminé

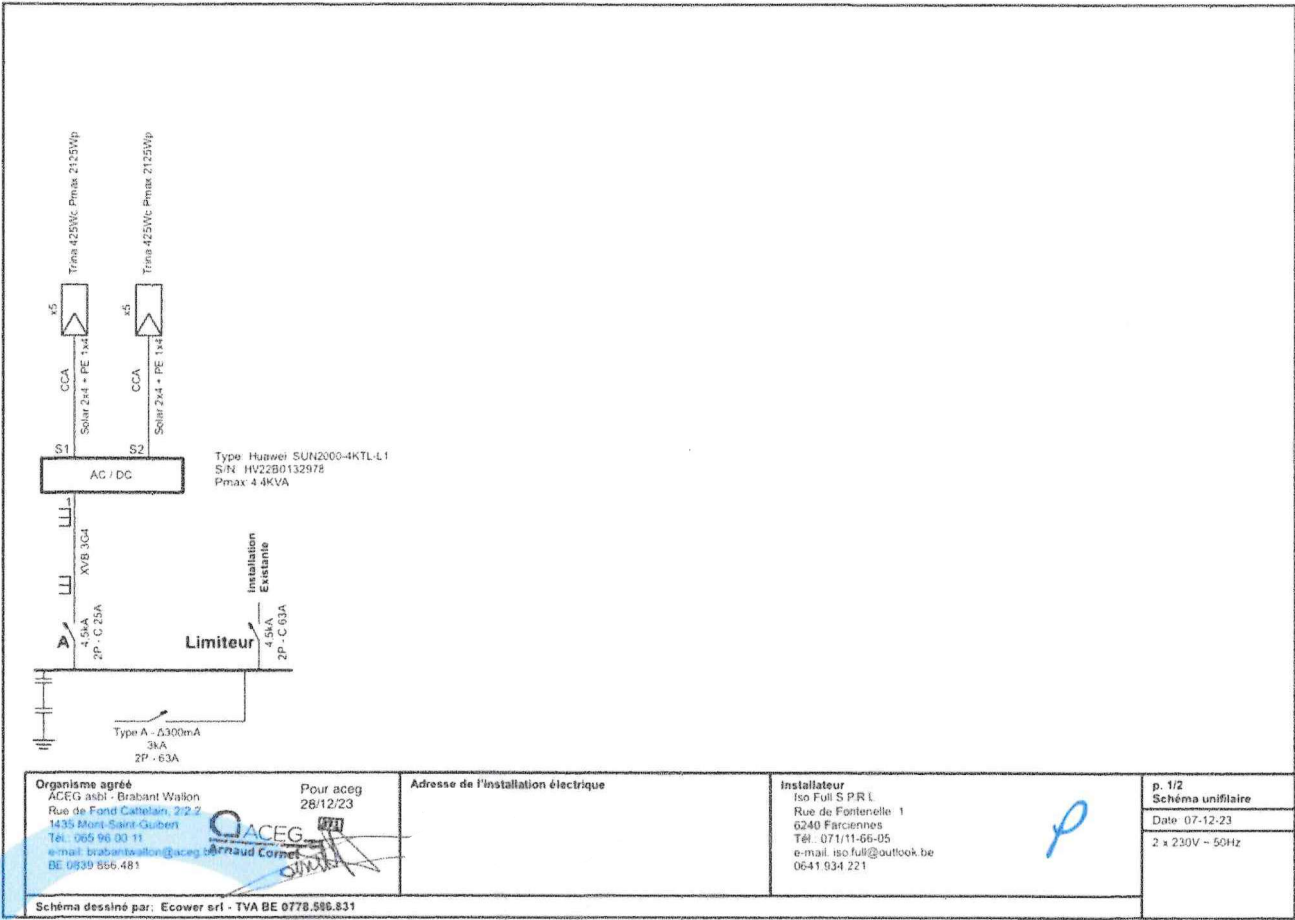



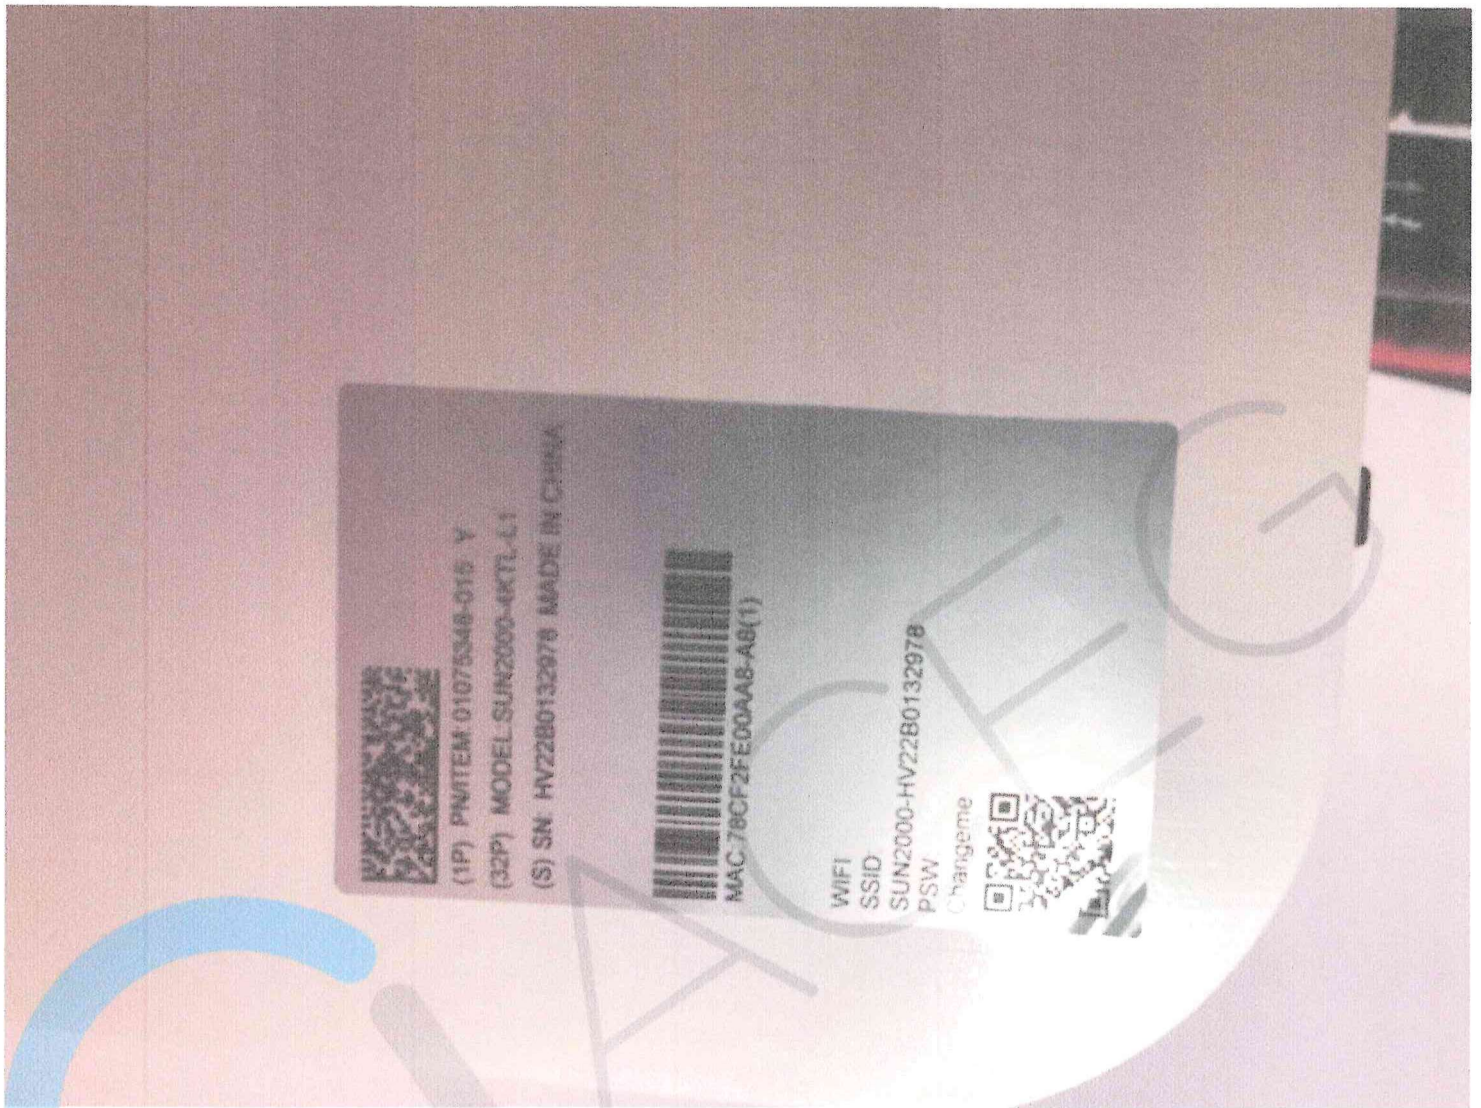

(1P) PN/ITEM 01075348-015 Y

(32P) MODEL SUN2000-4KT1-L1

(S) SN: HV22B0132978 MADE IN CHINA

MAC: 78CF2FED0A8-A8(1)

WIFI

SSID

SUN2000-HV22B0132978

PSW

Changeme











