

3392686

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Verleping / Bestaande / Verandering / Bijlating meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid~~

Type der lokalen : *studio 2de verd. rechts voor*

Plaats van onderzoek : *Bembruggerstraat 60 2060 Sint-Wespen*

Eigendom van :

Opdrachtgever : *Radmi Bisschoppershoflaan 447 2100 Deurne*

Installateur :

BTW : *0440.298.169* ID-kaart :

Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : *Kervenne J.* Datum van onderzoek : *24/07/2037*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 230 V + N~~ Max. Beveiliging : *3 x 40 A 40 A* Omschakelaar : stand :
 Hoofdbeveiliging : Zek : *maxisch* Schak : *diff. 4P 40 A 30 mA*
 Meter-bordverbinding : kabeltype : *VDB* aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net / ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : *lus / baren / pennen / horizontale geleiders* Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *25,0* Ω
 Aantal borden : *2* Aantal eindstroombanen : *4* Algemene isolatieweerstand : *20,5* MΩ
 Diff. schak. : algemene : *4P 40 A 30* mA bijkomende : mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

zie schema's

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N1 Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N1 Badkamer - gasleiding, waterleiding, CV ketel nog niet geplaatst.

geen inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : *24/07/2037*
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie


maatschappelijke zetel :
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 030-0182392-14
 Bank 405-3020501-49

2R.v

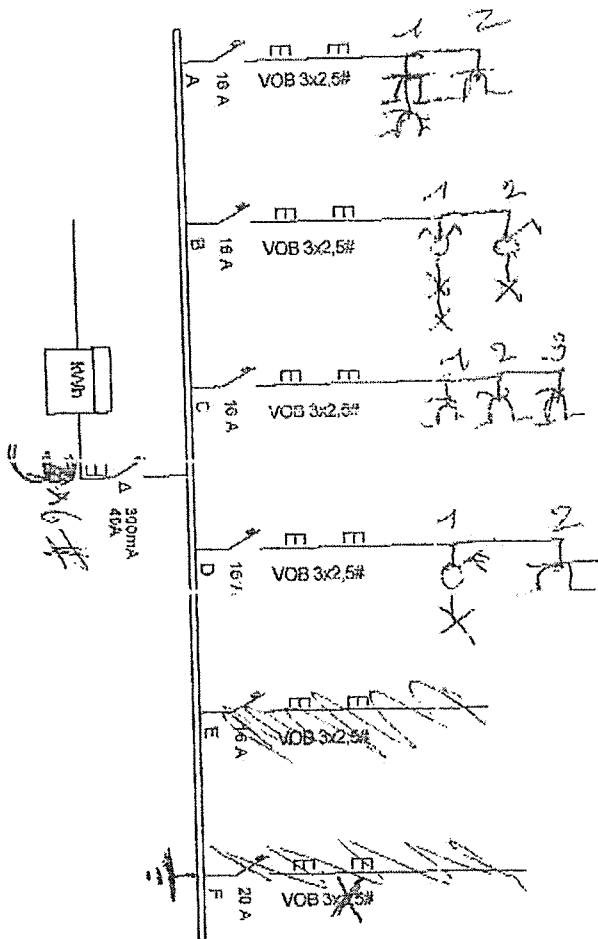

[Faint vertical text from bleed-through]

2460 Pöschel
Aure; 33 42 686
Adres installatie:
Damburgsestraat 60
B - 2060 Antwerpen

de eigenaar:
datum:
handtekening:

voor het weekend organisatie:


naam:

datum:

handtekening:

de installateur:
BTW nummer:
datum:
handtekening:

SITUATIESCHEMA
2RV

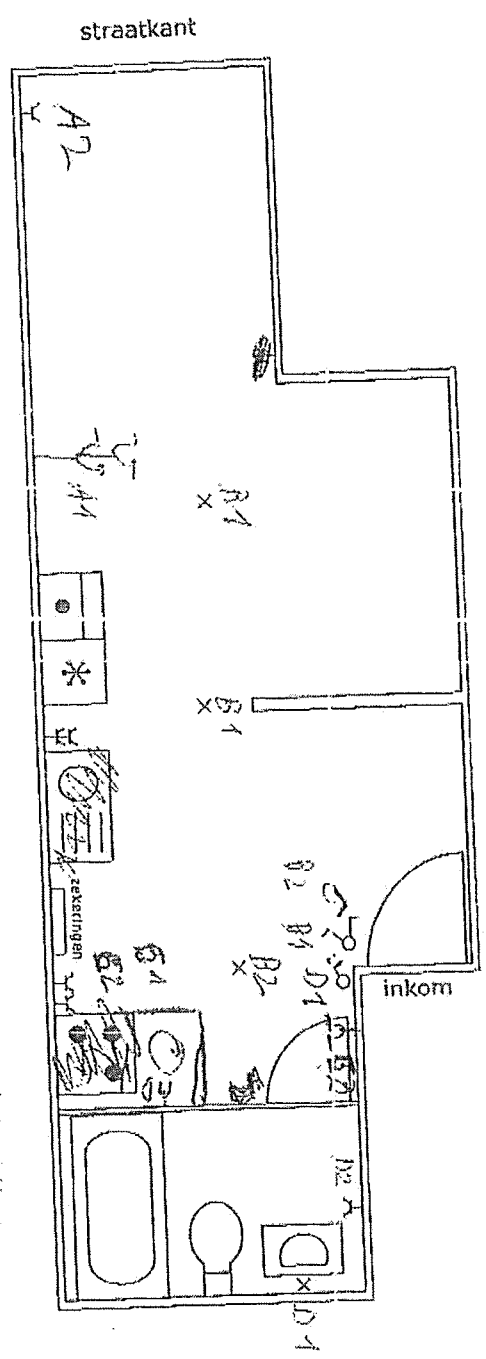

de eigenaar:

datum:

handtekening:

voor het erkend organisme:

naam:

datum:

handtekening:

de installateur:

BTW nummer:

datum:

handtekening:

Adres installatie:
Dambrugstraat 60
B - 2060 Antwerpen
