

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0008-160816-04

Datum van het onderzoek : 16/08/2016

Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : VAN THIENEN
KAPELLESTRAAT 16
2450 MEERHOUT


Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : VAN THIENEN
Adres : KAPELLESTRAAT 16
2450 MEERHOUT

OPDRACHTGEVER : HAEST RONNY
Adres : MOLSEWEG 30
2440 GEEL

INSTALLATEUR : HAEST RONNY
Adres : MOLSEWEG 30
2440 GEEL

BTW of IK : 0629 411 422

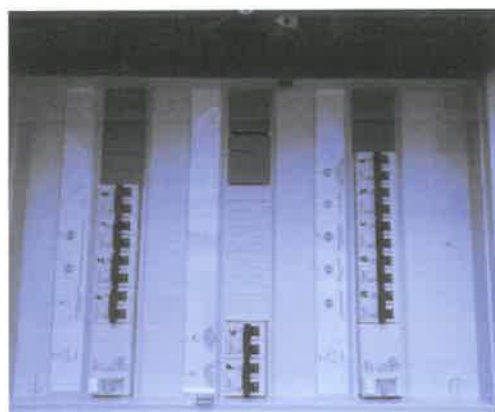

EAN : Teller nr. 5180484. 2005 Index : D: 995047 Kwh; N: 5765 Kwh

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Voor 01/10/81	Type der Lokalen :	wooneenheid
Begin werken fundering:		Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	3x400V + N	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	aut mij 25 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	4p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	11
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 271, Voorschr. DNB
Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 14 Ohm RI tot > 50 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

Besluit De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/08/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0008 FELIX VAN DYCK

voor De Directeur,



UITGEVOERDE CONTROLES

- Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)
- de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.



STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 16/08/2041.

STAP 4


BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's

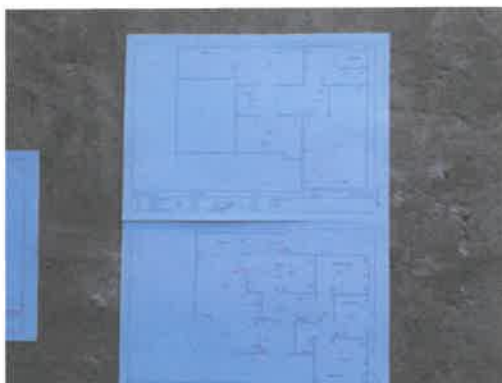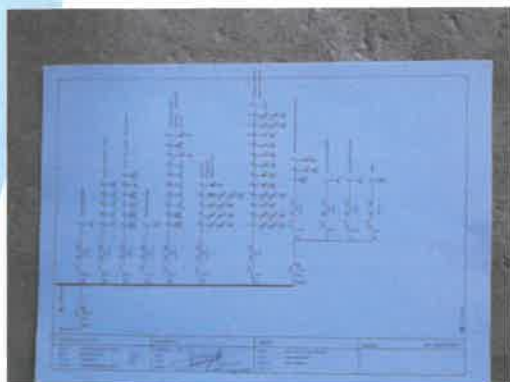




INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema 1A	
Naam	Elektricijswerken Haest R.	ORGANIS.	BTW	Naam	Van Thienen Theo Meernout		
BTW	BE 0629.411.422	Naam	..	Straat	Kappellestraat 16		
Datum	15/08/2016	Datum	..	Gemeen	2450 Meerhout		
Handtek	Elektricijswerken Haest R.	Handtek	..	Handtek	..		

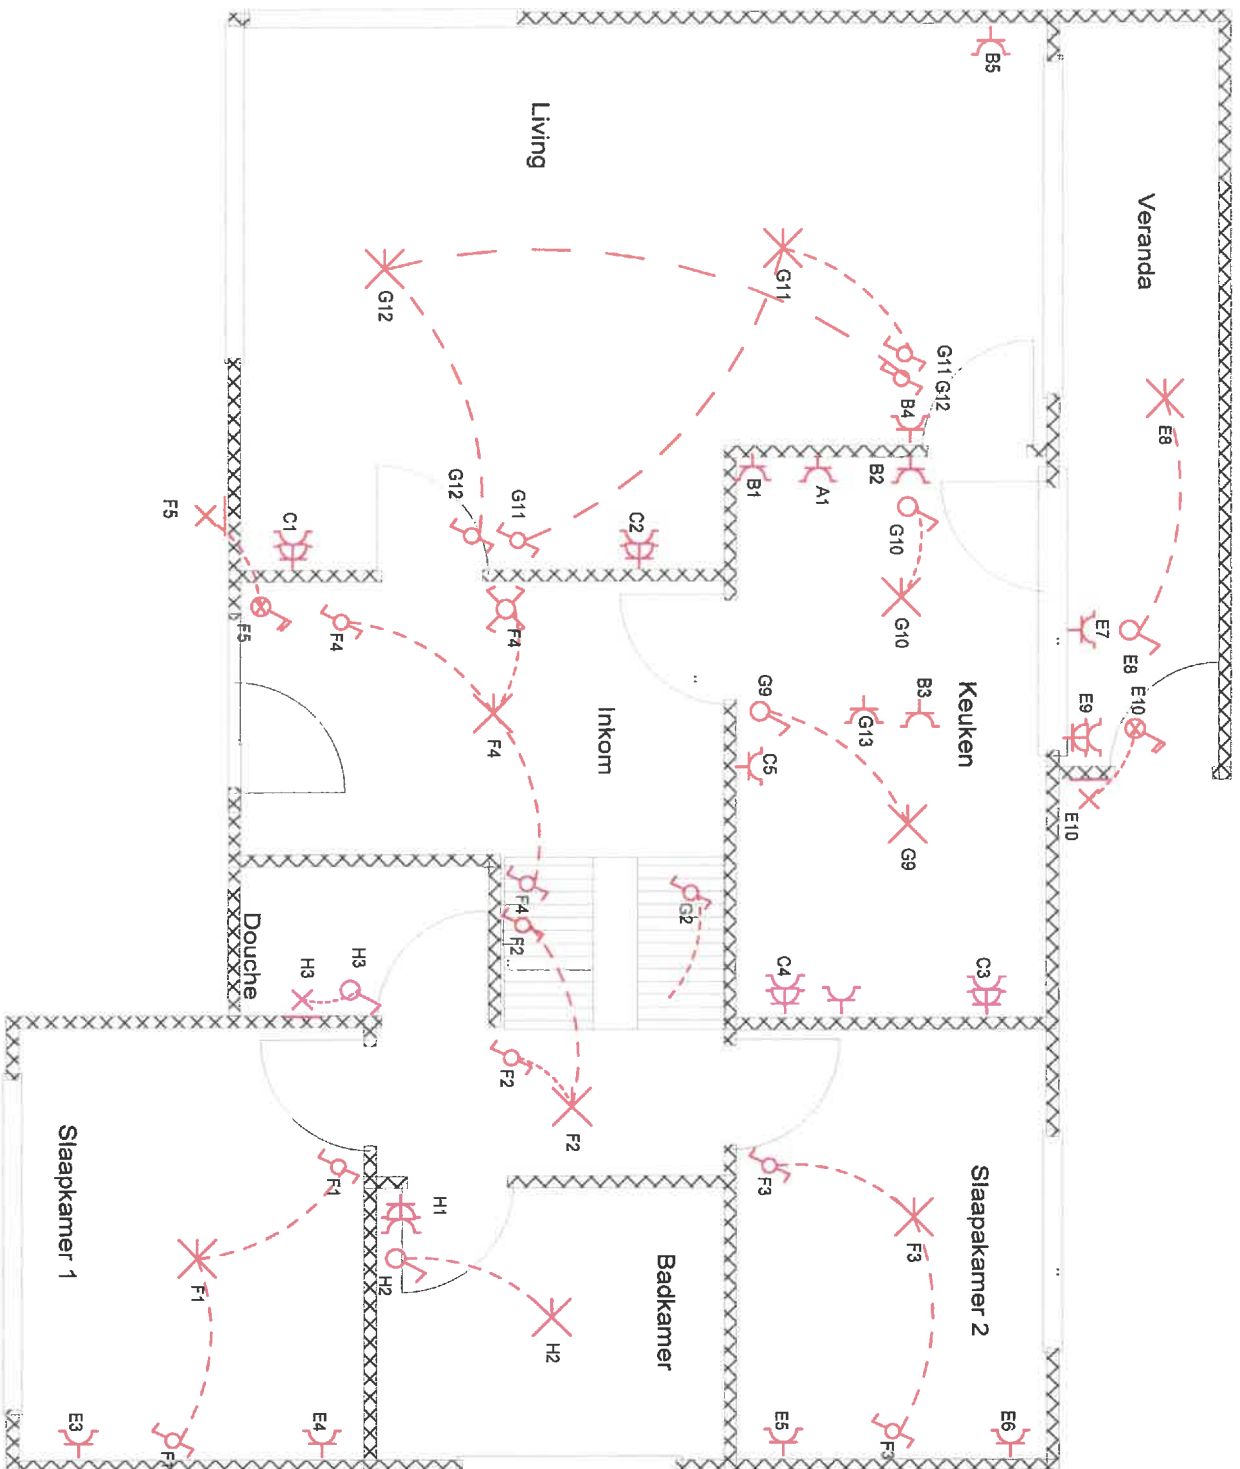

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		geplk/lders	3N, 400V/230V~
Naam	Elektricijswerken Haest R.	ORGANIS.	BTW	Naam	Van Thienen Theo Meerhout		
BTW	BE 0628.411.422	Datum	..	Straat	Kappellestraat 16		
Datum	15/08/2016	Handtek	..	Gemeen	2450 Meerhout		
Handtek	Elektricijswerken Haest R.			Handtek	..		

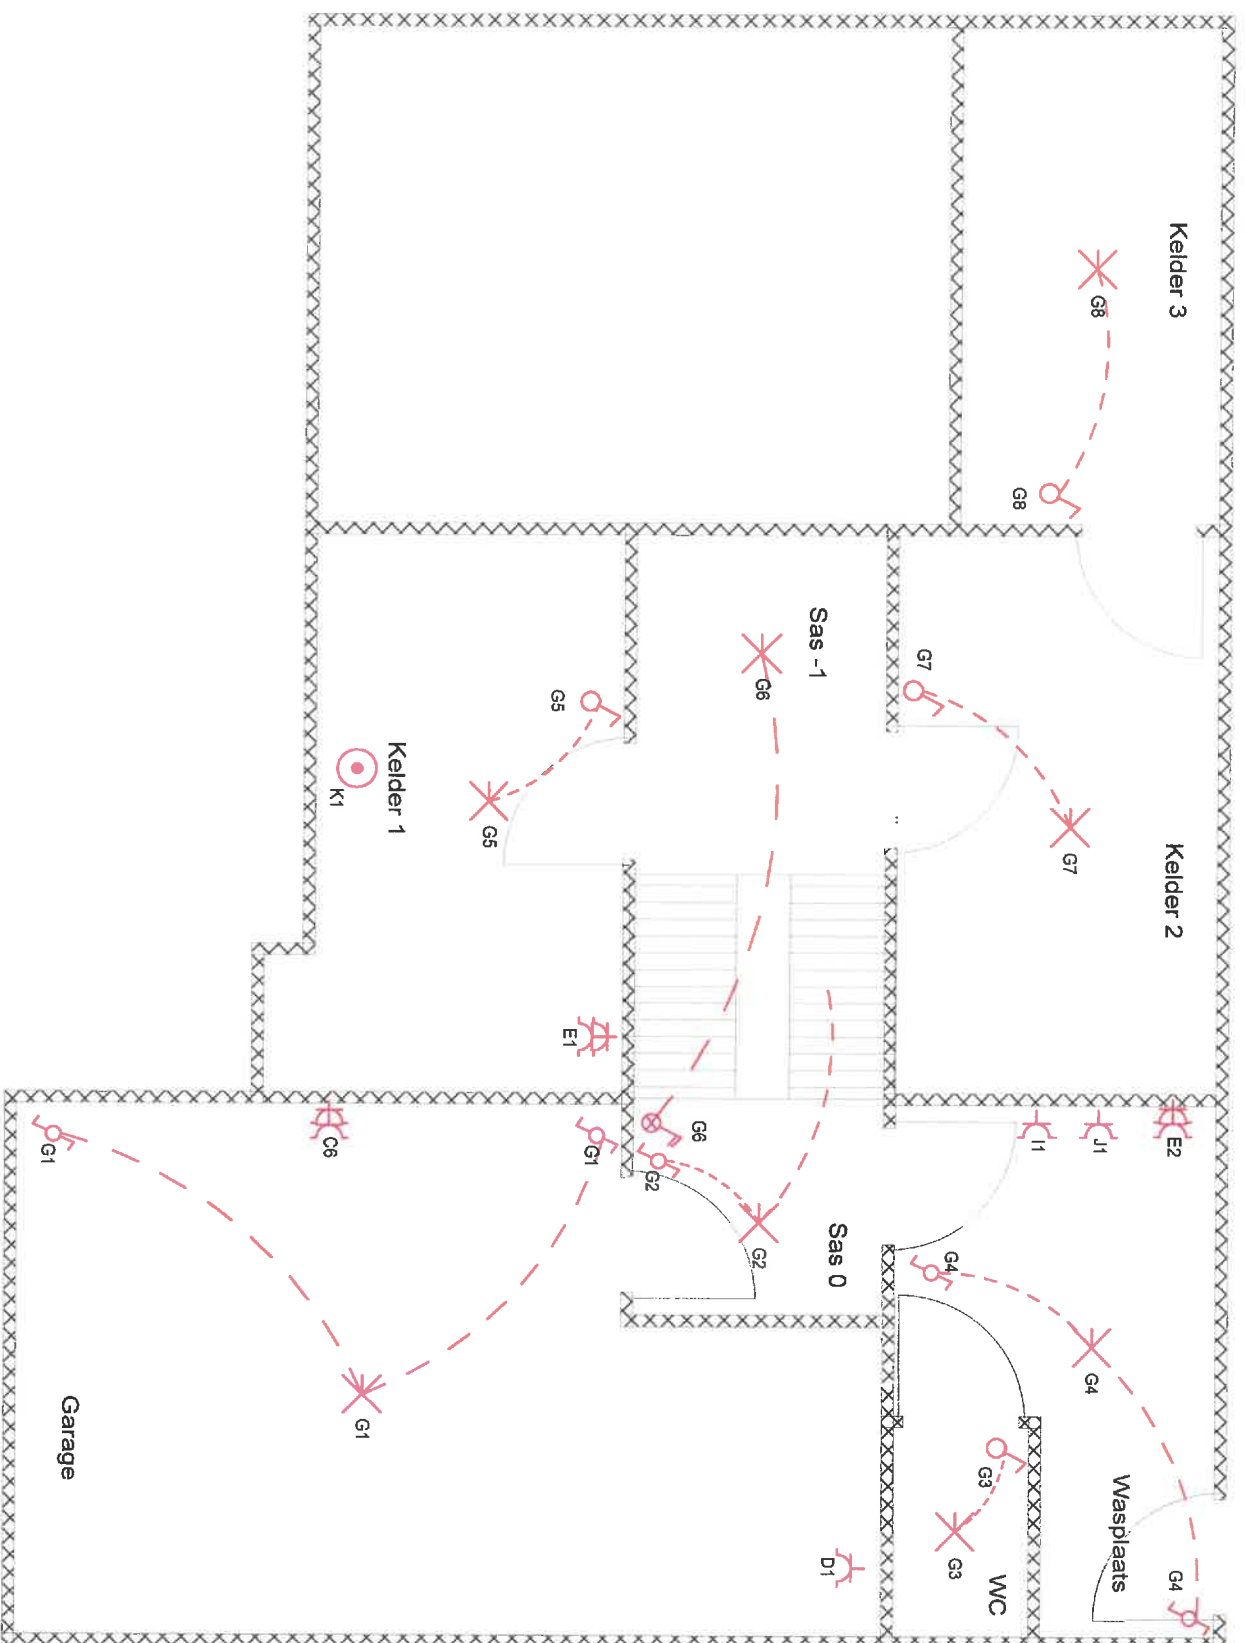

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		kelders	3N, 400V/230V~
Naam	Elektricijswerken Haest R.	ORGANIS.	BTW	Naam	Van Thienen Theo Meerhout		
BTW	BE 0629 411 422	Naam	..	Straat	Kappellestraat 16		
Datum	15/08/2016	Datum	..	Gemeen	2450 Meerhout		
Handtek	Elektricijswerken Haest R.	Handtek	..	Handtek	..		
